



REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage



PROJET PÔLES RURAUX - TAHOUA—AGADEZ

**Projet d'Appui au Développement d'Activités
Rurales et au Financement des Filières Agricoles
dans les régions de Tahoua et Agadez
-Projet Pôles Ruraux –PPR-**

Rapport annuel

- *Période couverte : Du 01/01/2020 au 31/12/2020-*

- *Mars 2021 -*

Table des matières

I.	Résumé et contexte de l'Action pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020	5
II.	Résumé des activités de l'Action et autres mesures mises en œuvre durant la période de janvier à décembre 2020	6
2.1.	Résultat 1.	7
2.2.	Résultat 2.	25
2.3.	Résultat 3.	31
2.4.	Résultat 4.	38
2.5.	Résultat 5.	48
2.6.	Résultat 6.	51
2.7.	Résultat 7.	52
2.8.	Résultat 8.	54
2.9.	Résultat 9.	58
2.10	Appui au pilotage et à la gestion du projet	61
2.11	Difficultés rencontrées et mesures prises pour les surmonter	65
2.12	Modifications introduites en cours de mise en œuvre	65
III.	Bilan des principaux résultats de l'Action (à l'aide des indicateurs compris dans la convention) au cours de la période rapportée.....	66
3.1	Etat de mise en œuvre du PTBA 2020	66
3.2	Etat d'avancement du PPR 2018-2021	66
IV.	Mise en œuvre du Plan de communication et de visibilité	66
V.	Résumé des contrôles et audit réalisés.....	71
VI.	Rapport financier de l'Action.....	72

ANNEXES

- Annexe 1 – Plan d'engagement environnemental et social
- Annexe 2 – Rapports des partenaires
- Annexe 3 – Quelques images des réalisations du projet en 2020

Liste des abréviations et sigles

ABN	Autorité du Bassin du Niger
AFD	Agence Française de Développement
AGR	Activités Génératrices de Revenus
ANFICT	Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales
AO	Appel d'Offre
BEEEI	Bureau d'Etude d'Evaluation Environnementale et
BV	Bassin Versant
CES/DRS	Conservation des Eaux et Sols/ Défense et Restauration des Sols
COFOB	Commission Foncière de Base
COFOCOM	Commission Foncière Communale
COFODEP	Commission Foncière Départementale
COFOR	Commission Foncière Régionale
CRA	Chambre Régionale d'Agriculture
CT	Collectivité Territoriale
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DDA	Direction Départementale de l'Agriculture
DDE	Direction Départementale de l'Environnement
DDGR	Direction Départementale du Génie Rural
DEP	Direction des Études et Programmes
DRA	Direction Régionale de l'Agriculture
DRGR	Direction Régionale du Génie Rural
DRE/SU/DD	Direction Régionale de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
FAO	<i>Food Agriculture Organisation</i>
FICOD	Fonds d'Investissement des Collectivités Territoriales
FIDA	Fonds International de Développement Agricole
FISAN	Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
GAR	Gestion Axée sur les Résultats
GIZ	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
HCI3N	Haut-Commissariat à l'initiative « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 3N
HIMO	Haute Intensité de Main d'Œuvre
IF	Institution Financière
IFS	Institution Financière Spécialisée
IMF	Institution de Micro Finance
INS	Institut National des Statistiques du Niger
IRAM	Institut de Recherche d'Application des Méthodes de Développement
KfW	<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>
MAG/EL	Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
MO	Main d'œuvre
MPER	Micro et Petite Entreprise Rurale
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OP	Organisations Paysannes
OPA	Organisation Professionnelle Agricole
OS	Objectif Spécifique
PAC	Programme d'Actions Communautaires
PASADEM	Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et au développement dans la région de Maradi
PASEL	Programme d'Appui au Secteur de l'Elevage
PDC	Plan de Développement Communal
PDES	Plan de Développement Economique et Social
PIA	Plan d'Investissement Annuel
PICCT	Programme d'Investissement et de Capacitation des CT en décent. et bonne gouvernance
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PMERSA	Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire
PO	Planification Opérationnelle

PRODEX	Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux
PROMOVARE	Projet de Mobilisation et de Valorisation des Ressources en Eau
PPI	Projet de petite irrigation (Ruwanmu)
ProDAF	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale, régions Maradi, Tahoua, Zinder
PromAP	Projet de Promotion de l'Agriculture Productive
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
RECA	Réseau National des Chambres Régionales d'Agriculture
SAF	Schéma d'Aménagement Foncier
SAHFI	La Sahélienne de Financement
SFD	Système Financier Décentralisé
S/E	Suivi Evaluation
SIMA	Système d'Information sur les Marchés Agricoles
SNV	Organisation Néerlandaise de développement
SPR/CR	Secrétariat Permanent Régional du Code Rural
STD	Services Techniques Déconcentrés de l'Etat
TA	Tahoua
TDR	Termes de Références
UA	Union Africaine
UE	Union Européenne
UGP	Unité de Gestion du Projet
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

I. Résumé et contexte de l'Action pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

1. Descriptif de l'Action

Le Projet Pôles Ruraux est né de la volonté du Gouvernement du Niger et de ses partenaires Financiers, l'Agence Française de Développement et l'Union Européenne de promouvoir le développement des filières porteuses des régions de Tahoua et Agadez et de prévenir la situation de précarité alimentaire. Sa mise en œuvre effective a débuté en 2018 (signature du contrat d'AT MO fin décembre 2017, nomination et prise de fonction du coordonnateur national à fin mars 2018).

En dépit de la place qu'occupe l'agriculture dans l'économie du Niger, l'insécurité alimentaire chronique affecte le pays et entame les moyens d'existence des populations nigériennes. Chaque année, entre 15 à 20% de la population (2 à 3 millions de personnes) se trouve en insécurité alimentaire, et ce, même en année de production agricole excédentaire. A cela s'ajoutent les problèmes liés aux conflits armés dans la sous-région et les inondations des habitations en période hivernale qui occasionnent d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

C'est dans ce contexte que l'Initiative 3 N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) est pensée et mise en œuvre. Faire en sorte que les *Nigériens Nourrissent les Nigériens*, par leurs propres efforts de production et d'organisation, implique que des solutions appropriées soient trouvées pour réduire la fréquence des déficits agricoles, fourragers et d'améliorer la qualité nutritionnelle des repas des ménages à travers un approvisionnement régulier des marchés et l'accessibilité des biens à toutes les catégories sociales du pays. En plus, il y a eu la création, sous l'égide du Haut-Commissariat à l'I3N, du Fonds pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) avec ses trois (3) facilités :

- Facilité 1 : Soutien au financement Agricole ;
- Facilité 2 : Financement des Investissements structurants Agricoles ;
- Facilité 3 : Financement du conseil Agricole, de la recherche Agricole et du renforcement de capacités.

Le PPR se veut un outil de mise en œuvre de l'I3N à travers ses trois objectifs qui sont :

- Renforcer les infrastructures et les aménagements nécessaires au développement durable des productions agricoles et à leur mise en marché à travers les investissements des collectivités territoriales aux niveaux régional et communal ;
- Faciliter l'accès aux institutions financières pour les acteurs des filières agricoles ;
- Améliorer les services à l'agriculture dans la perspective de développer une agriculture moderne, durable et performante sur les marchés.

Pour atteindre ces objectifs, les quatre composantes ci-dessous sont définies :

- C1 : Financement d'investissements collectifs à caractère public en faveur des filières agricoles et appui technique aux communes qui comporte quatre résultats. Cette composante s'exécute dans 18 communes dans la région de Tahoua, 8 communes de la région d'Agadez et les deux régions ; soit 28 Collectivités Territoriales ;
- C2 : amélioration de l'accès au crédit agricole qui est composée de trois résultats. Elle s'exécute sur tout le territoire des deux régions ;
- C3 : Amélioration des services non financiers en faveur des acteurs des filières agricoles qui est composée de deux résultats. Elle s'exécute sur tout le territoire des deux régions ;
- C4 : Appui au pilotage et à la gestion du projet.

Chacun des résultats sera développé dans le rapport.

Dans le cadre des conventions de financement signées le 14 mars 2017, deux rapports semestriels sont dus, le second est, de fait, un rapport annuel. Le présent document constitue le **rapport annuel 2020 (janvier à décembre 2020) et rend compte des activités conduites durant la période.**

2. Eléments de contexte sur la période Janvier/Décembre 2020

La mise en œuvre du projet au cours de l'année 2020 s'est inscrite dans un contexte tout à fait particulier, tant pour des raisons directement liées au projet, que pour des facteurs externes qui ont néanmoins eu une incidence sur le rythme de déroulement des activités.

Le Ministère a pris la décision le 14 février de ne pas reconduire les contrats du Coordonnateur National et du Coordonnateur Régional de Tahoua, et de demander le remplacement de l'Assistant Technique Principal à partir du 1^{er} Mars. S'en est donc suivi une période de « creux » au niveau de l'équipe opérationnelle de mise en œuvre.

Le processus de recrutement de deux coordonnateurs National et régional de Tahoua a été conduit et ils ont pris respectivement service le 1^{er} juillet 2020 et le 13 juillet 2020. Pour ce qui est du poste de l'Assistant Technique Principal, le responsable S-E de l'AT assure l'intérim depuis Mars 2020.

Il est à noter les démissions de l'AT GAF et l'AT finances rurales. Le recrutement pour le remplacement a été conduit et le nouveau AT finances rurales a pris service le 01 octobre 2020, pour le poste AT GAF le processus de remplacement est en cours.

Le mois de mars 2020 a été caractérisé par une dégradation des conditions sanitaires dues à l'apparition du COVID-19 au Niger. Ce qui a amené les autorités nigériennes à prendre des mesures drastiques afin de lutter contre la propagation de ce virus (notamment l'interdiction des ateliers et des séminaires, institution des mesures d'hygiène obligatoire, respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes, limitation des rassemblements, le confinement de la ville de Niamey, le couvre-feu sanitaire, la réduction des horaires de travail, la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, etc.). Ainsi, la mission d'appui institutionnelle de l'IRAM prévue début Mars n'a pu finalement être réalisée qu'en octobre 2020.

Par ailleurs, il faut souligner que le contexte sécuritaire s'est détérioré fortement au Sahel (Mali, Burkina, et également Niger). Au Niger, en dépit des efforts de l'Etat, la situation sécuritaire s'est dégradée au cours de l'année 2020 avec une recrudescence des attaques terroristes.

Enfin, le 4^{ème} trimestre de l'année 2020 a été marqué par la tenue des scrutins, municipales, régionales, législatives et présidentielle 1^{er} tour le 27 décembre 2020.

II. Résumé des activités de l'Action et autres mesures mises en œuvre durant la période de janvier à décembre 2020

Composante 1

La composante 1 consiste notamment à financer des infrastructures sous maîtrise d'ouvrage communale, afin de participer au développement économique durable des régions d'Agadez et de Tahoua.

A la fin de l'année 2019, des activités de récupération de terres dégradées, d'ouverture des bandes pare-feu, de plantations des arbres et ensemencement des ouvrages CES/DRS, de construction de magasins de stockage et de boutiques d'intrants agricoles ont été réalisées. Diverses études ont également été lancées avec comme objectif l'élaboration des DAO et le déclenchement des processus de passation de marchés en 2020 pour notamment la réalisation des infrastructures dans les deux régions.

Globalement les actions initiées par le PPR en 2019 dans le cadre de la composante 1 ont contribué à améliorer sensiblement le taux de couverture en infrastructures des Communes, à préserver le potentiel productif, et à améliorer le revenu des populations bénéficiaires.

Par ailleurs, des difficultés entravant la mise en œuvre des activités de cette composante ont également été identifiées en 2019. Ils sont de plusieurs ordres : difficultés de mobilisation des acteurs régionaux, faiblesses des maîtrises d'ouvrage communales ; retard sur les processus de passation des marchés ; retard dans la production par les CT et les STD de pièces justificatives ; lenteur dans la mise à disposition par l'ANFICT des fonds aux CT ; faible qualité des documents relatifs à la passation des marchés, etc.

Au cours de l'année 2020, le projet s'est attelé avec l'ensemble de ses partenaires à apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées afin d'améliorer la mise en œuvre des activités du projet : ceci à travers la concertation, le dialogue, une amélioration de la circulation de l'information, la formation des différents acteurs notamment en passation des marchés et l'accompagnement rapproché des CT.

Ainsi, comme principale réalisation de l'année 2020, on peut citer : la récupération de 13 315 ha de terres et le lancement des travaux de construction de 34 seuils dans la région de Tahoua. Il faut également relever une bonne évolution des autres dossiers de passation marchés (études et autres infrastructures).

2.1. Résultat 1.

« Des aménagements combinés permettent de préserver le potentiel productif des eaux et des terres afin de valoriser ensuite des productions des filières porteuses »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisations	Commentaires/ Perspectives
	*	**	***	****	*****		
Récupération de terres dégradées (Agadez-Tahoua)					*****	13 315 ha réalisés/15 115 ha prévus	Agadez : 5 082 ha réalisés sur 5 165 ha prévus) ; Tahoua : 8 233 ha/9950 ha récupérés Les travaux engagés en 2020, seront achevés en 2021

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisations	Commentaires/ Perspectives
	*	**	***	****	*****		
Réalisation des bandes pare-feu (Agadez-Tahoua)				****		. 4485 kml réalisés/ 3050 kml prévus	Agadez : 485 kml réalisé sur une prévision de 850 kml ; Tahoua : 1000 kml (Report 2019 réalisé en 2020) ; 3000 kml/ 1200 kml prévus en 2020 Les travaux engagés en 2020, seront achevés en 2021
Création de pépinières (Agadez)				****		7/8 pépinières mixtes réalisées	La production des plants forestiers et fruitiers se poursuit au niveau des pépinières
Appui aux mini pépinières (Tahoua)					*****	. 49 pépinières fonctionnelles ; . 38 OP ont été sollicités ; . 1 871 256 plants produits . Appui en petit matériel : pelles, arrosoirs, etc.	- 90 millions mis à la disposition des 18 communes (5 millions par commune) pour appuyer les groupements des producteurs.
Agroforesteries et RNA (Tahoua)					*****	. 3017 volontaires formés	- Traitement des superficies en 2021
Fixation des dunes (Tahoua)					*****	. 91,13 ha réalisés sur les 125 ha prévus	- Les superficies restantes ont été engagées et les travaux seront finalisés en début 2021
Traitement biologique des berges des Koris (Tahoua)					*****	. 9000ml réalisés /10000 prévus	- 90% de réalisation
Aménagement des mares (Tahoua)						. DP élaborée	- Echanges en cours autour de la DP

■ Détails par activité

■ Récupération des terres et ensemencement des aires récupérées/plantations

La superficie totale de terres dégradées à récupérer pour l'année 2020 s'élève pour les deux régions à 15 115 ha. Les réalisations physiques en fin décembre 2020 s'élèvent à 13 315 ha récupérés sur les deux régions. Soit un taux global de réalisation de 91%.

Le démarrage des activités CES/DRS était prévu en avril 2020. La situation née de la COVID-19 a engendré un décalage à mai 2020 dans le respect des règles sanitaires édictées par les autorités nigériennes. Cela a eu pour conséquences un retard d'un mois dans la réalisation des ouvrages.

Un avenant à la convention de financement 2020 PPR/ANFICT a été signé le 23 novembre 2020, afin de permettre au projet PPR d'assurer les paiements directs des travaux et d'accélérer la mise en œuvre des activités CES/DRS prévues au 4^{ème} trimestre.

- **Agadez :**

- *Au niveau technique*

La superficie totale de terres dégradées à récupérer dans le PTBA 2020 s'élève à 5 165 ha. Les réalisations physiques à fin décembre 2020 s'élèvent à 5 082 ha, soit un taux de réalisation de 98%.

Les travaux se sont déroulés en deux phases dont :

- Une première de janvier à octobre 2020 pour lesquelles les fonds ont été transférés aux CT via l'ANFICT : 3454 ha ont été réalisés ;
- Une seconde phase de novembre à décembre 2020 mise en œuvre par l'UGP PPR avec l'appui de la Direction Régionale de l'Environnement : 1628 ha réalisés. Les travaux se poursuivent et le reliquat des superficies à traiter seront achevés en 2021.

Tableau 1 : Situation des réalisations des ouvrages CES/DRS 2020 dans la région d'Agadez

ANFICT : Janvier – Octobre 2020

Commune	HA prévu	Superficie Réalisée (ha)	Nbre d'ouvrage réalisé (DL)	Taux (%)
Agadez	700	475	148 675	68
Tchirozerine	700	455	142 415	65
Tabelote	600	382	119 566	64
Dabaga	500	370	115 810	74
Dannat	600	391	122 383	65
Gougaram	765	473	148 049	62
Iférouane	650	451	141 163	69
Timia	650	457	143 041	70
TOTAUX	5165	3454	1 081 102	67

Source : CT/Agadez– Rapport annuel ANFICT 2020

UGP PPR : Novembre – décembre 2020

Département	Commune	Superficie (ha)
Arlit	Danet	47
	Gougraram	127
Iférouane	Iférouane	195
	Timia	201
Tchirozérine	Agadez CU	320
	Dabaga	204
	Tabelot	345
	Tchirozérine	189
	Total	1 628

Source : UGP R- Agadez

Tableau 2 : Synthèse des réalisations des ouvrages CES/DRS 2020 dans la région d'Agadez

Tranche	Prévision PTBA 2020 (ha)	Réalisation au 31/12/2020 (ha)	%
Janvier – octobre (ANFICT)	5 165	3 454	
Novembre - décembre (UGP)		1 628	
Total		5 082	98%

Source : UGP PPR

Tableau 3 : Situation de la main d'œuvre mobilisée dans la région d'Agadez**ANFICT : Janvier – Octobre 2020**

Communes	Hommes	Femmes	Total	%H	%F
Agadez	735	547	1282	57%	43%
Tchirozerine	650	100	750	87%	13%
Tabelote	716	67	783	91%	9%
Dabaga	765	135	900	85%	15%
Dannat	819	69	888	92%	8%
Gougaram	332	0	332	100%	0%
Iférouane	435	0	435	100%	0%
Timia	473	0	473	100%	0%

Source : Rapport annuel ANFICT 2020

UGP PPR : Novembre – décembre 2020

Département	Commune	Travailleurs mobilisés		Total
		Hommes	Femmes	
Arlit	Danet	228	0	228
	Gougraram	462	0	462
Iférouane	Iférouane	996	70	1 066
	Timia	583	0	583
Tchirozérine	Agadez CU	1 478	1592	3 070
	Dabaga	720	326	1 046
	Tabelot	1 540	55	1 595
	Tchirozérine	2 090	419	2 509
Total		8 097	2 462	10 559

Source : UGP R- Agadez

Tableau 4 : Synthèse de de la main d'œuvre mobilisée au titre des CES/DRS pour l'année 2020 dans la région d'Agadez

Tranche	Hommes	Femmes	Total
Janvier – octobre (ANFICT)	4 925	918	5 843
Novembre - décembre (UGP)	8 097	2 462	10 559
Total	13 022	3 380	16 402

Source : UGP PPR

- Au plan financier

Le montant total des réalisations des activités CES/DRS dans la région d'Agadez est de 1 568 388 441 FCFA sur une prévision de 1.725.332.150 FCFA, soit un taux de réalisation financière de 91%. Il est à noter que, au titre de l'année 2020, 1 042 707 713 FCFA ont été transférés aux CT à travers le canal de l'ANFICT. Par ailleurs, un montant de 354 226 011 FCFA a été injecté dans les activités CES/DRS entre novembre et décembre 2020 à travers l'UGP avec l'appui de la Direction Régionale de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, et en collaboration avec les CT.

Tableau 5 : Réalisations financières des activités de récupération des terres 2020 dans la région d'Agadez

ANFICT : Janvier – Octobre 2020

Collectivités	Report au 31 Déc 2019	Montant Reçu 2020	Montant Total	Montant Justifié	Reste à justifier	Taux d'exécution
Timia	27 924 292	132 559 456	160 483 748	150 567 429	9 916 319	94%
Iférouane	33 301 346	130 590 549	163 891 895	151 953 605	11 938 290	93%
Gougaram	19 387 581	138 336 365	157 723 946	148 880 552	8 843 394	94%
Dannet	17 330 275	100 934 452	118 264 727	112 413 210	5 851 517	95%
Agadez	30 469 677	143 580 354	174 050 031	165 617 046	8 432 985	95%
Tchirozerine	29 125 154	146 438 104	175 563 258	158 278 030	17 285 228	90%
Dabaga	39 734 623	91 901 605	131 636 228	125 167 625	6 468 603	95%
Tabelot	21 278 809	94 206 828	115 485 637	108 437 834	7 047 803	94%
CRAZ	39 603 373	64 160 000	103 763 373	92 847 099	10 916 274	93%
TOTAL	258 155 130	1 042 707 713	1 300 862 843	1 214 162 430	86 700 413	94%

Source : DR ANFICT/Agadez – Rapport annuel ANFICT 2020

UGP PPR : Novembre – décembre 2020

Département	Commune	Montant (F CFA)
Arlit	Danet	11 038
		320
	Gougraram	28 350
Iférouane		985
	Iférouane	42 546
		320
Tchirozérine	Timia	43 788
		320
	Agadez CU	68 545
		200
	Dabaga	44 073
		000

	Tabelot	73 817
		333
	Tchirozérine	42 066
Total		533
		354 226
		011

Source : UGP R- Agadez

Tableau 6 : Synthèse des réalisations financières des activités de récupération des terres 2020 dans la région d'Agadez

Tranche	Prévision (FCFA)	Réalisation (FCFA)	Proportion
Janvier – octobre (ANFICT)	1 725 332 150	1 214 162 430	
Novembre - décembre (UGP)		354 226 011	
Total	1 725 332 150	1 568 388 441	91%

- **Tahoua :**

- *Au niveau technique*

La superficie totale prévisionnelle de terres dégradées à récupérer dans le PTBA 2020 s'élève à 9 950 ha. Les réalisations physiques à fin décembre 2020 s'élèvent à 8 233 ha soit un taux de réalisation de 83%. Les travaux se sont déroulés en deux phases dont :

- Une première de janvier à octobre 2020 pour lesquelles les fonds ont été transférés aux CT via l'ANFICT : 6 076 ha ont été réalisés ;
- Une seconde phase de novembre à décembre 2020 mise en œuvre par l'UGP PPR avec l'appui de la Direction Régionale de l'Environnement : 2 533 ha réalisés. Les travaux se poursuivent et le reliquat des superficies à traiter seront achevés en 2021.

Tableau 7 : Situation des réalisations des ouvrages CES/DRS 2020 dans la région de Tahoua

ANFICT : Janvier – Octobre 2020

Collectivité	Hectares prévus	Type d'ouvrage		Hectares Récupérés	Taux de réalisation
		DL	CP		
AC I	500	71 777	-	229	46%
AC II	500	56 507	-	181	36%
ALLAKAYE	600	153 234	47 811	563	94%
BADAGUICHIRI	450	55 861	40 000	240	53%
BAGAROUA	750	227 977	-	728	97%
BAMBEYE	800	139 726	-	446	56%
BARMOU	400	39 919	-	128	32%
DEOULE	400	125 200	-	400	100%
GARHANGA	600	141 240	-	451	75%
IBOHAMANE	500	67 873	-	217	43%
ILLELA	1 000	99 197	40 000	379	38%
KALFOU	400	125 201	-	400	100%
KAO	500	76 283	-	244	49%
KEITA	500	82 400	-	263	53%

TAJAE	450	108 870	40 000	410	91%
TAKANAMATT	500	89 973	16 365	313	63%
TAMASKE	600	86 546	-	277	46%
TEBARAM	500	65 342	-	209	42%
Total général	9 950	1 813 126	184 176	6 076	61%

Source : Etats de paiement MO et fiches de pointages – Rapport annuel ANFICT 2020

UGP PPR : Novembre – décembre 2020

DEPARTEMENTS	COMMUNES	SUPERFICIE (HA)
Tchintabaraden	Kao	263
Illela	BADAGUICHIRI	172
	Illela	604
Keita	IBOHAMANE	157
	GARHANGA	77
	Keita	84
	TAMASKE	63
Tahoua département	BARMOU	86
	BAMBEYE	354
	TAKANAMATT	151
	TEBARAM	52
Tahoua ville	AC1	72
	AC2	23
Total		2157

Source : UGP R - Tahoua

Tableau 8 : Synthèse des réalisations des ouvrages CES/DRS 2020 dans la région de Tahoua

Tranche	Prévision PTBA 2020 (ha)	Réalisation au 31/12/2020 (ha)	%
Janvier – octobre (ANFICT)	9 950	6 076	
Novembre - décembre (UGP)		2 157	
Total		8 233	83%

Source : UGP PPR

Tableau 9 : Situation de la main d'œuvre mobilisée dans la région de Tahoua

ANFICT : Janvier – Octobre 2020

Collectivité	Homme	Femme	Total Bénéficiaire
AC I	1 321	242	1 563

Collectivité	Homme	Femme	Total Bénéficiaire
AC II	851	626	1 477
ALLAKAYE	1 276	2 143	3 419
BADAGUICHIRI	3 450	2 356	5 806
BAGAROUA	4 543	3 296	7 839
BAMBEYE	2 133	1 322	3 455
BARMOU	1 364	1 136	2 500
DEOULE	2 166	1 565	3 731
GARHANGA	1 585	1 513	3 098
IBOHAMANE	797	1 568	2 365
ILLELA	3 953	2 488	6 441
KALFOU	2 072	1 881	3 953
KAO	972	945	1 917
KEITA	372	1 202	1 574
TAJAE	1 886	917	2 803
TAKANAMATT	1 896	587	2 483
TAMASKE	1 053	1 793	2 846
TEBARAM	2 072	459	2 531
Total général	33 762	26 039	59 801

Sources : Etats de paiement et fiches de pointages DRANFICT - Rapport annuel ANFICT 2020

UGP PPR : Novembre – décembre 2020

Département	Communes	Travailleurs mobilisés	
		Hommes	Femmes
Tchintabaraden	Kao	51	102
Illela	Badaguichiri	33	67
	Illéla	117	234
Keita	Ibohamane	30	61
	Garhanga	15	30
Tahoua departement	Keita	16	32
	Tamaské	12	24
Tahoua ville	Barmou	17	33
	Bambey	68	137
	Takanamatt	29	58
	Tébaram	10	20
	AC1	14	28
	AC2	4	9
	Total	417	834

Source : UGP PPR

Tableau 10 : Synthèse de de la main d'œuvre mobilisée au titre des CES/DRS pour l'année 2020 dans la région de Tahoua

Tranche	Hommes	Femmes	Total
Janvier – octobre (ANFICT)	33 762	26 039	59 801
Novembre - décembre (UGP)	417	834	1 250
Total	34 179	26 873	61 051

Source : UGP PPR

- Au plan financier

Tableau 11 : Réalisations financières des activités de récupération des terres 2020 dans la région de Tahoua

ANFICT : Janvier – Octobre 2020

Récapitulatif de la justification PTBA 2020						
Commune	REPORT SOLDE 2019	Appels de fonds 2020	Total fonds	Justifiés	Reste à justifier	Taux réalisé en %
AC I	7 183 913	82 793 500	89 977 413	87 199 235	2 778 178	97%
AC II	26 898 744	139 585 759	166 484 503	92 934 474	73 550 029	56%
ALLAKAYE	5 712 161	102 895 679	108 607 840	103 495 811	5 112 029	98%
BADAGUICHIRI	4 715 080	90 884 000	95 599 080	84 859 741	10 739 339	89%
BAGAROUA	4 139 951	175 111 750	179 251 701	176 279 706	2 971 995	98%
BAMBEYE	21 619 918	177 727 037	199 346 955	195 482 614	3 864 341	98%
BARMOU	17 189 683	104 295 976	121 485 659	106 075 223	15 410 436	87%
DEOULE	9 650 982	129 521 824	139 172 806	135 730 029	3 442 777	98%
GARHANGA	29 241 962	241 669 342	270 911 304	212 620 852	58 290 452	82%
IBOHAMANE	25 747 339	284 969 000	310 716 339	304 081 254	6 635 085	98%
ILLELA	28 942 552	148 117 131	177 059 683	175 282 839	1 776 844	99%
KALFOU	3 816 000	141 740 500	145 556 500	100 906 497	44 650 003	82%
KAO	16 642 331	100 792 239	117 434 571	115 484 211	1 950 360	98%
KEITA	8 099 325	93 028 156	101 127 481	99 154 772	1 972 709	99%
TAJAE	1 021 100	100 455 009	101 476 109	96 611 009	4 865 100	95%
TAKANAMATT	36 836 795	99 859 879	136 696 674	131 636 519	5 060 155	96%
TAMASKE	6 752 319	139 486 713	146 239 033	144 183 810	2 055 223	99%
TEBARAM	42 468 642	79 687 722	122 156 364	114 996 392	7 159 972	94%
CR/TAHOUA	41 676 852	231 836 724	273 513 576	168 332 926	105 180 650	62%
TOTAL	338 355 650	2 664 457 940	3 002 813 590	2 645 347 913	357 465 677	

Source : pièces comptables de liquidation de DR TAHOUA – Rapport annuel ANFICT 2020

UGP-PPR : Novembre – Décembre 2020

Département	Communes	Montant (FCFA)
Tchintabaraden	Kao	41 159 500
Illela	Badaguichiri	26 994 000
	Illéla	94 572 500
Keita	Ibohamane	24 532 500
	Garhanga	12 065 500
	Keita	13 117 500
	Tamaské	9 805 500
Tahoua département	Barmou	1 953 000
	Bambey	57 106 000
	Takanamatt	39 573 000
	Tébaram	26 103 500
Tahoua ville	AC1	11 228 500
	AC2	3 553 000
	Total	361 764 000

Source : UGP PPR

Tableau 12 : Synthèse des réalisations financières des activités de récupération des terres 2020 dans la région de Tahoua

Tranche	Prévision (FCFA)	Réalisation (FCFA)	Proportion
Janvier – octobre (ANFICT)	2 608 551 700	2 645 347 913	
Novembre - décembre (UGP)		361 764 000	
Total	2 608 551 700	3 007 111 913	115%

Source : UGP PPR


■ Réalisation des bandes pare-feu (Agadez-Tahoua)

La superficie totale à traiter pour l'année 2020 s'élève pour les deux régions à 3 050 kml. Les réalisations physiques en fin décembre 2020 s'élèvent à 4485 kml sur les deux régions. Soit un taux global de réalisation de 147%.

- Agadez :

- Indicateurs clés liées à l'activité

kml de bandes pare-feu



Cible	850 Kml
Valeur actuelle	485 Kml
Taux de réalisation	57%

Nombre de travailleurs mobilisé




○ Les réalisations

- *Au niveau technique*

Le nombre total de longueur de bandes pare feu à réaliser dans la région d'Agadez dans le PTBA 2020 s'élève à 850 kml. Les réalisations physiques à fin décembre 2020 s'élèvent à 485 kml. Soit un taux de réalisation de 57%. Ces réalisations ont été menées dans les communes d'Agadez, Tchirozérine, Timia, Iférouane, Gougaram et Dannet. Il est attendu la finalisation 365 kml en début janvier 2021.

La recrudescence des feux de brousse au cours des mois d'octobre-novembre 2020 a occasionné de multiples dégâts sur le pâturage. Ce qui a conduit les autorités Nigériennes à solliciter auprès des partenaires techniques et financiers le rehaussement leurs programmations dans le cadre de l'ouverture des bandes pares feux.

Pour ce qui est du PPR, les zones frontalières à ses communes d'intervention (Aderbissanet et Ingall) ont été très impactés par ces feux de brousses. Une réflexion doit être menée afin d'élargir la zone d'action du PPR dans la région d'Agadez relativement en incluant ces zones favorables à l'ouverture des bandes pare-feu. Ce qui permettrait également d'atteindre l'objectif global fixé dans le cadre logique.

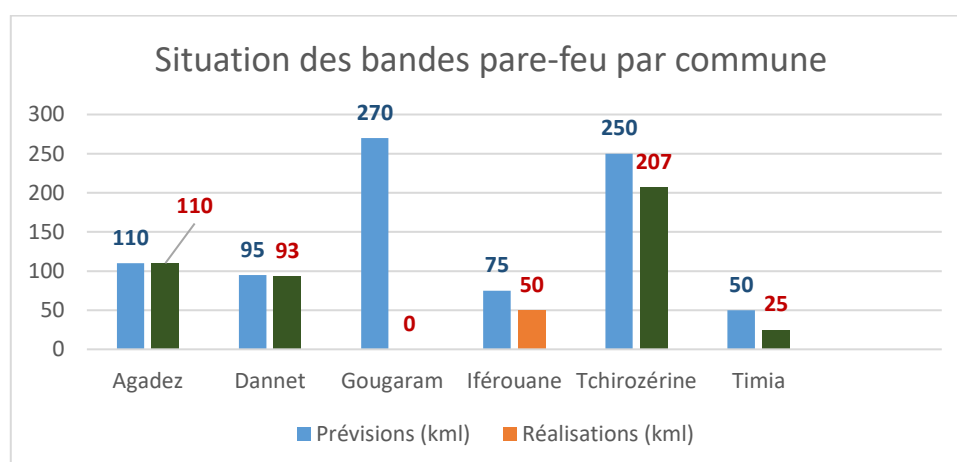

Source : UGP PPR


Tableau 13 : Réalisations physiques par communes des bandes pare-feu dans la région d'Agadez

N°	Département	Communes	Sites	Prévisions (kml)	Réalisations (kml)	Taux (%)
1	Arlit	Dannet	Emichilwane	50	49	98%
2			Girfis	25	25	100%
3		Gougaram	Gougaram	20	0	0%
4			Iboraghane	140	0	0%
5			Igaran Mayat	80	0	0%
6			Imalan Toulough	50	50	100%
7			Ingalan	10	10	100%
8	Iférouane	Iférouane	Injiran	15	15	100%
9			Kabao	50	48	96%
10			Ounwadoubane	50	20	40%
11		Timia	Ounwagar	20	0	0%
12			Ourey	30	30	100%
13	Tchirozérine	Agadez	Tachagort	80	55	69%
14			Takachwart	30	30	100%
15			Takadodot	40	23	58%
16		Tchirozérine	Tamammat	30	0	0%
17			Tassagh –N-Tallam	40	40	100%
18			Tekazam	40	40	100%
19			Tenawak Est	25	25	100%
20			Tenawak Ouest	25	25	100%
TOTAL	3	6	20	850	485	57%

A la date du 31 décembre 2020, 485 kml de bandes pare-feu ont été réalisés sur une prévision de 850 kml, soit un taux de réalisation de 57%. Les travaux ont démarré au cours du mois de décembre 2020 et se poursuivront en janvier 2021.

- Au plan financier

A la date du 31 décembre 2020 le montant injecté pour les travaux bandes pare-feu s'élève à 31 807 225 FCFA sur une prévision financière de 65 400 000 FCFA, soit un taux de 49%.

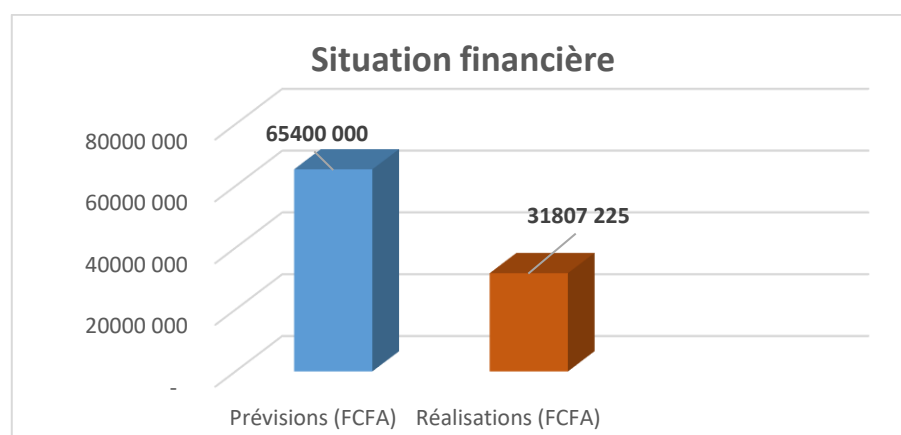

Source : UGP PPR

Tableau 14 : Situation financière des activités bandes pare-feu.

N°	Département	Communes	Sites	Réalisations (kml)	Montant (FCFA)
1.	Arlit	Dannet	Girfis	25,00	1 570 000
2.			Kabao	48,01	2 835 660
3.	Iférouane	Iférouane	Ounwadoubane	20,00	1 295 000
4.			Tenawak Est	25,00	1 570 000
5.			Tenawak Ouest	24,80	1 559 065
6.		Timia	Ingalan	10,00	745 000
7.			Injiran	15,00	1 020 000
8.	Tchirozérine	Agadez	Ourey	30,00	2 375 000
9.			Tassagh –N-Tallam	40,00	2 395 000
10.			Tekazam	40,00	2 395 000
11.		Tchirozérine	Emichilwane	49,30	4 610 500
12.			Imalan Toulough	50,00	2 945 000
13.			Tachagort	54,70	3 203 500
14.			Takachwart	29,70	1 828 500
15.			Takadodot	23,00	1 460 000
Total				484,51	31 807 225

Source : UGP PPR

○ Les premiers effets et impacts induits

La réalisation de l'activité a eu pour effets directs de :

- Prévenir la diffusion des feux de brousse (sécurisation du potentiel fourrager de la zone) ;
- Permettre aux populations d'avoir des revenus additionnels liés au transfert de cash et la vente de la paille ramassée sur place, surtout sur les sites des communes urbaines d'Agadez et de Tchirozérine ;
- Permettre la disponibilité d'une brigade anti-feu au niveau de chacun des sites concernés par l'activité ;
- Favoriser la reconstitution du cheptel de petits ruminants.

○ Les leçons apprises

Pour garantir le succès des activités d'ouverture des bandes pare-feu, il s'avère indispensable de coupler l'ouverture des bandes pare-feu avec l'intensification de la sensibilisation des communautés sur la prévention des feux de brousse.


○ Recommandations

- Adapter la composition du kit de petits matériels en fonction de la nature des travaux ;
- Dimensionner la quantité du petit matériel aux longueurs de bandes à réaliser ;


- Tahoua :

○ Indicateurs clés liées à l'activité

kml de bandes pare-feu

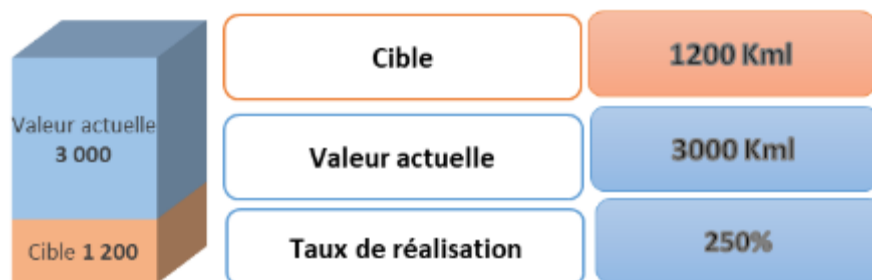

Nombre de travailleurs mobilisé

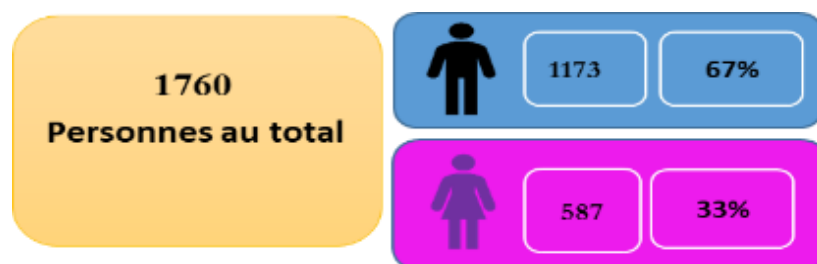

○ Les réalisations

- Au niveau technique

Les bandes pare-feu sont des aménagements de protection des pâturages (herbacés et ligneux) et de la faune contre les feux de brousse. Leur confection intervient souvent dans le quatrième trimestre de chaque année. En 2019, et en dépit de la programmation de lancer officiellement l'activité le 24 décembre les opérations n'ont pu commencer et ont été reportées en 2020. Les communes concernées, à savoir Takanamatt, Kao et Tébaram ont débuté les travaux, respectivement, les 12, 15 et 16 janvier 2020. La totalité des travaux, soit 1 000 km linéaire, ont été achevé mi-février 2020. **Le rapport annuel 2020 de l'ANFICT ne fait pas ressortir cet aspect.**

Le nombre total de longueur de bandes pare feu à réaliser dans la région de Tahoua dans le PTBA 2020 s'élève à 1 200 kml. Les réalisations physiques à fin décembre 2020 s'élèvent à 3 000 kml. Soit un taux de réalisation de 250%. Ce taux s'explique par la recrudescence des feux de brousse enregistrés au cours des mois d'octobre-novembre 2020 ayant occasionnés de multiples dégâts sur le pâturage et la sollicitation des autorités nigériennes auprès des partenaires techniques et financiers afin de rehausser leurs programmations en ce qui concerne l'ouverture des bandes par feu. Il est attendu la finalisation de 1 000 kml en début janvier 2021.

Cependant, il serait judicieux d'élargir la zone d'action du PPR dans la région de Tahoua relativement à cette activité en incluant les communes frontalières de Tchintabaraden et Tabalak (favorables à l'ouverture des bandes pare-feu) afin d'atteindre l'objectif global fixé dans le cadre logique.

Tableau 15 : Réalisations physiques par commune des bandes pare-feu dans la région de Tahoua

Communes	Sites	Kml traités	H	F	Nombre de bénéficiaires	Montant (FCFA)
Kao	Edouk	600	216	108	324	30 000 000
	N'Kotagan	600	200	100	300	30 000 000
	Inaghourghour	600	256	128	384	30 000 000

Communes	Sites	Kml traités	H	F	Nombre de bénéficiaires	Montant (FCFA)
Takanamatt	Adoua	180	100	50	150	9 000 000
	Zarboulé	280	92	46	138	14 000 000
	India	140	96	48	144	7 000 000
Tébaram	Shinnelwane	600	213	107	320	30 000 000
TOTAL		3 000	1173	587	1760	150 000 000

Source : UGP PPR

- Au plan financier

A la date du 31 décembre 2020 le montant injectés pour ces travaux s'élève à 150 000 000 FCFA sur une prévision financière de 78 400 000 FCFA, soit un taux de 192%.

■ **Création de pépinières -Agadez**

Au total huit (8) pépinières, dont six forestières et deux fruitières ont été prévues au titre du PTBA 2020. Pour rappel, le processus de mise en œuvre de cette activité a démarré en 2019 avec l'identification des sites et l'élaboration des Dossiers de Micro-Projets (DMP). Au cours de l'année 2020, les activités suivantes ont été menées :

- Finalisation et validation des fiches de microprojets avec l'appui de la DRE, la DRGR et la DRA ;
- Sécurisation foncière des sites avec l'appui du Secrétariat Permanent Régional du Code Rural ;
- Mise à disposition des fonds au profit des CT via l'ANFICT;
- L'installation des pépinières par les CT avec l'appui des STD et démarrage de la production des plants sur les sites d'Agadez, Timia et Tchirozérine
- Organisation de mission conjointe de supervision.

Il est à noter que seule la pépinière de la commune de Tabelot n'a pas été réalisée, car le site proposé par la commune est situé dans un périmètre maraîcher dont le processus d'aménagement n'est pas achevé.

Tableau 15 : Localisation des sites

Département	Commune	Site
Tchirozérine	Agadez	Agadez
	Tchirozérine	Tchirozérine
	Dabaga	Dabaga
Iférouane	Iférouane	Iférouane
	Timia	Taleghat
Arlit	Dannet	Tchitintaghat
	Gougaram	Gougaram

Tableau 16 : Objectifs de production de plants par commune dans la région d'Agadez

Commune	Plants fruitiers	Plants forestiers	Total
. Agadez	20 000	20 000	40 000
. Tchirozérine	20 000	20 000	40 000
. Dabaga	5 000	5 000	10 000
. Timia	5 000	5 000	10 000

. Iférouane	5 000	5 000	10 000
. Gougaram	5 000	5 000	10 000
. Dannat	5 000	5 000	10 000
Total	65 000	65 000	130 000

■ Appui aux mini pépinières -Tahoua

Le PPR a inscrit dans le PTBA 2020 la récupération des terres dégradées qui suppose à la fois des actions mécaniques et des plantations. Dans le cadre de la mise en valeur des superficies récupérées, l'appui aux groupements de producteurs des plants s'est présenté comme une opportunité afin d'assurer la disponibilité des plants non loin des sites de récupération des terres.

Dans le processus de mise en œuvre de cette activité, le PPR a mené des échanges en continu avec les parties prenantes (Communes, STD, Groupements de pépiniéristes) autour de la conduite de cette activité. Les leçons apprises dans la conduite des opérations de plantation en 2019 montrent que l'approvisionnement auprès des pépiniéristes des villages bénéficiaires des travaux CES/DRS (essentiellement des groupements féminins) a très bien marché et a permis de minimiser les pertes dues au transport des plants.

Les concertations menées ont fait ressortir la nécessité de réorienter la création des pépinières communales en appui aux groupements des producteurs des plants pour des raisons d'efficacité et d'efficacités. Cet appui a consisté au renforcement des capacités des groupements des producteurs des plants par les services de l'environnement et leurs équipements en petits matériels, dispositif de lavage de mains, semences certifiées, etc.

Ainsi, la production des plants a été assurée par les groupements de pépiniéristes avec qui les communes ont signé des conventions de production. Ces groupements ont reçu du projet un appui en moyens de production (matériels aratoires, pots, semences etc...) et de renforcement des capacités à travers l'encadrement et suivi-contrôle des agents communaux de l'environnement pour entretenir les plants dans les conditions fixées par les communes.

○ Les réalisations

- 49 pépinières ont été rendues fonctionnelles avec l'appui du PPR ;
- 38 groupements de pépiniéristes composés de 441 hommes et 684 femmes ont été sollicités ;
- 1 871 256 plants produits ;
- 90 millions de FCFA ont été mis à la disposition des 18 communes.

Tableau 17 : Objectifs de production de plants par commune dans la région d'Agadez

Collectivité	Nombre groupements de pépiniéristes	Nombre pépinières fonctionnelles	Hommes	Femmes	Total Bénéficiaire	Nombre de Plants produits
AC I	1	2	17	8	25	115 000
AC II	1	2	19	6	25	115 000
ALLAKAYE	1	2	-	100	100	128 000
BADAGUICHIRI	3	3	23	32	55	103 500
BAGAROUA	1	2	32	6	38	151 801
BAMBEYE	2	3	38	2	40	111 000
BARMOU	1	2	22	45	67	52 571
DEOULE	3	3	18	82	100	92 000

Collectivité	Nombre groupements de pépiniéristes	Nombre pépinières fonctionnelles	Hommes	Femmes	Total Bénéficiaire	Nombre de Plants produits
GARHANGA	5	5	58	2	60	132 000
IBOHAMANE	3	3	44	16	60	67 300
ILLELA	5	5	81	123	204	182 064
KALFOU	3	3	23	18	41	80 000
KAO	1	2	-	45	45	82 000
KEITA	1	2	-	82	82	115 000
TAJAE	2	2	25	10	35	103 500
TAKANAMATT	1	2	25	-	25	93 003
TAMASKE	3	3	2	96	98	76 325
TEBARAM	1	3	14	11	25	71 192
Total général	38	49	441	684	1 125	1 871 256

Source : Rapport annuel ANFICT 2020

■ Agroforesteries et RNA -Tahoua

Le PTBA 2020 prévoit la réalisation de 9400 ha de RNA au niveau de dix (10) communes (Tébaram, Tajaé, Illela, Badaguichiri, Bagaroua, Garhanga, Keita et Allakaye avec 1000 Ha chacune et Tamaské et Barmou avec 700 Ha chacune). Au premier semestre 2020, les phases d'information et sensibilisation ont été réalisées et 3017 volontaires ont été formés durant le second semestre 2020. Le traitement des superficies sera réalisé en 2021.

Tableau 18 : Nombre de producteurs formés sur les techniques de la RNA

		Nombre de volontaires formés		Total
	Communes	Hommes	Femmes	
1	Tajaé	300	98	398
2	Badaguichiri	671	96	767
3	Illéla	302		302
4	Bagaroua	195	5	200
5	Barmou	187	15	202
6	Tébaram	365	23	388
7	Allakaye	284	15	299
8	Déoulé	169	5	174
9	Keita	137	51	188
10	Tamaské	99		99
		2709	308	
	Total			3017

Source : Direction Régionale de l'Environnement Tahoua

■ Fixation des dunes -Tahoua

L'activité consiste à l'ensemencement d'*Andropogon Gayanus*, l'espèce choisie pour éviter le mouvement de sable dans les champs, sur les courbes de niveau et les lisières des champs. Le choix de l'*Andropogon* est guidé par son utilité dans la construction des cases et des greniers et aussi sa valeur nutritionnelle pour le

bétail. En avril 2020, les Services Techniques de l'Environnement (cadres des départementaux et agents communaux) ont effectué une mission d'information sensibilisation au niveau des communes cibles.

Les travaux ont été réalisés en juillet/août 2020 et 91,13 ha sur les 125 ha prévus ont été traités, soit 72,90% de taux de réalisation. **Le rapport annuel 2020 de l'ANFICT ne fait pas ressortir cet aspect.**

Comme difficulté, on peut relever un manque de semences au niveau de la région pendant cette période.

Tableau 19 : Situation des réalisations de fixation de dunes

Communes	Sites	Superficies traitées (ha)	Nombre de bénéficiaires	Nombre de jour de travail
Kalfou	Toudouni	25	64	4
Tamaské	Azourak Fagué	25	64	4
Keita	Garin Moussa	25	64	4
Déoulé	Guidan Aminkar	21,13	54	4
TOTAL		91,13	246	

Source : Direction Régionale de l'Environnement de Tahoua

■ **Traitement biologique des berges des Koris (Tahoua)**

Cette activité a été réalisée au 3^{ème} trimestre 2020, et au total 9000 ml ont été réalisés sur une prévision de 10 000 ml, soit un taux de réalisation de 90%. Aussi, 237 travailleurs mobilisés dont 182 femmes pour les traitements biologiques pendant 7 jours. **Le rapport annuel 2020 de l'ANFICT ne fait pas ressortir cet aspect.**

Tableau 20 : Situation des réalisations de traitement biologique des berges des Koris

Communes	Distance (ml)	Travailleurs mobilisés		Total	Montant
		H	F		
Keita	4 000	82	25	107	30 000 000
Garahanga	3 000	60	18	78	22 500 000
Tamaské	2 000	40	12	52	15 000 000
Total	9 000	182	55	237	67 500 000

- Au plan financier

A la date du 31 décembre 2020 le montant injectés pour ces travaux s'élève à 6 750 000 FCFA sur une prévision financière de 7 500 000 FCFA.

■ **Aménagement de mares -Tahoua**

Cette activité inscrite dans le PTBA 2019 a été reconduite dans le PTBA 2020. En fin de l'année 2019, la concertation entre l'UGP/R, les Collectivités territoriales et les STD a permis de disposer d'une liste de

cinq mares potentiellement aménageables : trois mares sur cinq ont été identifiées et ont fait l'objet d'une étude diagnostique ayant abouti à l'élaboration d'un rapport APS. Une DP a été élaborée et en cours de finalisation.

Tableau 21 : Liste des mares retenues pour l'étude

Lot N°1 : Pour l'Etude Complete (APS et APD)

°	Nom	Coordonnée GPS	Commune	Département
1	Mare de Dogon Gona	Lat : 14°27.9692' N Long : 005°58.2580' E	DEOULE	BOUZA
2	Mare de Azao	Lat : 14°42.7171' N Long : 005°11.6014' E	ILLELA	ILLELA
2	Mare de Eghadé	Lat : 15°25.7459' N Long : 005°42.8771' E	KAO	TCHINTABARDE N
4	Mare de Tatawassan	Lat : 14°59.3692' N Long : 006°03.3944' E	IBOHAMANE	KEITA
5	Mare de Tapkin Zaki	Lat : 15°02.3425' N Long : 004°55.0966' E m	TAKANAMATT	TAHOUA

Lot N°2 : Pour Complément d'Etude (APD)

°	Nom	Coordonnée GPS	Commune	Département
1	Mare de Maléfla	Lat : 14,32342 N Long : 005,13364 E	ILLELA	ILLELA
2	Mare de Beidi	Lat : 14,83587 N Long : 005,72267 E	ILLELA	ILLELA
3	Mare de Dangona	Lat : 14,26935 N Long : 005,04145 E	ILLELA	ILLELA

2.2. Résultat 2.

« La réalisation d'infrastructures et d'aménagement permettent, dans un contexte de changement climatique, la valorisation durable des terres arables en vue de retenir les jeunes dans les sites concernés et d'améliorer les revenus des populations »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle - | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Etudes d'aménagement de sites maraîchers (Agadez)		**				- Finalisation de la DP ; - Consultation des candidats ; - Analyse des offres techniques.	Sélection du prestataire et démarrage de l'étude en 2021
Etudes pour la réalisation de seuils d'infiltration et le traitement des berges de koris(Agadez)		**				- DP transmise aux candidats présélectionnés - Analyse des offres techniques - Analyse des offres financières - Signature du contrat - Démarrage de l'étude - Validation de l'APS	Lancement du DAO et signature des contrats en 2021
Etude de faisabilité technique, sociale, environnementale du barrage d'OUREY, et de ses aménagements associés (Agadez)		**				- Elaboration de l'AMI ; - Lancement de l'AMI ; - Ouverture et analyse des proposition des candidats.	Sélection du prestataire et démarrage de l'étude en 2021
Boutiques d'Intrants Agricoles (Tahoua)				****		Contrats signés pour 5 BIA Remise des sites et démarrage des travaux	Réception des BIA en 2021
Etudes des miro projets intégrés dans les vallées de production de 18 communes dans la Région de Tahoua					*****	Réalisé	Atelier de validation avec le BNEE en 2021
Construction de 49 seuils (Tahoua)			***			Signature des contrats pour la réalisation de 34 seuils dans la région de Tahoua pour un montant total d'environ 5,7 milliards FCFA. Remise des sites, paiement des avances de 20%, et démarrage des travaux Publication du DAO pour la réalisation de	Poursuite des travaux sur les 34 seuils engagés, sélections des entreprises et démarrage des travaux sur les 10 seuils de Bagaroua et Illela

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
						10 seuils dans les départements de Bagaroua et Illela	

■ Détail par activité

■ Etudes d'aménagement de sites maraîchers - Agadez

L'aménagement des sites maraîchers constituent une des actions qui permet de créer des emplois durables pour les jeunes, les femmes et les « acteurs de l'économie migratoire ». C'est une stratégie pour faciliter l'accès à la terre pour les couches vulnérables que sont ces groupes. Elle permet aussi l'augmentation et la diversification de la production. Ces aménagements contribueront de ce fait à l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de la population. Il était prévu dans le PTBA 2020 de conduire les études pour l'aménagement de 8 sites dans 8 communes et d'aménager un site dans la commune urbaine d'Agadez.

○ Déroulement de l'activité

Les principales activités réalisées pour la conduite de cette activité sont les suivantes :

- La finalisation de la Demande de Proposition ;
- La transmission de la DP aux différents candidats figurant sur la short-list ;
- L'analyse des offres techniques

Il est prévu en 2021 de poursuivre le processus de recrutement du prestataire et de réaliser l'étude.

■ Etudes pour la réalisation de seuils d'infiltration et le traitement des berges de koris-Agadez

La réalisation de ces seuils aura un impact sur plusieurs centaines de jardins et favorisera certainement la création de nouveaux jardins dans les zones de production. Ils permettront de recharger la nappe donc de pallier au moins partiellement le problème crucial d'eau qui prévaut dans les jardins riverains ainsi que les risques d'inondations des zones de production par les écoulements violents des koris.

○ Déroulement de l'activité

Il était prévu dans le PTBA 2020 de conduire les études pour la réalisation de 25 seuils d'infiltration et le traitement de berges de koris.

Au 31 décembre 2020, les activités réalisées sont :

- La transmission de la DP aux candidats identifiés par le processus de l'AMI ;
- L'analyse des offres techniques ;
- L'analyse des offres financières ;
- La signature du contrat avec le cabinet attributaire ;
- Le démarrage de l'étude ;
- La collecte des données ;
- L'élaboration de l'Avant-Projet Sommaire (APS) ;

- La validation de l'APS ;
- L'élaboration de l'Avant-Projet Détaillé (APD).

Il est prévu en janvier 2021 la validation des APD et l'élaboration des DAO.

Tableau 22 - sites potentiels de réalisation des seuils d'infiltration

N°	Site	Type de seuil	Longueur (m)	Coordonnées	Coordonnées
1	Tamanet 1	Seuil d'infiltration	177.02	9°1'29,2"	17°52'39"
2	Tamanet 2	Seuil d'infiltration	91.00	9°0'36,21"	17°53'50,37"
3	Téwart 1	Seuil d'infiltration	198.50	8°37'43,8"	17°34'15,1"
4	Téwart 2	Seuil d'infiltration/Radier	275.00	8°37'49.02"	17°35'5.03"
5	Aouderas	Seuil d'infiltration	228.00	8°24'4.66"	17°37'31.49"
6	Boghol 1	Seuil d'infiltration	675.00	8°11'35.31"	17° 8'47.79"
7	Boghol 2	Seuil d'infiltration	477.21	8°12'38.34"	17°11'23.09"
8	Teghazar 2	Seuil d'infiltration	267.12	8° 7'24.66"	17° 2'17.29"
9	Tchibnitan	Seuil d'infiltration	269.82	7°57'3,6"	17°1'29,1"
10	Gofat Ouest 3	Seuil d'infiltration	505.17	7°50'50,73"	17°03'26,00"
11	Sabongari	Seuil d'infiltration/Radier	368.96	8°11'56.49"	17° 1'26.09"
12	Teguert 1	Seuil d'infiltration	57.00	8°49'41.69"	18°10'36.98"
13	Tassalwat 2	Seuil d'infiltration	261.50	8°46'13.74"	18° 7'57.29"
14	Tassalwat 1	Seuil d'infiltration	113.00	8°46'40.07"	18° 7'40.99"
15	Ajiro 1	Seuil d'infiltration	315.50	08°49'19.75"	17°55'47.38"
16	Ajiro 2	Seuil d'infiltration	508.00	08°47'52.02"	17°57'06.11"
17	Zomo 2	Seuil d'infiltration	288.50	08°56'14.6"	18°26'53.9"
18	Zomo 3	Seuil d'infiltration	290.00	08°56'25.2"	18°25'52.1"
19	Iférouane	Seuil d'infiltration	942.00	08°25'18.3"	19°05'32.1"
20	Agalal	Seuil d'infiltration	756.94	8° 9'46.67"	18°42'21.07"

Tableau 23 - sites potentiels de réalisation des digues de protection

	Site	Type d'ouvrage	Longueur (m)	Coordonnées	
1	Téwart 1	Gabions	934	8°37'43,8"	17°34'15,1"
2	Dakata	Digue en gabions et Pierres sèches	1 477	8°57'15.40"	17°31'55.21"
3	Imin Nabaro	Digue en gabions et Pierres sèches	3 558	8°56'51.11"	17°32'38.69"
4	Tassalamsalam	Digue en gabions et Pierres sèches	3 863	8° 6'7.00"	17°16'2.42"
5	Toudou	Gabions	3 467	7°58'43.24"	16°59'44.92"
6	Gofat Ouest 1	Pierres sèches	3 261	7°52'34,31"	17°3'50,17"
7	Gofat Ouest 2	Digue en gabions et Pierres sèches	3 626	7°54'54,46"	17°03'21,20"
8	Gofat Ouest 3	Digue en gabions et Pierres sèches	1 952	7°50'50,73"	17°03'26,00"
9	Sabongari	Digue en gabions et Pierres sèches	3 300	8°11'56.49"	17° 1'26.09"
10	Balla	Digue en gabions et Pierres sèches	5 494	8°14'54.86"	17° 2'22.57"
11	Tassalwat 2	Digue en gabions et Pierres sèches	3 386	8°46'13.74"	18° 7'57.29"
12	Tassalwat 1	Pierres sèches	1 079	8°46'40.07"	18° 7'40.99"
13	Tola	Pierres sèches	3 399	8°42'59.07"	18°28'20.29"
14	Zomo 1	Gabions	3 007	08°56'42.7"	18°27'23.1"
15	Zomo 2c	Pierres sèches	1 456	08°56'14.6"	18°26'53.9"

	Site	Type d'ouvrage	Longueur (m)	Coordonnées	
16	Zomo 3e	Pierres sèches	1 500		
17	Iférouane	Digue en gabions et Pierres sèches	2 910	08°25'18.3"	19°05'32.1"
18	Gougaram	Digue en gabions et Pierres sèches	1 937	7°48'13.73"	18°27'28.68"
19	Mizen	Digue en gabions et Pierres sèches	7 442	7°52'13.48"	17°52'42.97"

- **Etude de faisabilité technique, sociale, environnementale du barrage d'OUREY, et de ses aménagements associés (Agadez)**

L'AMI a été élaboré, lancé. Le rapport d'évaluation est disponible. La DP est en cours d'élaboration.

- **Boutiques d'Intrants Agricoles (BIA) - Report 2019 Tahoua**

Dans le PTBA 2019, il était prévu de réaliser sept (7) BIA. A fin décembre 2019, deux (2) BIA ont été réalisés (d'Ibohamane et de Tamaské) et le processus de passation de marchés était en cours pour les 5 autres (communes de Kalfou, Déoulé, Allakaye, Tajaé et Bagaroua). Ces activités ont été reportées sur PTBA 2020.

Au cours du premier semestre 2020, le processus de passation de marché a été bouclé et une note a été produite par l'UGP/AT en collaboration avec le RECA afin d'éclairer la décision de financement. L'ANO pour la réalisation de ces investissements a été obtenu le 28 mai 2020 et les contrats ont été signés pour un coût global de 37 279 339 FCFA hors taxe. A fin décembre 2020, l'ensemble des sites ont été remis et les travaux sont en cours.

Tableau 24 - sites potentiels de réalisation des digues de protection

N°	Département	Communes	Nom du village	Coordonnées GPS	
				Longitude	Latitude
1	Bagaroua	Bagaroua	Bila	04°722063'	14°366365'
2	Tahoua	Kalfou	Sabon gari	5°32,421	14°43,097
3	Bouza	Déoulé	Djiballé	5,5844,00	14°30.01"
4		Allakaye	Tadoupta	5°49'08,00	14°31.36,8"
5	Illela	Tajaé	Iskitta	5°28'804	14,24'049"

- **Etudes des micro projets intégrés dans les vallées de production de 18 communes dans la Région de Tahoua**

Pour rappel, en fin 2019, le processus de recrutement des prestataires pour les études intégrées des 17 vallées a été bouclé. L'étude concerne trois lots. Les Cabinet adjudicataires sont les suivant :

- Lot n°1 : Cabinet AGECHRAU
- Lot n°2 : Groupement BETIFOR/AGESI
- Lot n°3 : Cabinet CEFID

Le Cabinet CEFID a déposé les rapports thématiques (pédologique, topo, agronomique, socio-économique, hydrologique, géotechnique) et le rapport APS pour le lot 3 au Conseil Régional le 31 décembre 2019 et les ateliers de validation ont été programmés en 2020.

Au cours du premier semestre 2020, les rapports pour les lots 2 et 3 ont été reçus et un atelier de validation a été tenu en mars 2020. Ces rapports ont été validés et par la suite les DAO des ouvrages ont été élaborés et également validés. En revanche, pour le lot 1, les rapports ont été reçus fin mars 2020 et observés en avril 2020 par les STD (atelier non réalisé compte tenu des mesures restrictives cf. COVID-19). L'atelier de

validation des APD pour le lot n°1 a eu lieu à Illela en aout 2020 et le processus d'élaboration du DAO a été entamé. L'ANO sur le DAO a été obtenu le 30 décembre 2020 et le DAO publié le 31 décembre 2020.

■ Construction de 49 seuils - Tahoua

Signature des contrats pour la réalisation de 34 seuils dans la région de Tahoua pour un montant total d'environ de 5,7 milliards FCFA. Remise des sites, paiement des avances de 20%, et démarrage des travaux.

Ainsi, à fin décembre 2020 :

- Les rapports des lots 2 et 3 (voir ci-dessus) ont permis d'élaborer les DAO pour 35 seuils dans 14 communes. Au 31 décembre, 34 seuils sont en cours d'exécution répartis dans 13 communes d'inventions, Kao (département de Tchintabaraden), Ibohamane, Garhanga, Tamaské et Keita (Département de Keita), Déoulé et Allakaye (Département de Bouza), Arrondissement communal 2 (Ville de Tahoua) et Kalfou, Barmou, Bambèye, Takanamatt et Tébaram (Département de Tahoua) ;
- Deux seuils du lot 2 et 3 issus de l'avis d'appel d'offres de l'arrondissement communal 1 et 2 de Tahoua sont infructueux suite à la décision de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; ces lots seront relancés en 2021 ;
- Le rapport du lot 1, a permis de valider 10 seuils et l'avis d'appel d'offres a été publié le 31 décembre 2020. Les travaux seront réalisés en 2021.

Tableau 25: Répartition des 35 seuils des lots 2 et 3 dans les communes de la région de Tahoua

N°	Département	Communes	Nom des sites	Coordonnées GPS	
				Longitude	Latitude
1	Tchintabaraden	Kao	Intaliwan 1	5°30'40.93"E	15°12'28.42"N
2			Darodji 3	E : 4°57'58,88"	N : 15°05'24,03"
3		Kalfou	Somo 1	5°29,835 E	14°42,318 N
4			Somo 2	5°29,569 E	14°42,444 N
5			Somo 3	5°29,214 E	14°42,290 N
6			Touboubounou Elana	5°32,421 E	14°43,097 N
7			Touboubounou Somo	5°31,960 E	14°42,810 N
8		Bambèye	Gataraoua 2	5°21'385"E	14°59'872"N
9			Gataraoua 3	5°10.470"E	14°33.315"N
10		Tébaram	Ijali 1	5°19'156" E	14°0.050 N
11		Takanamat	Amaloul	4°,58'17.60"E	15,05'25.40"N
12		Barmou	Ourihamizan 1	5°28'54.00"E	15°14'48.60"N
13			Ourihamizan 2	5°29'03.50"E	15°13'05.99"N
14	Bouza	Allakaye	Kaché 1	5°44'52.04"E	14°30'16.41"N
15			Kaché 4	5°40'31.81"E	14°20'58.60"N
16			Kaché 5	5°46'16.75"E	14°29'47.06"N
17			Kestara	5°45'24.07"E	14°28'24.51"N

N°	Département	Communes	Nom des sites	Coordonnées GPS	
				Longitude	Latitude
18	Keita	Daoulé	Loubé	6° 2'28.91"E	14°36'48.86"N
19		Garhanga	Farat Baba	6° 1'17.18"E	14°41'21.89"N
20			Sakaraoua Toudou	5°55'34.68"E	14°42'6.49"N
21			Laba	5°57'17.14"E	14°36'40.43"N
22		Ibohamane	Gadamata	6° 5'35.74"E	14°48'3.22"N
23			Tacha Boka	5°48'20.34"E	14°44'47.75"N
24			Karkamat	6° 6'3.16"E	14°55'20.88"N
25			Loudou seuil	5°54'19.39"E	14°58'24.54"N
26			Loudou barrage	5°54'39.24"E	14°55'34.51"N
27		Tamaské	Zabi Allela	5°41'30.67"E	14°44'11.60"N
28			Sakolé	5°40'55.68"E	14°50'23.52"N
29			Kogui	5°40'46.07"E	14°48'39.02"N
30		Keita	Kirari seuil	5°49'29.00"E	14°44'58.58"N
31			Kirari ANPIP	5°48'20.34"E	14°44'47.75"N
32			Keita OPVN	5°46'4.18"E	14°45'6.46"N
33			Guidan Fako	5°44'46.40"E	14°44'38.50"N

Tableau 26 : Répartition des 11 seuils du lot 1 dans les communes de la région de Tahoua

Commune	Sites des ouvrages projetés	Distance Village/Site	Coordonnées GPS des axes des ouvrages	
Badaguichiri	Kossa 1	1 km au sud	14°15'56,8" N;	005°31 '26,6"E
	Kossa 2	3,9 km au sud-ouest	14°15'39,1"N ;	005°30 '3,6"E.
	Kossa 3	2,75 km Sud-ouest	14°15'52,4"N ;	005°30 '252,9"E
	Gougouhéma 1	3 km au Nord	14°13'36,4"N ;	004°50 '14'9"E.
	Gougouhéma 2	2 km au Nord-Est	14°12'47,6"N ;	004°50 '01,4"E.
	Tawayé	4 km au Nord-ouest	14°16'29,2" N;	004°40 '09"E.
Illéla	Kwara 1	500 m au Nord-Ouest	14°13'36,4"N ;	004°50 '14'9"E
Tajaé	Kwara 2	1 km à l'ouest	14°07'23,7" N;	005°0,00 '34'4"E
	Kwara 3	300 m à l'Est	14°13'36,4" ; N	004°50 '14'9". E
	Iskata	500 m au Nord	14°14'41,8" N;	005°17 '2,8"E.
	Tajaé sédentaire	1,8 km au sud	14°11'46,3" ; N	005°16 '1,0" E

2.3. Résultat 3.

« Les différentes étapes de la valorisation des produits agricoles jusqu'à leur mise en marché sont améliorées »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Etude de réhabilitation des pistes rurales (Agadez)		**				- Ouverture et analyse des offres techniques ; - ANO obtenu sur les PV et rapports d'ouverture et d'analyse des offres techniques ; - Rapport d'analyse des propositions financières transmis à l'AFD pour ANO. L'AFD a objecté et fait des observations	Non prise en compte des observations formulées par l'AFD sur le rapport d'évaluation par le Conseil Régional Relance du processus par l'UGP/AT en 2021
Construction de magasins de stockage de produits agricoles (Agadez)					*****	. Elaboration d'une note . Elaboration et lancement des DAO . Sélection des entreprises . Signature des contrats . Exécution et suivi des travaux . Réception de 2 magasins de stockage 200T des produits agricoles.	
Construction d'une maison de paysan complète (Agadez)		**				- Elaboration du DAO	Validation du DAO et lancement du processus de passation de marchés en 2021
Construction du mur de clôture de la maison du paysan (Agadez)		**				- Elaboration du DAO	
Etude diagnostique de la gestion des comptoirs de commercialisation des produits agricoles (Agadez)			***			- Ouverture et analyse des propositions de l'AMI - ANO pour les résultats de l'analyse des propositions de l'AMI ; - Elaboration de la DP	Recrutement du prestataire et réalisation de l'étude au second semestre
Etude pour la commercialisation et la transformation des produits agricoles (Agadez)				****		. Analyse des propositions financières . Elaboration et signature du contrat . Réalisation des études	Validation du rapport de l'étude en 2021

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
						- Dépôt du rapport intermédiaire.	
Etude pour la mise en valeur du potentiel agricole autour des 15 seuils réalisés dans le cadre du projet Badaguichiri et identification des besoins d'accompagnement – Tahoua					*****	- Etude est bouclée.	
Construction de 2 centrales d'approvisionnement en intrants agricoles – Tahoua				****		- Les contrats sont signés - Les constructions sont au stade de finition	Réception prévue début 2021
Construction de 6 magasins de 200T de stock de sécurité alimentaire - Tahoua					*****	- 4 magasins de 200 tonnes de stock de sécurité alimentaire réceptionnés (Ibohamane, Déoulé, Kao et Arrondissement Communal 1 de Tahoua)	- Pour le magasin Bambey, l'investissement a été annulé (infrastructure similaire déjà existante au niveau de la commune) ; - ANO sous réserve obtenu pour le magasin de Tébaram.
Construction d'un magasin de 200T de stock d'aliments à bétails - Tahoua				****		- Les contrats sont signés - Les constructions sont au stade de finition	Réception prévue début 2021
Construction d'une maison du paysan complète - Tahoua		**				- ANO obtenu sur le DAO ; - Avis d'appel d'offres publié le 16 décembre 2020	Sélection du prestataire, signature des contrats et travaux en 2021
Identification des besoins et construction d'un centre de collecte d'oignon - Tahoua					*****	- L'étude de faisabilité économique et sociale validée le 31 décembre	Publication du DAO en 2021

■ Détail par activité

■ Réhabilitation des pistes rurales - Agadez

Cette activité programmée dans le PTBA 2019 a été reconduite dans le PTBA 2020. En fin 2019, la demande de proposition a été élaborée, avec le concours de la Direction Régionale du Génie Rural d'Agadez, et transmise aux candidats retenus.

Au cours du premier semestre 2020, les offres des candidats ont été réceptionnées et il a été procédé à :

- L'ouverture et analyse des offres techniques pour la sélection du prestataire : L'ANO a été obtenu le 31 mars 2020 ;
- L'ouverture et analyse des propositions financières des candidats a eu lieu et le rapport d'évaluation a été envoyé à l'AFD le 22 juillet 2020 pour demande d'ANO.

À la suite de l'examen du dossier, l'AFD a formulé des observations pour la revue du rapport d'évaluation. Il s'agissait entre autres de :

- D'écarter l'adjudicataire des 2 lots proposé pour cette étude, qui est déjà adjudicateur sur les 2 lots des études berges et koris avec les mêmes personnels et moyens ;
- De réexaminer et de se prononcer l'offre du soumissionnaire anormalement basse par rapport aux autres offres.

Ces observations ont été transmises au Conseil Régional. Malgré les multiples explications et conseils de l'UGP/AT, la prise en compte des observations par le conseil régional n'a pas été faite et les différentes offres se sont retrouvées hors délais. Le processus sera relancé en 2021 par l'UGP/AT.

■ **Construction de magasins de stockage de produits agricoles - Agadez**

L'activité de construction de deux magasins dans la région d'Agadez était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020.

Les magasins à réaliser à travers l'appui du projet ont essentiellement deux vocations :

- Dans les communes où ils font partie des éléments de la maison du paysan (cas de Dabaga et d'Iférouane), ils jouent une fonction de stockage pour la sécurité alimentaire, tel que défini par le manuel type de gestion de la MP.
- Pour les sites hors MP, les magasins ont pour rôle de stockage avant écoulement des produits agricoles (cas de Tokadi, CR de Tabelot et Oufen, CR de Timia). C'est-à-dire un centre où seront groupés et transiteront pendant une brève période les produits issus des sites irrigués de la zone du magasin. Ils n'ont pas de vocation de conservation, ni de stockage à long terme des produits agricoles.

Au 31 décembre 2019, le processus de construction de ces magasins était au stade de publication des DAO. Au cours de l'année 2020, les activités suivantes ont été réalisées :

- Elaboration des notes justificatives devant orienter la décision de financement du bailleur pour sept (7) magasins ;
- Réception provisoire des magasins de Dabaga, Iférouane, Oufen et Gougaram ;
- Elaboration et lancement des DAO des magasins de Toudou Bila (CU d'Agadez) et Attri (CU de Tchirozérine) ;
- Sélection des entreprises
- Signature des contrats
- Exécution et suivi des travaux
- Réception provisoire des magasins de Toudou Bila et Attri.

○ **Les réalisations**

- *Au niveau technique*


Au 31 décembre 2020, les deux magasins ont tous été réceptionnés. Le suivi technique des travaux a été assuré par la Direction Régionale du Génie Rural et ses démembrements. Un comité local constitué de représentants des futurs usagers a été mis en place afin d'assurer le suivi communautaire de la construction de l'infrastructure.

Après la réception provisoire des travaux, il a été procédé, avec l'appui de la Direction Régionale de l'Agriculture, à la mise en place et la formation des Comités de Gestion des deux magasins. Cette formation a été assurée par le Service Régional de l'Action Coopérative de la DRA d'Agadez au cours du mois de novembre 2020. L'accompagnement se poursuivra et des termes de référence ont été initiés par la DRA pour appuyer ces comités.

• .

- Au plan financier

Sur une prévision globale de 60.000.000 Francs CFA, il a été réalisé **49.213.940** Francs CFA, soit un taux de réalisation financière de 82%.

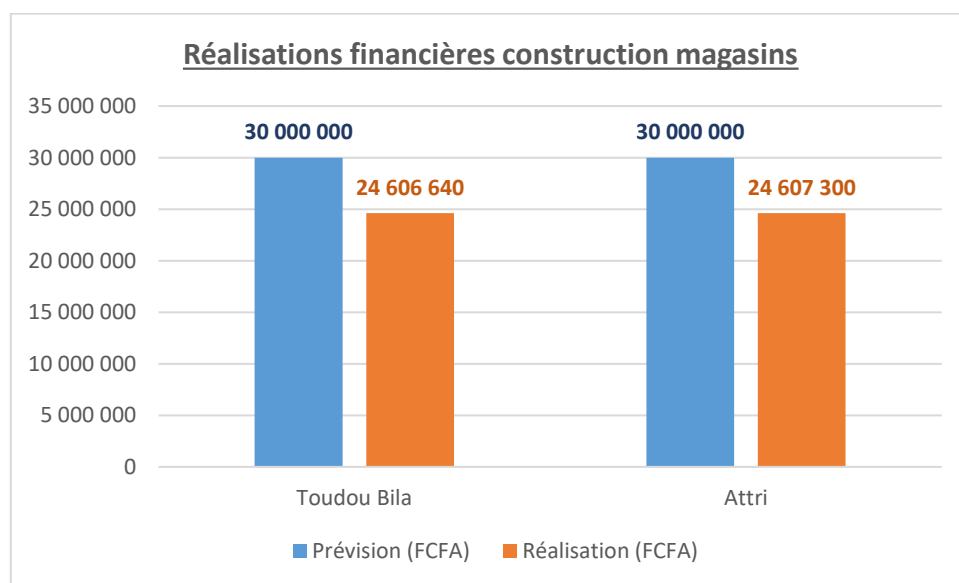

■ Construction d'une maison du paysan complète - Agadez

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. Au 31 décembre 2019, les coordonnées géographiques ont été relevées ainsi que l'acte de cession du terrain de 3 ha qui abritera la maison du paysan produit par la mairie de Tabelot.

Au cours du 1^{er} semestre la DRGR a réalisé une mission de collecte des données qui a permis de disposer des données. Ainsi, une version des DAO a été élaborée avec l'appui de la Direction Régionale du Génie Rural.

Cependant, il est attendu l'élaboration d'une note explicative pour orienter la décision de financement au cours du premier trimestre de l'année 2021 qui conditionnera l'obtention de l'ANO sur cette activité.

■ **Etude diagnostique de la gestion des comptoirs de commercialisation des produits agricoles - Agadez**

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. En fin 2019, l'AMI a été lancé et les propositions reçues analysées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, les tâches suivantes ont été réalisées au cours de l'année 2020 :

- ANO sur les résultats de l'AMI a été obtenu le 31 mars 2020 ;
- Finalisation de la DP ;
- Transmission de la DP aux candidats présélectionnés ;
- Analyse des offres techniques.

Le processus de sélection du prestataire se poursuivra en 2021.

■ **Etude de marchés pour la transformation et la commercialisation des agrumes, pomme de terre et oignon - Agadez**

Le processus pour la réalisation de l'étude de marchés pour la transformation et la commercialisation des agrumes, pomme de terre et oignon a démarré en 2019. En décembre 2019, il était au stade de l'ouverture et de l'analyse des offres techniques.

Au cours de l'année 2020, il a été réalisé les activités suivantes :

- Analyse des propositions financières ;
- Elaboration du projet de contrat ;
- Signature du contrat ;
- Démarrage de l'étude et collecte de données ;
- Dépôt du rapport intermédiaire.

Il est attendu au cours du premier trimestre de l'année 2021, l'élaboration et la validation du rapport provisoire de l'étude, ainsi que la mise en œuvre des activités qui seront identifiées dans la feuille de route.

■ **Etude pour la mise en valeur du potentiel agricole autour des 15 seuils réalisés dans le cadre du projet Badaguichiri et identification des besoins d'accompagnement - Tahoua**

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. En fin 2019, l'ANO sur l'analyse des offres financières a été obtenu et le processus de passation de marché a été bouclé en 2020. L'étude a été réalisée et un atelier de validation de l'APD s'est tenu le 19/11/2020 à Illela. Les activités relatives à la mise en valeur seront réalisées en 2021.

■ **Construction de deux centrales d'approvisionnement en intrants agricoles - Tahoua**

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. L'ANO sur les résultats d'attribution provisoire pour le magasin de Tamaské a été obtenu le 19 décembre 2019, et le rapport provisoire d'adjudication a été élaboré pour la commune de Keita.

Au cours du premier semestre 2020, l'ANO sur les projets de contrats a été obtenu pour le magasin de Tamaské et Keita respectivement le 28 mai 2020 et le 30 mai 2020. Les contrats sont signés pour un montant de 22 037 250 Fcfa à Tamaské et 24 237 950 Fcfa pour la commune de Keita.

Les avances de 20% ont été payées à chacune des entreprises et les travaux ont démarré au cours du mois de novembre 2020 pour un délai contractuel de 3 mois pour chacun de magasin. A la date du 31 décembre, les travaux sont au stade de finition pour les deux magasins.

■ Construction de 6 magasins de 200T de stock de sécurité alimentaire - Tahoua

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. En fin 2019, 3 magasins de 200 T étaient en chantier (Ibohamane, Déoulé et Arrondissement communal 1 de Tahoua) et 3 autres (Kao, Tébaram et Bambey) étaient dans le processus de passation de marchés.

Au cours de l'année 2020 :

- Les réceptions provisoires des magasins Arrondissement communal 1 de Tahoua, de Ibohamane et Déoulé ont eu lieu respectivement le 10 janvier, le 09 janvier et le 05 mars 2020 ;
- Pour le magasin de Kao : la réception a eu lieu le jeudi 01 octobre 2020 ;
- Pour le magasin de Tébaram : L'ANO pour la construction du magasin a été obtenu le 30 mai 2020 assortie d'une demande de note explicative devant orienter la décision de financement de cette infrastructure. Le projet de note a été élaboré, cependant, compte tenu du contexte sécuritaire (zone classée rouge), le projet n'a pas pu se rendre dans la commune pour échanger avec les bénéficiaires et finaliser ladite note.
- Pour le magasin de Bambey : Il est ressorti que la commune de Bambey dispose d'un investissement similaire réalisé par un autre bailleur et non exploité. Cet investissement a donc été annulé.

■ Construction d'un magasin de 200T de stock d'aliment bétail - Tahoua

Le PTBA 2020 prévoit la construction d'un magasin de stock d'aliments bétail dans la commune d'Ibohamane, comme élément de la maison du paysan. La construction de ce magasin permettra le stockage d'aliments bétail et leur cession aux éleveurs aux moments de rareté de fourrage. Au cours du premier semestre 2020, le processus de passation de marchés a été finalisé et le contrat a été signé pour un montant de 23 203 950 FCFA hors taxes.

Au 31 décembre 2020, la construction est au stade de finition et la réception interviendra en 2021. Une avance d'un montant de 4 640 790 FCFA a été versé à l'entreprise.

■ Construction d'une maison du paysan complète - Tahoua

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. En fin 2019, une étude topo du site a été réalisée afin de déterminer les besoins en aménagement sommaire du terrain avant l'installation des chantiers de construction. L'élaboration du DAO devant intervenir en 2020.

Au cours du premier semestre 2020, le DAO a été élaboré. L'UGP/AT en collaboration avec les autres acteurs (I3N, DRA, DRRA et CRA) a organisé en novembre 2020 une mission à Taknamatt pour rencontrer les bénéficiaires (autorités communales et OP) afin d'échanger et apprécier la pertinence de l'investissement. Au sortir de ces échanges, une note explicative montrant la pertinence de l'investissement a été produite afin d'éclairer la décision de financement. L'ANO sur le DAO a été obtenu le 02 décembre 2020 et l'avis d'appel d'offres a été publié le 16 décembre 2020. L'analyse des offres et la réalisation des travaux interviendront en 2021.

■ Identification des besoins et construction d'un centre de collecte d'oignon - Tahoua

Cette activité était inscrite dans le PTBA 2019 et a été reconduite dans le PTBA 2020. L'activité n'a pas démarré en 2019. Au cours de l'année 2020, le TDR de cette étude a été finalisé. Il est porté par la Direction Régionale de l'Agriculture afin de conduire l'étude de faisabilité économique et sociale. L'atelier de validation de cette étude est intervenu le 31 décembre 2020 et a confirmé la faisabilité de l'investissement et le processus se poursuivra en 2021.

2.4. Résultat 4.

« Les collectivités territoriales exercent la maîtrise d'ouvrage des investissements à caractère économique »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Appui à l'actualisation des PDC - Agadez		**				- Les propositions techniques pour l'élaboration des 5 PDC (communes de Dabaga, Tabelot, Tchirozérine, Iférouane, et Gougaram) ont été analysées.	
Appui à l'actualisation PDC - Tahoua		**				. PDC Takanamatt validé ; . PDC Kalfou, Bambeye Barmou et Déoulé : Processus de sélection en cours ; ANO sur les AMI des PDC de Badaguichiri, Ibohamane et Tajaé obtenus le 11 nov 2020. .	
Appui à l'élaboration du SAF de la région Agadez		**				- - Le Comité Régional de Coordination ainsi que le Comité Technique Régionale d'élaboration du SAF ont été créés et installés ; - Validation de la feuille de route	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisation	Commentaires/ Perspectives
	*	**	***	****	*****		
Appui à l'élaboration du Schéma d'Aménagement Foncier (SAF) de la Région de Tahoua : phase diagnostic		**				- La DP a été finalisée et l'ANO a été obtenu le 15 mai 2020 ; - ANO sur le rapport d'évaluation technique obtenu le 12 août 2020 ; - Les rapport d'attribution a été partagé et la prise en charge des commentaires est en cours.	Concertation avec le Conseil Régional pour la mobilisation des ressources additionnelles pour le financement du diagnostic.
Evaluation et actualisation du PDR – Agadez				****		Le draft du PDR est disponible	Le PPR appuiera la vulgarisation du PDR en 2021
Appui à l'élaboration du PDR -Tahoua		**				Prestataire sélectionné	Appui en 2021
Dynamisation des COFOCOM et mise en place et formation des COFOB - Agadez		**				Les TDR ont été actualisés pour prendre en compte les nouvelles cofob	Retard du fait de la non-disponibilité de certains acteurs chargés de l'accompagnement technique.
Mise en place, Formation et équipement des COFOB - Tahoua			***			. 51 COFOB sont mises en place et formées avec l'appui du SPR/Code Rural	Il reste la mise en place des équipements de fonctionnement des COFOB en 2021
Redynamisation les structures des COFOCOM – Tahoua			***			18 arrêtés de nominations des COFOCOM ont été signés par le Gouverneur de la Région	
Concertation entre les élus communaux et ceux du CR sur la question de l'intercommunalité – IC- Agadez		**				Atelier d'échanges sur la thématique organisé	
Concertation entre les élus communaux et ceux du CR sur la question de l'intercommunalité – IC- - Tahoua		**				TDR pour la mise en œuvre de l'activité réactualisés.	
Appuyer la tenue d'un cadre de concertation entre acteur					*****	Réalisé	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisation	Commentaires / Perspectives
	*	**	***	****	*****		
Appui à l'élaboration du PIA 2020 du Conseil Régional					*****	Réalisé	
Formation des acteurs régionaux sur la maîtrise d'ouvrage (Tahoua-Agadez)					*****	Réalisé	
Fonctionnement du CSOF				***		- 5/12 sessions du CSOF tenue à Tahoua dont une session départementale (difficultés à mobiliser les acteurs) - 11/12 sessions du CSOF tenue à Agadez dont une session départementale sur douze prévues	

■ Détail par activité

■ Appui à l'actualisation des PDC.

○ Agadez

Cinq des huit communes de la composante 1 du PPR ont dans leur PIA 2019 exprimé leur besoin de re-planification de leur PDC. Compte tenu de la pertinence des PDC dans la mise en œuvre de la vision de développement local, le PPR s'est donc engagé à appuyer les communes de Dabaga, Tabelot, Tchirozérine, Iférouane et Gougaram dans cet exercice.

A la fin de l'année 2019, le processus de sélection des prestataires était en voie de parachèvement. Le processus d'accompagnement des cinq communes pour la re-planification de leur PDC devant se poursuivre à travers le PTBA 2020.

Les activités réalisées au cours du 1^{er} semestre 2020 sont :

- Actualisation des termes de référence avec l'appui de la Direction Régionale du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire ;
- Elaboration de la DP ;
- Consultation de la liste restreinte ;
- Réception des propositions techniques et financières des candidats ;
- Ouverture et analyse des offres techniques.

○ Tahoua

Le PPR a prévu dans le PTBA 2020 de re-planifier les PDC des Communes suivantes : Takanamatt, Bambeye, Barmou, Déoullé et Kalfou dont le processus a commencé depuis l'année 2019 et pour lesquelles la DP a eu l'ANO.

Au cours de l'année 2020, les Commune de Bambeye, Barmou, Déoulé et Kalfou, ont envoyé aux prestataires les lettres d'invitation à soumissionner adressées. L'UGP/R et la DRDC/AT vont appuyer la mise en place des comités de replanification dans ces communes dès lors que le processus de sélection sera bouclé. Par

ailleurs, en 2020, sept (7) communes ont obtenu le principe de réactualisation de leur PDC. Il s'agit des communes de Keita, Tamaské, Ibohamane, Garhanga, Illéla, Tajaé et Badaguichiri. Ces dernières sont au stade de l'AMI qui sera publié.

■ **Appui à l'élaboration du SAF de la région**

○ **Agadez**

Aussitôt après la validation du PTBA 2020, le Secrétariat Permanent Régional du Code Rural (SPR/CR), le Gouvernorat et le Conseil Régional ont particulièrement été accompagnés dans le processus d'élaboration du SAF avec une forte implication de la DRDC/AT.

Le Comité Régional de Coordination ainsi que le Comité Technique Régionale d'élaboration du SAF ont été créés et installés. Le Gouverneur de la Région a en effet pris les arrêtés de création avant de procéder à l'installation officielle des membres desdits comités.

De même, la feuille de route élaborée a été adoptée au cours d'un atelier organisé à cet effet.

Pour le second semestre, il s'agira de vulgariser la feuille de route auprès de l'ensemble des acteurs de la région, de mettre en œuvre les activités prévues, de renforcer la concertation entre les différents acteurs.

○ **Tahoua**

A la fin de l'année 2019, le Conseil Régional a finalisé l'appel à manifestation d'intérêt afin de constituer une liste restreinte de prestataires capables d'appuyer et faciliter le processus. L'activité devant poursuivre en 2020. Au cours de l'année 2020, les activités ci-dessous ont été conduites :

- La DP a été finalisée et l'ANO a été obtenu le 15 mai 2020 ;
- ANO sur le rapport d'évaluation technique obtenu le 12 août 2020 ;
- Les rapport d'attribution a été partagé et la prise en charge des commentaires est en cours.

Le SPR/Code Rurale estime le coût global du SAF à un montant de 798 119 800 FCFA. La partie diagnostic devrait coûter 220 503 880 F CFA. Dans son appui, le PPR compte contribuer pour 100 millions dans la conduite du diagnostic. A cette date, le Conseil Régional continue la mobilisation des partenaires en vue de boucler le financement pour la réalisation du diagnostic.

■ **Evaluation et actualisation du PDR du Conseil Régional**

○ **Agadez**

Les activités réalisées au cours de l'année 2020 sont décrites ci-dessous :

- Synergie avec GIZ/ProEmploi pour la mise à disposition d'un consultant auprès du Conseil Régional d'Agadez dans le cadre de l'évaluation et la re planification du plan de développement Régional (PDR).
- Appui à la formation du comité d'actualisation du PDR ;
- Appui du consultant au comité mis en place jusqu'à la production du draft de PRD actualisé.

Il faut noter qu'une note du ministère de tutelle est intervenue vers la fin de l'année pour proroger la durée des PDR jusqu'au 31 décembre 2021.

○ **Tahoua**

En 2019, le Conseil Régional et la Direction Régionale du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire (DRDC/AT) se sont accordés sur la démarche et un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un facilitateur était en cours d'élaboration. Cette activité a été reconduite en 2020. Au cours du premier semestre 2020, les réunions de concertation entre le Conseil Régional, la DRDC et l'UGP/R se sont poursuivies. La DP a été élaborée et l'ANO obtenu le 15 mai 2020. Le Conseil Régional a envoyé les lettres d'invitation à soumissionner. La restitution des résultats d'analyse des offres financières a eu lieu le 9 septembre 2020 et a eu l'ANO le 2 octobre 2020. Le projet de contrat est finalisé et sera soumis à la demande d'ANO

■ **1406 - Mise en place et formation COFOCOM et COFOB**

○ **Agadez**

Les activités réalisées au cours de l'année 2020 sont :

- Echanges sur les procédures de mise en place, de renforcement des capacités et d'accompagnement des structures du code rural dans le contexte d'Agadez
- Synergie avec GIZ/PromAP dans le choix des villages pour la mise en place des COFOB ;
- Actualisation des TDR pour la dynamisation des COFODEP.

○ **Tahoua**

Au cours du premier semestre 2020, les TDR portant sur la redynamisation des COFOCOM ainsi que la mise en place de 51 COFOB par le SP/R du Code Rural ont été validés. Du point de vue démarche, le SPR/Code Rural a procédé au renouvellement des COFOCOM qui par la suite ont appuyé la mise en place et la formation des COFOB. Ces activités ont été réalisées de septembre à novembre 2020..

Ainsi, 18 arrêtés de nominations des COFOCOM ont été signés par le Gouverneur de la Région. A la suite, 51 COFOB ont été mises en place et formées. Il reste à finaliser avec le SPR le détail de leurs équipements en 2021

■ **Concertation entre les élus communaux et ceux du CR sur la question de l'intercommunalité –IC-**

○ **Agadez**

Dans la région d'Agadez, huit communes à fort potentialités agricoles et le conseil régional sont généralement à la base de projet dans le domaine agricole. La réalisation des projets communs de développement économique et d'aménagement de l'espace implique une coopération intercommunale. La compréhension et le partage des textes régissant cette coopération objet de plusieurs interprétations nécessitent l'animation de groupe de travail autour de ces textes en plus d'un voyage d'études sur l'intercommunalité conformément aux lois et arrêtés contenus dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Projet Pôles Ruraux s'est engagé à accompagner cet exercice de communication afin de permettre à ses partenaires locaux de mieux réussir la mise en œuvre de certaines actions en lien avec le développement des filières agricoles.

A la fin de l'année 2020, les acteurs décentralisés de la région ont pu tenir un atelier d'échanges autour des textes régissant l'intercommunalité. Il s'est agi d'un atelier d'une journée présidé par le Conseil Régional. Les huit communes ont été représentées par leur exécutif respectif. Le contenu de quelques textes nationaux dont le « Code Général des Collectivités Territoriales, édition 2018 » ont fait l'objet d'exposés et de débats. L'on retient aussi la participation active des assistants techniques affectés au Conseil Régional avec l'appui de partenaires comme l'Union Européenne.

○ Tahoua

La plupart des communes partenaires disposent de ressources naturelles partagées (vallées), partagent des intérêts convergents, etc. L'approche du PPR induit le fait qu'un certain nombre d'activités concernent plusieurs communes à la fois. Il est attendu que qu'à l'issue de l'activité, les communes intéressées selon leur centre d'intérêt posent les jalons de l'intercommunalité. L'activité concerne les 18 communes d'intervention du PPR dans la Région de Tahoua. L'UGP/R a envisagé cette activité afin de donner aux élus l'occasion de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette opportunité et d'apprécier la faisabilité de cette démarche entre elles. Certes l'intercommunalité a des avantages pour les communes, mais il serait intéressant pour celles-ci de constater par elles-mêmes à travers un voyage d'étude les modalités de mise en œuvre d'une telle mutualisation. Globalement, l'activité consiste à recruter un consultant qui structurera un voyage d'étude pour des élus et un forum de ces derniers sur l'intercommunalité.

A la fin de l'année 2019, l'UGP/R de son côté a préparé les TDR pour le voyage d'étude à Kornaka (siège de l'Association des Communes du Canton de Kornak) et clarifié avec le Conseil Régional le profil du consultant qui sera recruté pour accompagner l'activité. Cette activité a été reconduite dans le PTBA 2020.

Les activités réalisées au cours du premier semestre 2020 sont :

- L'actualisation des TDR de l'activité ;
- La définition du profil du consultant devant faciliter l'exercice ;
- La poursuite des échanges avec le Conseil Régional afin de finaliser la préparation de cette activité.

■ Appuyer la tenue d'un cadre de concertation entre acteurs - Agadez

De façon opérationnelle, il s'est plutôt agi d'appuyer le fonctionnement du cadre de concertation qui existait déjà. En effet, la commission consultative régionale de l'administration territoriale (COCORAT) est créée par le décret n° **2013-035/PRN/MI/SP/AR du 1er février 2013** fixant les règles relatives à la déconcentration au Niger. Elle est donc un cadre de consultation, de concertation et d'échange d'informations. Elle donne son avis sur toute question à elle soumise par le gouverneur relativement au développement de la région. Elle est informée des programmes et plans régionaux de développement et est tenue au courant de l'état d'avancement des actions de développement dans la région. Elle émet des avis et/ou formule des recommandations sur les orientations de l'action de l'Etat et des collectivités territoriales dans la région, notamment en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire. La COCORAT donne son avis sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente, propose les ajustements éventuels de la programmation de l'exercice en cours en fonction des ressources effectivement mobilisées et des décisions d'utilisation ou de répartition prises.

Le maître d'œuvre de cette activité est la Direction Régionale du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire. L'UGP /AT a appuyé la DRDC/AT dans la tenue de cette commission en participant activement à l'élaboration des TDR, l'identification des participants, le choix de la salle, etc. Les travaux de l'unique session ordinaire au titre de l'année 2020 de la Commission Consultative Régionale de l'Administration Territoriale (COCORAT) ont été présidés par le Ministre du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire, en mission de travail dans la région. L'on y a enregistré la participation des plus hautes autorités régionales déconcentrées (Gouvernorat, Préfecture), décentralisées (élus des niveaux Régional et communal) et coutumières (Sultan, chefs de groupements) en plus de plusieurs cadres centraux et régionaux. Il y avait également des représentants des partenaires techniques et financiers intervenants dans la région et ceux des organisations de la société civile.

A l'image de l'édition 2019, plusieurs communications ont été présentées durant les deux jours de la session par les différents groupes thématiques.

Ces communications ont porté, entre autres, sur :

- bilan annuel des ONG/AD au titre de l'année 2019, par le responsable des ONG/AD au niveau de la DRDC/AT/AZ ;
- la situation de dépôt de rapport au niveau national (des 3.169 ONG/AD autorisées ou agréées, 637 ont déposé leurs rapports soit un taux de dépôt de 22%, pour un coût de plus de 103 milliards de FCFA) ;
- les nouveaux enjeux et défis qui se dressent dans le secteur des ONG/AD ;
- la question de la décentralisation et le niveau de mise en œuvre des transferts de compétence;
- les programmes/projets mis en œuvre par la GIZ (PromAP, ProDEC, ProGEM et ProEMPLOI) ;
- le Projet d'Appui au Développement d'Activités Rurales et au Financement des Filières Agricoles dans les Régions d'Agadez et Tahoua (PPR).

L'un des premiers effets pour le projet est l'amélioration de la visibilité du PPR. En effet, des acteurs d'horizons divers, les médias locaux et la télévision nationale ont su focaliser l'attention de toute la région sur les activités du projet Pôles Ruraux, deux jours durant.

Du fait de l'éclat de la session 2020 de la COCORAT d'Agadez, les participants à la première session ordinaire de la Commission Consultative Régionale de l'Administration Territoriale de la Région d'Agadez, tenue les 31 Octobre et 1er Novembre 2020, à la Maison de la Culture Laya d'Agadez a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la mise en œuvre et la synergie des actions de développement dans la région d'Agadez.

■ **Appui à l'élaboration du PIA 2020 du Conseil Régional**

Le plan d'investissement annuel est à la fois une émanation et un instrument de mise en œuvre du plan de développement régional. Il constitue un outil de planification des actions à mettre en œuvre, chaque année. Son élaboration est rendue obligatoire pour le l'exécutif du conseil régional. Cela justifie l'appui du projet Pôles Ruraux qui contribue à l'atteinte de développement régionaux.

Le Conseil Régional a bénéficié de l'accompagnement technique de la DRDC/AT pour l'élaboration de propositions de TDR en vue de la réalisation de l'activité avec l'appui financier et l'impulsion de l'UGP/AT.

■ **Formation des acteurs régionaux sur la maitrise d'ouvrage (Tahoua-Agadez)**

Suite à la signature de la convention avec le CFGCT le 11 septembre 2020, le CFGCT a procédé :

- 1- A la mise en place au niveau des CT (Tahoua, Agadez et CR) et des Délégations Régionales de l'ANFICT (Tahoua et Agadez) 30 jeunes stagiaires pour un accompagnement en continu par l'action comme demandé par les bénéficiaires. Cette action de placement sur la base contractuelle concernera les élèves diplômés du Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales de l'Ecole Nationale d'Administration notamment ceux de la promotion de la Promotion 2018/2019 de Section : Administration des Collectivités Territoriales (ACT) et de la Section Finances Locales.
- 2- Au renforcement les capacités des acteurs régionaux intervenant dans le processus de la maitrise d'ouvrage : Le CFGCT a organisé la formation concomitamment dans les deux régions : Tahoua du 16 au 18 novembre 2020 et Agadez du 17 au 19 novembre 2020. Au total 124 participants ont été formés (78 CT, 2 CR, 14 STD et 30 stagiaires).

■ **Fonctionnement du CSOF**

○ **Agadez**

Les activités réalisées au cours de l'année 2020 sont :

- Organisation d'une mission d'appui aux receveurs municipaux pour le scannage et la remontée des pièces justificatives ;
- L'élaboration des termes de référence pour la tenue des sessions du CSOF ;
- 11 sessions du CSOF tenues.

Bonnes pratiques

- L'interpellation des maires par leur collègue représentant des CT au CSOF, en cas d'insuffisances avérées sur les pièces justificatives ;
- Les sessions du CSOF constituent un cadre d'autoévaluation pour les STD concernés dans la conduite des activités.

○ **Tahoua**

- L'élaboration des termes de référence pour la tenue des sessions du CSOF ;
- 5 sessions du CSOF tenue sur cinq prévues (difficultés à mobiliser les acteurs).

Composante 2

La composante 2 vise à faciliter l'accès des acteurs des filières aux institutions financières. Elle concerne l'ensemble du territoire des régions d'Agadez et Tahoua et est financée par l'AFD

Pour rappel, les principales réalisations au titre de l'année 2019 se résument à : (i) les formations sur l'éducation financière des OP, (ii) le démarrage (4^{ème} trimestre) des opérations de crédit au profit des acteurs des filières de la région de Tahoua (les jeunes agriculteurs notamment), et (iii) l'accompagnement du processus d'opérationnalisation de la Facilité 1 du FISAN (« Soutien au crédit agricole ») dans le cadre des études sur les mécanismes de garantie et de subventionnement sous l'égide du HCI3N.

La mise en œuvre de la Composante 2 au titre de l'année 2020 reposait sur les actions ci-dessous : (i) l'opérationnalisation de la Composante 2 dans la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route, (ii) le renforcement du dispositif de financement par la signature de conventions avec les SFD partenaires de Tahoua en vue d'assurer le financement à coûts partagés des investissements agricoles, notamment au bénéfice des jeunes agriculteurs formés par les CRA, (iii) le suivi de la mise en œuvre du financement à coût partagé au travers des IF partenaires dans les deux Régions ; (iv) l'accélération du processus d'élaboration du Plan de renforcement des capacités des IF ; (v) l'accélération du processus de signature de la convention avec le FISAN pour la mise en place du fonds de garantie.

Les principales réalisations au titre de l'année 2020 se résument à : (i) Les fonds de subventions d'équilibre aux SFD partenaires sont effectivement virés, concrétisant le plaidoyer du PPR et de l'AFD, (ii) Les conventions de financement sont signées avec les 4 SFD (FINAIR, UCMN, YTM et CF), (iii) Le démarrage du Financement à Coût Partagé (FCP) dans la région de Tahoua avec une bonne implication des SFD est lancé, (iv) La mission d'appui de l'ATFR en octobre 2020 aux partenaires CRA et SFD, marquée par le lancement de la campagne dans la région de Tahoua, ayant abouti à la préparation et au montage de 712 dossiers après les pré-visites, (v) La mission de l'ATFR en décembre dans la région de Tahoua, pour suivre les engagements pris lors de sa mission précédente, au cours de laquelle, une répartition des dossiers montés par la CRA entre les IF pour financement a été faite et un suivi rapproché des opérations de financement, (vi) Le suivi de l'élaboration de la convention avec le FISAN sur la mise en place du fonds de garantie agricole, (vii) le suivi de la demande d'ANO sur les TDR pour l'élaboration du Plan de renforcement des capacités des IF, (viii) le suivi du dossier SOS Faim en collaboration avec le RECA, (ix) et l'organisation à Agadez d'une session de formation de recyclage en éducation financière des responsables des OP et GF formés en 2019.

Les principales difficultés et contraintes rencontrées sont :

- **Délais pris pour la validation du rapport de la mission d'opérationnalisation de la composante 2 a retardé la signature des conventions d'appuis institutionnels aux SFD** : Pour rappel les TdR de la mission ECT/C2 ont reçu l'ANO de l'AFD le 08 novembre 2019 et, en raison de l'agenda du consultant, des diligences relatives à l'élaboration du PTBA 2020 et l'organisation du Comité de pilotage au cours du mois de décembre 2019, le démarrage de la mission n'est intervenu que le 02 janvier 2020. Le rapport a été validé le 02 juin 2020.

- **Report des ateliers de capitalisation sur le financement à coûts partagés et de l'atelier diagnostic des enjeux d'accès des EAF** au financement du fait du COVID 19 ;
- **Retard dans le traitement et surtout la validation des dossiers par le comité central de crédit de la BAGRI qui pourtant a reçu 80 % des dossiers repartis** : La prise en charge par les agences de la BAGRI (Tahoua, Konni et Madaoua) des demandes de financement des producteurs n'a pas répondu aux attentes en dépit du fait qu'au moment de la répartition des dossiers, des engagements impartis de délais ont été pris pour éviter l'expérience d'Agadez. La Bagri Konni par exemple, a reçu 253 dossiers et jusqu'au 31 décembre 2020, aucun n'a été financé. Malgré les multiples échanges et relances du PPR, les engagements pris par la BAGRI pour accélérer le traitement des dossiers n'ont pas été suivi d'effet. En outre, la BAGRI n'a toujours pas fourni le rapport annuel.

Un projet de lettre pour interpellier la BAGRI par rapport au respect des termes de la convention est en cours d'élaboration.

- **Capacités limitées des CRA à satisfaire la demande** en termes de montage des dossiers de crédit (peu d'agents pour traiter les dossiers dans les régions) ;
- **Insuffisance de suivi par la CRA des dossiers transmis aux IF** : en effet, la CRA a tendance à ne pas suivre le reste du processus de financement des promoteurs et se rétracte une fois les dossiers transmis aux IF.

2.5. Résultat 5.

« Un mécanisme d'appui au financement des investissements agricoles est mis en place avec les institutions financières »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Soutien aux Exploitations Agricoles Familiales - EAF				****		1483 dossiers transmis (1262 dossiers au niveau de la BAGRI et 221 dossiers répartis sur les 4 SFD retenus) Signature : le 17/06/2020, de conventions avec les SFD FINAÏR et CMN ; Signatures : le 08 septembre 2020 avec Yarda et Capital Finance le 01 décembre 2020 Préparation de la convention PPR-Agri+ ;	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
						Taux de remboursement du crédit à 123% des premières échéances dans la région de Tahoua	
Soutien aux petites et moyennes entreprises	*					Non réalisée	Identification des structures d'accompagnement des MPER et des porteurs de projets de PME au second semestre

■ Détail par activité

■ Soutien aux Exploitations Agricoles Familiales - EAF

Pour rappel, en fin 2019 cinq IF ont été retenues à savoir une banque (la BAGRI) et quatre SFD (Yarda Tarka Maggia, UCMN, Capital Finance et FINAIR). La convention avec la BAGRI a été signée le 11 septembre 2019 : cette convention a permis le financement, dans la région de Tahoua, d'une centaine de dossiers des jeunes pour environ 39 millions de FCFA.

Quatre conventions ont été signées avec quatre SFD partenaires :

- Signature des conventions avec les 2 SFD d'Agadez (FINAÏR et UCMN) le 17/06/2020 ;
- Signature des conventions avec les 2 SFD de Tahoua (Yarda le 08 septembre 2020 et Capital Finance le 01 décembre 2020).

Au cours de cette année 2020, le suivi du Financement à Coût Partagé (FCP) dans les deux régions a été assuré à travers deux (2) missions réalisées par l'ATNFR sortant et deux autres par celui entrant.

Pour le premier semestre :

- une première mission en mars portant suivi de la mise en œuvre du FCP a permis d'apprécier à travers des échanges (avec la CRA, la BAGRI, le ProDAF, la DRA et les bénéficiaires de crédit) l'état de mise en œuvre de la convention PPR-BAGRI ;
- une seconde mission conduite en juin, afin de suivre les dispositions prises par les jeunes emprunteurs de la région de Tahoua pour honorer leurs engagements avec la BAGRI pour le remboursement de la première échéance (due le 20 juin).

Pour le second semestre :

- Une mission a été réalisée en octobre 2020 à la prise de fonction du nouvel ATFR rencontrer les acteurs de Tahoua dans le cadre de la préparation de la campagne sèche-froide ;
- Une mission a été réalisée en décembre 2020 afin de faire le point des dossiers préparés conformément aux engagements pris, leur répartition aux IF et répondre aux questionnements des SFD qui viennent de rejoindre le dispositif de financement.

Il est à préciser que les informations postées dans le présent rapport sont celles résultants du suivi des opérations par l'Assistance Technique Finance Rurale. En effet, la Banque BAGRI qui concentre l'essentiel des opérations de financement, n'a toujours pas produit le rapport attendu au 31 décembre 2020 comme l'a prévu la convention de partenariat.

- Au niveau des deux Régions, les réalisations 2020 au titre du FCP sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Réalisations globales 2020 du FCP à Tahoua et Agadez :	
Dossiers transmis aux IF pour financement :	1 483
Dossiers financés :	377
Taux de financement :	25,42 %

• **Situation de financement IF Agadez en 2020**

- 771 dossiers déposés dans les IF (BAGRI, FINAÏR et CMN), dont 217 appartenant à des jeunes formés) et transmis aux IF et SFD ;
- 128 dossiers financés.

Tableau 27 : Situation du financement par IF dans la région d'Agadez

N°	Institution Financière	Nombre de Dossiers reçus	Nombre de bénéficiaires	Montant total (FCFA)	Montant Prêt (FCFA)	Montant apport (FCFA)	Montant subvention (FCFA)
1	BAGRI	700	83	61 799 800	30 899 900	5 632 605	25 267 295
2	CMN	34	34	16 226 700	8 113 250	983 125	7 130 325
3	FINAÏR	37	11	15 172 800	7 586 400	836 520	5 943 390
	Total	771	128	93 199 300	46 599 550	7 452 250	38 341 010

• **Situation de financement IF Tahoua en 2020**

- 712 dossiers ont été préparés et repartis entre les IF partenaires pour financement au cours de l'année 2020 (BAGRI -Toutes agences dans la Région a reçu 562 dossiers ; YARDA TARKA M a reçu 95 dossiers, CAPITAL FINANCE a reçu 55 dossiers) ;
- 249 dossiers financés par la BAGRI. Les autres SFD démarreront le financement en 2021.

Tableau 28 : Situation du financement par IF dans la région de Tahoua

N°	Institution Financière	Nombre de bénéficiaires	Montant total (FCFA)	Montant Prêt (FCFA)	Montant apport (FCFA)	Montant subvention (FCFA)
1	BAGRI TAHOUA	249	114 192 950	57 096 475	7 709 676	49 386 799
2	YARDA TARKA M.	0	0	0	0	0
3	CAPITAL FINANCE	0	0	0	0	0
	TOTAL	249	114 192 950	57 096 475	7 709 676	49 386 799

➤ La situation des remboursements des échéances au 31 décembre 2020

Tableau 29 : Situation des remboursements des échéances au 31 décembre 2020

Institutions Financières	Montants Accordés	Remboursements prévus 2020	Impayés sur remb. 2020
BAGRI AGADEZ	3 617 750	3 617 750	0
BAGRI TAHOUA	57 096 475	30 027 178	762 883
BAGRI MADAOUA			
BAGRI KONNI	-	-	-
FINAIR ARLIT	5 837 550		
UCMN AGADEZ	8 113 250		
YTM TAHOUA	-	-	-
CAPITAL FINANCE	-	-	-

Les financements des IF sont remboursables par échéances. Le remboursement des échéances attendues en 2020 s'est réalisé à hauteur de 97,76 % ; seul un impayé a été enregistré.

Concernant les crédits accordés par les deux SFD de la région d'Agadez (FINAIR et UCMN), l' le remboursement des échéances interviendra en 2021

En définitive l'analyse des tableaux 27 et 29 montrent que le montant moyen de prêt à Agadez est de 728 120 F CFA, contre 458 6060 F CFA pour Tahoua. Cela peut s'expliquer par les coûts de facteurs de production.

2.6. Résultat 6.

« Les opérations de financement agricoles sont mieux sécurisées »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle - | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Assistance technique à la SAHFI				****		Mission d'appui à la SAHFI réalisée La SHAFI a obtenu l'autorisation du Ministère de tutelle pour l'exercice de ses activités.	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Abondement du FdG « Finance agricole »	*					Tributaire de la validation du mécanisme de garantie FISAN	Projet de la convention PPR-FISAN en cours

■ Détail par activité

■ Assistance technique à la SAHFI

La feuille de route élaborée par la mission ECT/C2 prévoyait le prolongement de l'AT du Cabinet Aliénor (arrivée à terme), sur une durée de 6 mois à partir d'avril, pour finaliser l'opérationnalisation du fonds agricole. Au cours du mois de mai 2020, le HCI3N a introduit auprès du PPR une requête portant sur AT/CT d'une dizaine de jours pour parachever le travail du Cabinet Aliénor dont le contrat a pris fin en février 2020.

Les TdR portant AT/SAHFI transmis par le HCI3N ont fait l'objet de revue qualité et soumis aux commentaires de l'AFD de même qu'un projet de contrat. Suite au retour du bailleur sur les deux documents, la mission a été actée et un ordre de service a été remis le 18 juin et la prestation a démarré le 19 juin. Le rapport a été reçu au cours du mois de juillet 2020 et partagé avec les parties prenantes. Il faut également noter que le Ministère de Finance a donné un avis de non-objection pour autoriser la SAHFI à recevoir des fonds publics. Des échanges FISAN-SAIFI sont en cours pour finaliser le projet de convention élaboré.

2.7. Résultat 7.

« Les capacités des institutions financières sont renforcées pour améliorer les services financiers à l'agriculture »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Appui à la méthodologie de crédit agricole				****		- Réalisation de la mission ECT d'opérationnalisation de la C2 ; -Projet de convention d'appui institutionnel élaboré	
Formation des SFD sur la connaissance des filières agricoles et le cycle de crédit agricole	*					Non réalisé	En lien avec l'organisation de l'atelier SOS Faim

■ **Détail par activité**

■ **Appui à la méthodologie de crédit agricole**

La mission ECT/C2 commanditée par l'IRAM à travers un binôme de consultants (international et national) s'est déroulée entre janvier et février 2020. Le rapport de cette mission produit en mars 2020 a fait l'objet de beaucoup d'échanges avec les partenaires (MAGEL, HCI3N, FISAN, DMCE, ARSM, RECA, AFD) et au sein de l'AFD (Siège et Agence) sur la question de la prise en charge de la subvention d'équilibre. La validation du rapport est intervenue le 02/06/2020 avec la notification par l'AFD au PPR de l'acceptation du principe d'accorder des subventions d'équilibre et de mettre en place une assistance technique aux SFD

La feuille de route élaborée par la mission ECT/C2 prévoyait la finalisation des conventions d'appui institutionnel (révision des propositions budgétaires, harmonisation des appuis avec les autres PTF, passation d'appels d'offres pour les équipements, recrutement d'un coaching transversal, formation des RH) pour le premier semestre 2020. Le rapport n'ayant été validé qu'en juin et au regard de l'urgence d'assurer le financement de la campagne hivernale d'Agadez, la priorité a été donnée aux conventions de financement à coûts partagés. Les conventions d'appui institutionnel seront finalisées à l'issue de la mission d'appui prévue pour l'élaboration des plans de renforcement des capacités des IF.

Toutefois, le PPR a apporté les appuis nécessaires pour permettre aux SFD d'Agadez et de Tahoua d'apprécier les dossiers de crédit agricoles des jeunes.

Le projet a retenu avec le bailleur de faire appel à une expertise externe afin de produire et faire un suivi perlé du plan d'accompagnement des IF partenaires. Aussi, il a été proposé à l'AFD, la mobilisation d'une expertise nationale qualifiée et disponible pour la conduite de la mission. Les TDR ont été partagés.

Composante 3

La composante 3 porte sur la fourniture de services non financiers aux producteurs et autres acteurs des filières agricoles des deux régions concernées. L'approche consiste à renforcer les capacités des STD et des CRA afin d'améliorer les services délivrés, et le développement des appuis aux acteurs des filières.

Ainsi, le PPR a appuyé en 2020 les activités d'accompagnement des STD, soutenu les plans d'actions des CRA et assuré la formation professionnelle de 742 jeunes producteurs.

Sur le volet construction, le PPR a financé la construction du nouveau siège de la CRA/Agadez et organisé la cérémonie officielle d'inauguration en 2019. À la suite d'une pluie diluvienne, les services techniques ont constaté par endroit la nécessité de réaliser des travaux complémentaires afin d'assurer l'étanchéité du bâtiment avant l'occupation par les bénéficiaires. Le devis a été réalisé et transmis à l'entrepreneur.

Comme autres difficultés rencontrées, on peut également citer :

- La non-disponibilité de certains cadres techniques des directions partenaires au moment opportun pour répondre aux sollicitations d'appui au profit des CT ;
- Le retard dans la justification des fonds : L'équipe du PPR a sensibilisé les STD et autres partenaires sur la nécessité de justifier les fonds mis à disposition dans les délais afin de fluidifier la mise en œuvre.

2.8. Résultat 8.

« Les services délivrés au profit des acteurs des filières agricoles par les directions régionales en charge de l'agriculture, du génie rural et de l'environnement sont améliorés »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisation	Commentaires/ Perspectives
	*	*	***	****	*****		
Appui aux activités des Services Techniques Déconcentrés – Agadez et Tahoua				****		Atelier de partage et d'internalisation du PTBA 2020 ; Elaboration du projet d'avenant 2020 à la convention PPR-Gouvernorat d'Agadez ; Elaboration et signature des protocoles spécifiques avec 10 STD ; Elaboration et exécution des TDR par les STD Organisation d'une rencontre sur la mise en œuvre des activités	
Mise en place et animation du dispositif de SE			***			Renforcement des capacités des services de la DRDC/AT sur les CCS ; Mise en place et renforcement des capacités des CCS ;	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisation	Commentaires/ Perspectives
	*	*	***	****	*****		
						Elaboration des TDR pour les missions des CCS sur le terrain ; Réalisations d'une mission au niveau des 26 communes de la composante 1	

■ Détail par activité

■ Région d'Agadez

Les activités réalisées par les STD au cours de l'année 2020 sont les suivantes :

○ *Gouvernorat*

- Supervision, en présence du Ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable des activités de récupération de terres dégradées dans les départements de Tchirozérine et Arlit.

○ *Préfectures*

- Supervision des activités du projet par le Préfet d'Arlet dans les communes de Dannet et Gougaram ;
- Supervision des activités du projet par le Préfet de Tchirozérine dans les communes de Tchirozérine, Agadez, Dabaga et Tabelot.

○ *Direction Régionale du Génie Rural*

- Collecte des données pour l'élaboration des DAO de construction de la Maison du Paysan complète de Tabelot et le mur de clôture de la Maison du Paysan de Dabaga ;
- Elaboration des DAO pour la construction de la Maison du Paysan complète de Tabelot et pour le mur de clôture de la Maison du Paysan de Dabaga ;
- Suivi des travaux de construction du bureau de la Chambre Régionale d'Agriculture et du magasin de stockage avant écoulement de Tokadi ;
- Réception provisoire du magasin de stockage avant écoulement de Tokadi (CR de Tabelot);
- Suivi et réception provisoire des travaux de réhabilitation des bureaux de la Direction Régionale du Génie Rural ;
- Participation aux sessions de formation sur les procédures de passation de marchés publics ;
- Elaboration du dossier de demande de cotation pour les travaux connexes de réhabilitation de la Direction Régionale du Génie Rural ;
- Appui au processus de passation de marché de construction de deux magasins dans les communes d'Agadez et de Tchirozérine ;
- Suivi des travaux de construction de deux magasins dans les communes d'Agadez et de Tchirozérine ;
 - Réception provisoire des travaux de construction de deux magasins dans les communes d'Agadez et de Tchirozérine ;
 - Appui au processus de re.

○ *Direction Régionale de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable*

- Appui à la mise en œuvre des activités de récupération des terres dégradées :
 - Appui à la validation des sites,
 - Élaboration des fiches de microprojets,
 - Formation des encadreurs et COGES,
 - Suivi, supervision ;
 - Évaluation des travaux ;
- Appui à la mise en place des pépinières mixtes de production de plants forestiers et fruitiers :
 - Finalisation des Dossiers de Microprojets des pépinières forestières et fruitières ;
 - Appui aux CT pour l'acquisition des intrants et équipements ;
 - Suivi et supervision des activités.

○ **Direction Régionale de l'Agriculture**

- Appui à la collecte de données pour l'élaboration des notes des magasins de stockage ;
- Appui à la mise en place et à la formation des COGES des magasins de stockage avant écoulement de Tokadi (CR de Tabelot) et Oufen (CR de Timia) ;
- Appui au processus de sélection des prestataires pour l'étude de marché pour la transformation et la commercialisation des agrumes, la pomme de terre et l'oignon ;
- Formation sur les textes de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux Sociétés Coopératives ;
- Appui à l'élaboration des dossiers de demandes de crédit au profit de 18 jeunes de la CR de Dannet ;
- Appui à la mise en relation des SFD avec les jeunes formés dans la cadre du financement à coûts partagés (FCP) ;
- Appui à la BAGRI et aux SFD pour la visite des exploitations des promoteurs de demande de financement dans le cadre du FCP ;
- Participation à la formation sur les procédures de passation des marchés publiques ;
- Participation à l'atelier d'internalisation du PTBA 2020 ;
- Appui aux OP d'Agadez dans le cadre de la participation au SAHEL, édition 2020 ;
- Appui au processus de sélection des prestataires pour l'étude sur la gestion des comptoirs de commercialisation des produits agricoles dans la région d'Agadez ;
- Appui au processus de sélection des prestataires pour l'aménagement des sites maraîchers dans 8 communes de la région d'Agadez ;
- Suivi technique post-crédit des EAF bénéficiaires du financement à coûts partagés.

○ **Direction Régionale du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire**

- Participation à la formation sur les procédures de passation des marchés publiques ;
- Participation à l'atelier de formation sur les CCS ;
- Appui à la mise en place et au renforcement des capacités de huit (8) CCS ;
- Appui à la concertation sur le processus de l'élaboration du SAF ;
- Appui au processus d'actualisation du PDR ;
- Appui au processus de passation de marché d'actualisation de cinq (5) PDC.

○ **Secrétaire Permanent Régional du Code Rural**


Appui à la mise en œuvre des activités suivantes :

- Sécurisation foncière des sites des pépinières ;
- Concertation sur le processus de l'élaboration du SAF ;
- Processus de dynamisation de huit (8) COFOCOM et la mise en place de quarante (40) COFOB ;
- **Coordination Régionale I3N**
 - Elaboration des termes de référence pour la vulgarisation du manuel type de gestion de la Maison du Paysan ;
 - Organisation de trois ateliers départementaux de concertation ;
 - Organisation de la réunion du comité technique régional (CTR).

Tableau 30 : Synthèses des activités par les partenaires à Agadez

Structure	Nombre d'activités	Montant (FCFA)	Pourcentage
DRE	17	43 028 266	44%
DRDC/AT	6	16 861 866	17%
DRA	15	11 370 639	12%
DRGR	12	8 026 824	8%
Gouvernorat	1	7 699 472	8%
Assurance et entretien véhicule	17	4 500 788	5%
DRPFPE	1	2 110 610	2%
CRI3N	2	1 646 586	2%
PREFECTURE ARLIT	1	979 500	1%
SPR/CR	1	890 262	1%
Total	73	97 114 813	100%

Source : UGP PPR

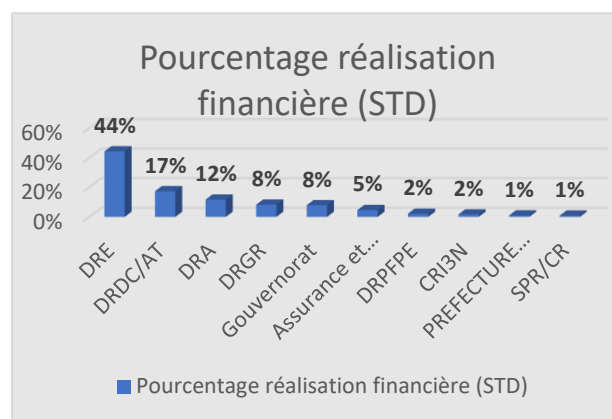

■ Région de Tahoua

➤ Direction Régionale du Génie Rural (DRGR) :

- TDR pour la mission de partage de DAO Keita/Bouza;
- TDR complémentaire Réalisation Etudes Techniques de Réhabilitation de 7 Seuils ;
- TDR complémentaire Indemnités et perdiems des agents dans le cadre du contrôle des travaux de construction des magasins ;
- TDR pour la mission d'identification et caractérisation des mares ;
- TDR Appui à l'élaboration et partage de DAO de 10 seuils
- TDRs Contrôle et supervision construction magasins/BIA
- TDR Remise des Seuils
- TDR Contrôle Seuils
- TDR Prise en compte des Observations sur les Seuils
- TDR Mission partage DAO

➤ Direction Régionale de l'Environnement (DRE/SU/DD)


- TDR/Opérations d'ouverture Bandes Pare-Feu à Kao
- TDR Supervision Bandes pares-feux
- TDRs Suivi et Supervision CES/DRS
- TDRs Suivi et Supervision fixation Dunes
- TDRs Recensement/Formation sur la RNA
- TDRs Suivi des plantations
- TDRs Suivi effets/impacts des sites
- TDRs Identification/Confirmation Bandes pare-feu
- TDR Identification sites bandes pare-feu et formation encadreurs

➤ Direction régionale de l'Agriculture

- TDR Visite du Ministre d'Etat/MAG-EL sur les sites de seuils ;
- TDR Supervision centres de formation des jeunes agriculteurs
- TDRs formation COGES PM
- Participation à la rencontre des CSOF Ta-Az
- Analyse/Diagnostic faisabilité Centre collecte oignon
- **irection régional DC/AT**
- Appui à la replanification du PDC 2020 – 2024 de la Commune Rurale de Takanamatt ;
- Atelier d'échange expériences sur les CCS/à Konni (Ta)
- Participation à l'ouverture et analyse offres PDC
- TDRs Lancement activités CCS
- TDRs Suivi des actions/activités dans les communes
- **SPR/Code Rural**
- TDR redynamisation des COFOCOM ;
- TDR mise en place et formation des COFOB
- **Direction Régional de l'Urbanisme et du Logement (DRU/L)**
- TDR pour l'assistance technique en vue de la construction de la maison de paysan de Takanamatt
- **Conseil Régional**
- Appui à l'organisation des ateliers de validation des Rapports APD des Etudes de 17 Vallées du
- TDRs Validation APS Etude 15 seuils
- TDR Atelier validation rapport APD Etudes mise en valeur des 15 Seuils
- **Gouvernorat**
- TDR Mission de Gouverneur pour l'évaluation des inondations ;
- TDR Contribution pour mission sensibilisation sécurité
- **I3N**
- Accompagnement du Comité Technique Bilan-Actions

Tableau 31 : Situation des activités par les partenaires à Tahoua

Structure	Nombre d'activités	Montant (FCFA)
DRESU/DD	13	52 440 630
DRA	6	25 258 305
DRGR	20	33 405 884
DRDC/AT	6	11 867 106
SPR/CR	1	4 496 570
Conseil régional	3	7 112 484
Gouvernorat	2	1 268 400
I3N	1	500 000
Activités transversales	14	12 782 376
Total	68	149 131 755

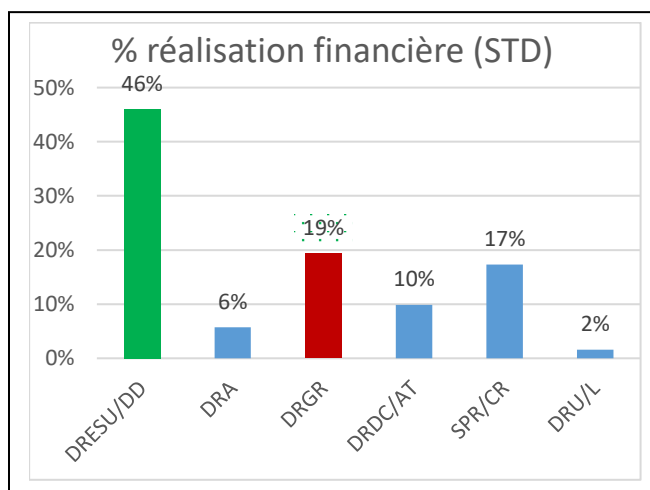

Source : UGP PPR

2.9. Résultat 9

« Les organisations professionnelles agricoles développent leurs services de conseils au profit des acteurs des filières et renforcent leurs capacités d'orientation du développement régional avec l'appui des CRA et du RECA »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | * - Pas d'exécution | ** - Début d'exécution | *** - Exécution partielle | **** - Mise en œuvre avancée | ***** - Terminée |

Activités		Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisations
		*	**	***	****	*****	
Activité de la CRA d'Agadez	Formation des jeunes agriculteurs et agricultrices				****		1^{ère} phase : 25 sites dans 9 communes - 499 jeunes au démarrage - 109 abandons ; - 358 jeunes ont validé la formation sur 380 ayant suivi régulièrement la formation ; - 94% de réussite. 2^{ème} phase : 30 sites dans 9 communes - Démarrage de la formation de 600 jeunes - 107 abandons ; - 483 jeunes ont validé la formation sur 491 ayant suivi régulièrement la formation ; - 98% de réussite.
	Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale (CGEF)				****		- Le CGEF est conduit dans les communes de Dabaga, Tabelot et Agadez - 133 exploitants concernés pour la campagne Saison Sèche - et 160 en Saison Pluvieuse.
Activité de la CRA Tahoua	Formation des jeunes agriculteurs et agricultrices				****		- Pour la saison sèche froide (20 sites de formations dans 14 communes) ; - 431 jeunes inscrits, dont 66 femmes ; - 323/384 sont admis et 47 abandons ; - Pour la saison pluvieuse, (16 sites de formations dans 10 communes) ; - 270 jeunes inscrits dont 75 filles et 195 garçons ; - 225 admis sur les 270
	Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale (CGEF)				****		- 19 sites ont servi de cadre de formation pour 285 producteurs pour la saison sèche froide ; - 10 sites ont servi de cadre de formation pour 150 producteurs pour la saison pluvieuse

■ Détails par activité

■ Activités CRA d'Agadez

Dans le cadre de la convention qui lie le PPR et la CRA d'Agadez, les activités suivantes ont été menées (pour plus de détail, se référer au rapport annuel du RECA CRA en annexe) :

■ Formation des jeunes agriculteurs et agricultrices

L'année 2020 a été caractérisée par :

- La finalisation de la formation des jeunes de la campagne de la saison sèche 2019-2020 ;
- Et le processus pour la formation des jeunes au titre de la campagne d'hivernage 2020.

Il ressort des résultats de la campagne que sur 499 jeunes qui ont démarré la formation dont 49 jeunes filles (9,81%), 109 abandons (soit 22%) ont été enregistrés. 380 jeunes ont été évalués dont 358 réussites (94%).

Les principales causes d'abandon sont entre autres :

- L'exode de certains jeunes en direction des pays voisins (Algérie, Libye) ;
- Le départ vers les sites aurifères.

Au titre de la campagne d'hivernage 2020, trente (30) sites répartis dans 9 communes ont été programmés pour un effectif de 600 jeunes à former. A la date du 31 décembre 2020, sur une prévision de 600 jeunes, 483 ont validé les compétences requises.

Tableau 32 : Synthèse activités de formation des jeunes agriculteurs 2020

Campagne	Nombre de communes	Nombre de sites	Effectifs au démarrage	Abandons	Jeunes n'ayant pas les 135 h	Effectifs évalués	Positifs
Saison Sèche 2019-2020	9	25	499	109	8	380	358
Hivernage 2020		30	600	107		491	483
Total	9	55	1099	216	8	871	841

Source : UGP R (données CRA)

■ Appui pour l'accès au crédit :

Deux principales activités ont été réalisées au cours du premier semestre dans le cadre de l'appui à l'accès au crédit :

- La réalisation des pré-visites au profit des jeunes formés et des autres producteurs :
 - 891 pré-visites réalisées,
 - 771 dossiers élaborés (dont 217 pour les jeunes formés) et transmis aux IF et SFD,
 - 128 dossiers financés.

Bonnes pratiques

- Concertation entre la Chambre Régionale d'Agriculture, les SFD/IF, la Direction Régionale de l'Agriculture et l'UGP pour accompagner le processus d'accès au financement à coûts partagés au profit des jeunes agriculteurs et agricultrices formés.

■ Activités CRA Tahoua

Dans le cadre de la convention qui lie le PPR et la CRA Tahoua, les activités suivantes ont été menées (pour plus de détail, se référer au rapport annuel du RECA CRA en annexe) :

■ Formation Professionnelle agricole des jeunes et accompagnement à l'installation

Cette activité répond à un souci d'insérer les jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole pour décourager les candidats à l'exode et renforcer les capacités des OP.

Pour la Région de Tahoua, concernant la saison sèche froide et après recrutement des prestataires :

- 431 jeunes étaient inscrits, dont 66 femmes,
- 47 abandons,

- 384 jeunes ont suivi la formation de façon effective (135 h),
- 309 sont admis à l'issue de l'évaluation.

Il est prévu 16 sites dans le cadre de la formation des jeunes au titre de la saison pluvieuse. Sur les 270 jeunes inscrits au départ (75 filles et 195 garçons), 45 ont abandonné la formation pour diverses raisons et 225 ont validé les 135 h requises pour passer le test. A l'issue des tests, les 225 sont admis avec un taux de 100% (70 jeunes filles et 155 garçons).

Au total en 2020, 548 jeunes (136 filles et 412 garçons) ont été formés sur les 500 prévus soit un taux de 109,6%

▪ **Appui pour l'accès au crédit :**

- 712 dossiers ont été préparés et repartis entre les IF partenaires pour financement au cours de l'année 2020 (BAGRI -Toutes agences dans la Région a reçu 562 dossiers ; YARDA TARKA M a reçu 95 dossiers, CAPITAL FINANCE a reçu 55 dossiers) ;
- 249 dossiers financés par la BAGRI. Les autres SFD démarreront le financement en 2021.

Composante 4

2.10 Appui au pilotage et à la gestion du projet

Cette rubrique est relative à l'administration et à la gestion du PPR. Les détails des réalisations sont décrits ci-dessous. Les activités ci-dessous ont été réalisées pendant la période rapportée :

▪ **Elaboration du rapport annuel 2019**

Le rapport annuel 2019 a été préparé selon un processus participatif qui engage les équipes régionales et nationale. Un canevas a été préparé par l'UGP N/AT et c'est sur cette base que les équipes ont travaillé. Un appui méthodologique a été effectué *in situ* par le responsable du suivi & évaluation auprès de l'équipe de Tahoua et, à distance, pour l'équipe d'Agadez. Le premier jet du rapport a été envoyé à l'AFD le 29 janvier 2020, et les commentaires de l'AFD ont été reçus le 25 février 2020. Le document finalisé a été envoyé à l'AFD le 28 février 2020.

▪ **Atelier de mise en œuvre du PTBA 2020**

L'avis de non-objection sur le plan de travail et budget annuel au titre de l'année 2020 a été obtenu le 13 février 2020 après la prise en compte des observations sur le projet de PTBA 2020. Pour permettre aux différents acteurs de mise en œuvre du projet de mieux s'approprier le PTBA 2020, l'UGP/AT a préparé un atelier de mise en œuvre du PTBA 2020 qui s'est tenu du 18 au 20 février 2020 à Tahoua. Cet atelier a permis de faire un cadrage des activités prévues et d'échanger avec les différents responsables de mise en œuvre des activités par rapport aux enjeux et défis de l'année 2020 pour le PPR. Il a regroupé les équipes PPR et l'équipe de l'ANFICT les deux premiers jours. Le MAGEL représenté par le Point Focal ainsi que les partenaires de mise en œuvre (STD et RECA-CRA) ont été conviés le troisième jour pour échanger sur les points essentiels au bon déroulement des activités. A l'issue de cet atelier, les planifications 2020 des équipes PPR ont été élaborés.

▪ **Elaboration d'un plan d'action pour le 1^{er} semestre 2020**

Les équipes PPR, compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19, ont procédé à une revue de la planification initiale afin d'élaborer un plan d'actions avril-juin 2020. Ce plan d'action, pour le 1^{er} semestre 2020, est resserré autour des activités prioritaires du projet (notamment le suivi et l'avancement des dossiers de passation de marchés).

■ **Formation en passation de marché à Agadez et à Tahoua**

La première session de formation en passation de marché est intervenue à Agadez du 04 au 09 janvier 2020. Elle a concerné les STD d'Agadez, les équipes PPR, le DR ANFICT Agadez et un représentant de la CRA Agadez. Cette formation riche en pratique a permis d'outiller les participants sur les différents points du cycle de la passation de marché. La deuxième session de formation en passation de marché a eu lieu à Konni du 03 au 09 février 2020. Cet atelier a regroupé les STD, les équipes PPR et l'équipe de l'ANFICT au niveau régional.

■ **Formation de l'équipes finance du PPR sur le logiciel TOM2PRO**

La deuxième session de formation a été réalisée du 13 au 18 janvier 2020. Au cours cette session les budgets 2018 et 2019 ont été saisis ainsi que 90% des pièces comptables de l'exercice 2018. Une autre séance de rattrapage de saisie a été réalisée en février par l'équipe finance pour boucler l'exercice 2018 et 2019. Ce qui a permis l'édition des états financiers 2019 et la préparation de la saisie du budget 2020.

La saisie du budget 2020 devant être faite en séance de travail (pour éviter des obstacles dans l'importation des données des deux sites dans la base principale) selon les conseils du consultant. À la suite du déconfinement de la ville de Niamey, la saisie du budget 2020 et des pièces comptables de janvier à mai 2020 (en séance de travail de groupe) est planifié pour le mois de juillet à Madaoua.

■ **Atelier d'échange et de partage d'expérience sur les CCS**

Dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2020, le PPR a prévu de mettre en place des CCS (comités communaux de suivi) au niveau des communes d'intervention de la Composante 1 dans les régions de Tahoua et Agadez. Un des objectifs poursuivis par le dispositif de S&E du PPR est de renforcer les capacités des communes en matière de suivi évaluation. Ceci, afin que les collectivités puissent assurer le suivi de proximité de l'ensemble des activités mises en œuvre par le PPR au niveau communal, et à termes superviser aussi les activités des autres projets et programmes.

Aussi, le PPR a organisé un atelier à Konni du 25 au 29 Février 2020 avec les DRDC/AT et les Départementaux des deux régions afin échanger sur les modalités de mise en place des CCS pour le suivi des activités du PPR.

■ **Elaboration des notes sur les premiers investissements du PPR**

Pour rappel la production de ces notes fait partie des recommandations de l'AFD à la suite des demandes d'avis de non-objection sur les travaux de magasin et BIA. Cette demande devant permettre d'éclairer la décision de financement est la résultante de la mission de supervision de l'AFD en novembre 19. Les notes ont été produites avec le concours du MAGEL, des STD, HCI3N, RECA-CRA et des collectivités.

■ **Préparation des conventions**

- Avenant à la convention PPR- ANFICT au titre de la mise en œuvre des activités de la C1 du PTBA 2020 a reçu l'ANO le 19 mars 2020 ;
- Avenant à la convention PPR- ANFICT dans le cadre de la mise en œuvre des activités CES/DRS pour le 4^{ème} trimestre a reçu l'ANO le 18 novembre 2020 ;
- Avenant convention PPR/RECA-CRA a été finalisé et a reçu l'ANO le 19 mars 2020 ;
- Signature des conventions avec les 2 SFD d'Agadez (FINAÏR et UCMN) le 17/06/2020 ;
- Signature des conventions avec les 2 SFD de Tahoua (Yarda le 08 septembre 2020 et Capital Finance le 01 décembre 2020) ;
- Signature de la convention avec le CFCGT le 11 septembre 2020 ;
- Préparation de la convention avec le BNEE ;
- Préparation de la convention avec le FISAN

■ **Missions d'appui PPR/MAGEL**

- Le Point Focal du PPR (MAGEL) et le directeur de mobilisation des eaux du MAG/EL ont réalisé en janvier 2020 une mission pour participer à l'atelier de restitution des études de 17 vallées de la région de Tahoua ;

- Au cours du mois de février une mission conjointe AT GAF Tahoua, STD et le Point Focal (PF) PPR dans les communes de Keita et Ibohamane a permis de finaliser les drafts de DAO pour la construction des seuils d'épandage ;
- Au cours du mois de Mars le Directeur de mobilisation des eaux et le point focal ont tenu à Tahoua un atelier (en télétravail en collaboration avec l'UGPR de Tahoua, les STD et le consultant) sur les rapports provisoires déposés par le groupement BETIFOR/AGESI. Les observations de cet atelier ont permis d'aboutir à la production des rapports définitifs et l'élaboration des DAO de seuils des Communes concernés par l'étude ;
- Du 23 au 27 mars 2020, l'ATFINR a réalisé une mission à Tahoua afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention PPR-BAGRI ;
- Au cours du mois d'Avril une mission d'appui à la coordination régionale de Tahoua fut conduite par le point focal du PPR afin d'accompagner les acteurs (l'équipe UGPR, STD et CT) dans l'élaboration des DAO seuils et rappeler les rôles des acteurs dans les différentes étapes de validation des dossiers (les demandes d'ANO) ;
- Au cours du mois de Mai trois missions ont été effectuées dont deux à Tahoua et une à Agadez :
 - o La première mission d'appui à la coordination régionale de Tahoua fut conduite par le Point Focal du PPR (PF) afin de participer à l'atelier de validation des rapports d'études des 17 vallées lot1 et d'accompagner les collectivités du département de Illéla et ceux de Bagaroua dans l'élaboration des DAO seuils ;
 - o La deuxième mission a été conduite par l'AT-GAF Niamey sur Tahoua avec comme objectif de (i) mettre à jour la diligence UE (l'application des clauses de la Lutte Anti-blanchiment et de lutte contre le Financement du Terrorisme (LAB/FT) pour les pièces comptables exercice 2018 et 2019, (ii) participer aux séances de la COPA du 15 et 20/05/2020 pour s'assurer du bon déroulement des travaux au niveau des quatre communes (Keita, Garhanga, Ibohamane et Tamaské) du département de Keita ;
 - o La troisième mission fut conduite par le PF à Agadez et Tahoua dans le but d'appuyer la reprise du processus de recrutement des prestataires pour les études koris et pistes dans la région d'Agadez, d'aider dans la reprise du processus de recrutement des entreprises pour les travaux du magasin de Keita en souffrance dans la région de Tahoua, et d'accompagner le Conseil Régional de Tahoua dans son rôle de maîtrise d'ouvrage des études des 17 vallées (lot N°1).
- Au cours du mois de Juin deux missions ont été effectuées au niveau des coordinations régionales de Tahoua et Agadez :
 - o La première mission d'appui à la coordination régionale de Tahoua et Agadez fut conduite par le coordonnateur national PI et l'assistant technique SE du PPR afin de rencontrer les acteurs de mise en œuvre et faire le point avec les équipes PPR sur l'état d'avancement des activités ;
 - o La deuxième mission fut conduite par le comptable à Tahoua dans le but d'appuyer Collecte des pièces comptable pour l'élaboration de la DRF UE au niveau des communes d'Agadez et de Tahoua
- Au cours du second semestre 2020, plusieurs missions de suivi et d'appui ont été réalisées par l'UGP/AT et le MAGEL dans les deux régions.

■ **Rencontre avec les équipes sur le CSOF et la préparation des DRF**

Le PPR a organisé du 05/10/2020 au 07/10/2020 à dans la région d'Agadez une rencontre d'échange d'expériences entre les CSOF des deux régions afin de capitaliser les bonnes pratiques. Ce cadre a servi également à la tenue des CSOF au titre mois d'octobre 2020. Les données issues de ces CSOF serviront aux équipes UGP/AT pour la préparation de la DRF sur les fonds UE et subvention AFD. L'UGP National a participé de façon effective à cette activité.

Après avoir organisé à Agadez la rencontre d'échange d'expériences entre les CSOF des deux régions afin de capitaliser les bonnes pratiques. Au cours du mois de Novembre les acteurs au niveau de la région de Tahoua se sont retrouvés à Konni pour le CSOF de Tahoua.

Les difficultés liées à la production et à la remontée des pièces de bonne qualité ont été débattues et les acteurs ont pris l'engagement de tout faire pour mettre à la disposition du PPR ces pièces avant la fin de l'année pour finaliser la DRF.

■ **Atelier d'évaluation des rapports des études environnementales et sociales**

Un atelier a été organisé en janvier 2020, par Bureau National D'évaluation Environnementale (BNEE), afin de procéder à l'évaluation des rapports des études : Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), du Plan Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (PCPRP) et du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP).

Les rapports ont été jugés recevables et une convention a été élaborée au second semestre 2020. Cette convention précise les types d'appui du BNEE au PPR ainsi que les activités de suivi/contrôle de la mise en œuvre des différents plans (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (PCPRP) et Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP). Après la signature de la convention avec le BNEE, le certificat de conformité sera délivré au PPR et le BNEE va accompagner le projet pour réaliser le suivi environnemental et social.

■ **Assistance Technique au Pilotage et à la mise en œuvre du Projet**

A ce niveau on peut retenir le non-renouvellement des contrats du Coordonnateur National et du Coordonnateur régional de Tahoua (février-mars), ainsi que la demande de remplacement de l'ATP par le MAGEL (en mars 2020). Le processus de recrutement de deux coordonnateurs (National et régional de Tahoua) a été lancé et un intérimaire a été désigné au titre du poste d'ATP.

Le rapport du recrutement a été validé par le Secrétaire général du MAGEL et la demande d'ANO sur le résultat du recrutement et le projet de contrat avec les deux premiers candidats respectivement coordonnateurs national et coordonnateur régional de Tahoua a été transmis dans la première semaine du mois de juin. Après obtention de l'ANO de l'AFD, le coordonnateur national a pris service le 1^{er} juillet 2020 et celui de Tahoua le 13 juillet 2020.

Le responsable S-E de l'AT assure l'intérim de l'ATP depuis Mars 2020. Il est à noter la démission de l'AT GAF et l'AT finances rurales. Le recrutement pour le remplacement a été lancé et le nouveau AT finances rurales a pris service le 01 octobre 2020, pour le poste AT GAF le processus est en cours.

La Directrice de l'IRAM et la Chargée de projet ont effectué une mission d'appui au Niger en fin octobre 2020. Cette mission à dimension institutionnelle et technique, a pour objectifs de redynamiser les équipes de l'AT. Une réunion de restitution a été organisée avec les parties prenantes et des propositions ont été formulées au sortir de cette mission (voir PV en annexe).

Pour les missions d'expertise court terme :

- 3 ont été réalisées : Formation en matière de passation de marché (mission terminée- Livrables disponibles) ; Conception d'un Système d'Information (mission terminée- Livrables disponibles) ; Opérationnalisation de la composante 2 (mission terminée, Livrables disponibles) ;
- 1 en cours : Mission d'expertise court-terme en appui aux STD, aux collectivités et aux équipes du PPR en matière d'ingénierie sociale.

On peut également noter, des échanges constants avec le siège de l'IRAM sur un rythme hebdomadaire.

■ **Activités administratives et financières ou autres activités transversales**

- Suivi des demandes d'ANO ;
- Suivi de la situation financière du projet ;
- Tenue des réunions de coordination hebdomadaires ;
- Rapprochements bancaires ;
- Suivi des feuilles de temps ;
- Paiement des dépenses ;
- Règlement des salaires ;
- Déclaration des impôts et cotisations sociales ;
- Etc.

■ **Mesures prises dans le cadre de la prévention contre le COVID-19**

Le projet PPR s'est aligné, tant au niveau national que régional, sur les mesures sanitaires prise par les autorités, dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID 19 (distribution de gel hydroalcoolique, de masques, mise en place du dispositif de lavage des mains, etc.)

2.11 Difficultés rencontrées et mesures prises pour les surmonter

Comme difficulté rencontrée sur la période on peut citer :

- Le non-renouvellement des contrats du coordonnateur national et régional de Tahoua, le départ de l'Assistant Technique Permanent. Pour pallier cette difficulté, la désignation d'un intérimaire pour la Coordination Nationale et d'un intérimaire pour l'Assistance Technique a été effectué et les processus de recrutement et remplacement entamés ;
- La situation née de la COVID 19 qui a impacté certaines activités du projet du fait des mesures prises pour bloquer la propagation du virus. A ce niveau, les équipes du projet en lien avec les partenaires ont pris des mesures adéquates afin d'assurer la continuité du travail ;
- La non-transmission des rapports des partenaires dans les délais, et la qualité desdits documents rendant l'exploitation ardue dû aux fautes qu'ils ne contiennent pas des informations essentielles notamment l'évolution des indicateurs du projet.


2.12 Modifications introduites en cours de mise en œuvre

Compte tenu de la période électorale, les parties prenantes (MAGEL, ANFICT et PPR) ont convenu de permettre au projet PPR d'assurer les paiements directs des travaux afin d'accélérer la mise en œuvre des activités CES/DRS prévues au 4^{ème} trimestre. Pour ce faire, un avenant à la convention de financement 2020 PPR/ANFICT a été signé le 23 novembre 2020.

III. Bilan des principaux résultats de l'Action (à l'aide des indicateurs compris dans la convention) au cours de la période rapportée.

3.1 Etat de mise en œuvre du PTBA 2020

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible PTBA 2020 (Fin-A)	Réalisation des régions	Total réalisations	%
Composante 1 : Mise en œuvre par les collectivités territoriales des infrastructures et des aménagements collectifs publics ou communautaires nécessaires au développement durable des productions agricoles et leurs mises en marché (cofinancé par UE et AFD)						
Résultat 1 : Des aménagements combinés permettent de préserver le potentiel productif des eaux et des terres afin de valoriser ensuite des productions des filières porteuses	Nombre de km pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre ha de CES/DRS,	ha	15 125	2 000	4 471	30%
	Nombre ha de fixation de dunes	ha	2 000	-	-	0%
	Nombre ha de RNA,	ha	5 000	-	-	0%
	Nombre de pépinières fonctionnelles,	nb	55	0	25	45%
	Nombre de plants plantés et conservés (et),	nb	1 630 712	-	-	0%
	Nombre de mares aménagées,	nb	5	0	-	0%
	Nombre de km de brise vent et de haies vives plantées et conservés (taux de reprise 95%) ;	km	500	-	-	0%
	Nombre de km de couloirs de passages/axes de transhumance et d'espaces pastoraux balisés	km	5 000	0	-	0%
	Nombre de km de couloirs de passages/axes de transhumance et d'espaces pastoraux balisés	km	5 000	0	-	0%
Résultat 2 : La réalisation d'infrastructures et d'aménagements permettront, dans un contexte de changement climatique, la sécurisation durable des terres arables en vue de valoriser les jachères dans les sites concernés et d'améliorer les revenus des populations						
Résultat 2 : Les différentes étapes de la valorisation des produits agricoles jusqu'à leur mise en marché sont améliorées	Nombre de km d'infrastructures routières,	km	0	0	0	0%
	Nombre de fermes de production durable,	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins de stockage durablement construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins de stockage avant récolte construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins construits	nb	0	0	0	0%
	Nombre de magasins construits	nb	0	0	0	0%
Résultat 3 : Les collectivités territoriales mettent à disposition des équipements à caractère économique						
Résultat 4 : Les collectivités territoriales mettent à disposition des équipements à caractère économique	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%
	Nombre de km de pannes feux,	km	1 000	1 000	1 000	100%



3.2 Etat d'avancement du PPR 2018-2021

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible globale du projet	Réalisations				Total réalisations		
				2018	2019	2020	2021	Qt	%	
Composante 1 : Mise en œuvre par les collectivités territoriales des infrastructures et des aménagements collectifs publics ou communautaires nécessaire au développement durable des productions agricoles et leurs mises en marché (cofinancé par UE et AFD)										
Résultat 1 : Des aménagements combinés permettent de préserver le potentiel productif des eaux et des terres afin de valoriser ensuite des productions des filières porteuses	Nombre de km pares feux,	km	28 000	0	1 660	1 000		2 660	🔴	10%
	Nombre ha de CES/DRS,	ha	25 000	4 644	5 355	4 471		14 470	🟡	58%
	Nombre ha de fixation de dunes	ha	2 000	0	-	-		-	🔴	0%
	Nombre ha de RNA,	ha	5 000	0	-	-		-	🔴	0%
	Nombre de pépinières fonctionnelles,	nb	55	0	-	25		25	🟡	45%
	Nombre de plants plantés et conservés (et),	nb	33 000 000	381 342	1 221 851	-		1 603 193	🔴	5%
	Nombre de mares aménagées,	nb	5	0	-	-		-	🔴	0%
	Nombre de km de brise vent et de haies vives plantées et conservés (taux de reprise 95%) ;	km	500		-	-			🔴	0%
	Nombre de km de couloirs de passages/axes de transhumance et d'espaces pastoraux balisés	km	5 000	0	-	-		-	🔴	0%

IV. Mise en œuvre du Plan de communication et de visibilité

Le projet s'est doté d'un plan de communication visibilité qui a pour objectif général d'améliorer le partage de l'information parmi les acteurs, et faire la promotion des objectifs et visibilité des activités du projet. Par ailleurs, l'UGP-AT s'est attachée à assurer la visibilité de ses partenaires institutionnels ; les logos de l'AFD et de l'UE sont systématiquement apposés sur les documents du PPR et de ses partenaires (ANFICT, RECA/CRA, ...).

Les principales activités conduites sur la période du rapport sont listées ci-dessous :

- Appui à organisation de la foire des maraichers d'Agadez à Niamey

Le Projet Pôles ruraux PPR a accompagné l'organisation de la neuvième édition de la foire des maraîchers d'Agadez à Niamey du 10 janvier au 10 février à travers la mise en œuvre de plusieurs activités de visibilité et l'appui au comité d'organisation. Cet appui fait suite à la requête adressée par le comité d'organisation au PPR et vise à soutenir l'installation de 75 stands sur le site de la place Toumo, la communication et la confection des badges pour les exposants du site.

Pour la visibilité du projet à cette foire, les supports de communication ont été produits et utilisés. Des banderoles ont été affichées aux stands, les t-shirts et casquettes avec des messages du projet ont été portés par les exposants et les hôtes créant ainsi une grande visibilité du projet au niveau du site de la place TOUMO.



Photo : Un participant à la foire annuelle des maraîchers d'Agadez - Niamey (Edition 2020)

Aussi, des couvertures médiatiques (télé, radio et presse écrite) de l'appui du PPR à l'organisation de la foire ont été réalisées. Ce sont 2 télévisions (Télé Sahel et Bonfereye), deux radios (voix du Sahel et radio Anfani) et un Journal, le sahel qui ont couvert le lancement officiel de la foire à la place Toumo.

○ **Appui à organisation et participation au festival de l'Aïr**

Le Projet Pôles ruraux PPR a accompagné l'organisation l'édition 2020 du Festival de l'Aïr qui s'est tenu du 14 au 16 février 2020 à Ifrouane. Cet appui fait suite à la requête adressée par le ministre du Tourisme et le comité d'organisation du festival au PPR et vise à soutenir les prix agro sylvopastoraux décerné à ce festival. Le projet a mis à profit cet événement d'envergure nationale pour faire connaître le projet et assurer une forte visibilité aux activités du projet à travers l'utilisation de plusieurs supports de communication. Notamment des dépliants du PPR en couleur, des Kakémonos (avec des images du projet), des affiches, des Tee-shirt et casquettes avec un message et les logos du PPR, AFD et UE

○ **Participation à la 6e édition du Sahel**

Du 29 février au 04 mars 2020, le Projet Pôles ruraux a accompagné la tenue de la 6e édition du Salon de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de l'Environnement et de l'Elevage au palais du 29 juillet. L'objectif principal de cet accompagnement est d'apporter un appui au MAGEL/RECA pour l'organisation du SAHEL à travers le financement d'activités proposées, tout en assurant la communication et la visibilité du PPR à travers des actions en direction des Organisations de Producteurs et des médias. Des supports de communication ont été conçus et produits pour la visibilité du projet. Il s'agit des banderoles portant des inscriptions relatives à la participation du PPR au SAHEL 2020, des affiches, des Tee-shirts et casquettes avec le logo du PPR, AFD et UE, des dépliants du projet et plusieurs supports audiovisuels (montage vidéo, reportages, chant dédié au PPR, etc.).

Tous ces supports ont été placés au niveau du stand du projet, dans la grande salle d'exposition du SAHEL (Palais des Sports) et au niveau des stands des producteurs des régions d'Agadez et de Tahoua.

Il faut noter que quatre (4) OP, soient deux (2) par région ont été appuyées pour participer au SAHEL. Au total cet appui a concerné directement 20 exposants dont, quinze (10) d'Agadez et quinze (10) de Tahoua.

Un reportage sur l'accompagnement du PPR à ces OP a été réalisés. Le reportage a donné la parole aux OP bénéficiaires d'une part pour expliquer l'accompagnement qu'ils reçoivent des CRA et d'autre part les CRA pour expliquer la convention qui les lie au PPR.

- **Appui à l'organisation et Participation à la 2^e édition du Festival International du Mil**

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a organisé du 03 au 04 mars la deuxième édition du festival international du mil FESTIMIL. Le projet pôles ruraux a participé à l'organisation et aux festivités en tant que membre du comité national d'organisation et membre actif du sous-comité communication du festival. Aussi le logo du projet a été apposé sur tous les supports de communication réalisés pour le festival.

- **Création et animation de la page Facebook du projet**

La page Facebook du projet a été créée en mars 2020 et a servi de plateforme de publication des activités du projet. A cause de la situation sanitaire du pays qui a freiné les activités terrain, l'animation de la page s'est faite au rythme des activités.

Aujourd'hui la page Facebook compte 523 abonnés et 509 likes sur les publications du projet.

- **Préparation et Edition du 3^e et 4^e numéro de la newsletter PPR *INFO***

Dans le cadre de la préparation de l'édition du numéro 03 de la newsletter Pôles Ruraux Info, les différents rapports mensuels partagés par les équipes ont été parcourus pour cibler les activités ayant marqué le semestre. Ainsi après discussion avec les membres des équipes, il a été retenu un certain nombre d'activités qui ont fait l'objet d'articles à publier. Il s'agit de la réunion du COPIL pour la validation du PTBA2020, les activités CRS/DRS à Tahoua et Agadez, des reportages sur l'appui et la participation du projet aux événements nationaux, l'opérationnalisation du crédit à coût partagé des jeunes agriculteurs et l'appui des CRA aux jeunes agriculteurs.

Le 3^e numéro de la newsletter PPR Info a été publié en fin mai. Cinq cents exemplaires ont été édités et distribués aux partenaires, aux bénéficiaires et autres à Niamey et dans les deux régions d'interventions.

Le 4^e numéro de la newsletter PPR Info a été finalisé et publié en fin août. Cinq cents exemplaires ont aussi été édités et distribués aux partenaires, aux bénéficiaires ; aux bailleurs et bénéficiaires à Niamey et dans les deux régions d'interventions du projet. Ce Quatrième numéro présente les activités du projet du troisième trimestre c'est-à-dire de juin à août 2020.

- **Organisation des rencontres d'échanges et de Dialogue entre les acteurs de mise en œuvre du projet dans les régions de Tahoua et Agadez**

Dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2020 des rencontres d'échanges et de dialogue sont prévus dans le but d'améliorer les échanges et faciliter la circulation de l'information entre les acteurs de mise en œuvre du projet.

Sept rencontres ont été organisées dans le but d'améliorer les échanges et faciliter la circulation de l'information entre les acteurs de mise en œuvre du projet. Ces rencontres ont été organisées par

acteurs de mise en œuvre dont 3 rencontres dans la région d'Agadez, 3 dans la région de Tahoua et 1 rencontre à Dosso.

Pour la région d'Agadez, les rencontres se sont tenues le 6 et le 9 juin 20 à la maison des jeunes d'Agadez et les 8 juin 20 dans la salle de réunion de la mairie de Tchirozérine. Pour la région de Tahoua, les rencontres se sont tenues le 24 et le 25 juin 2020 dans la salle de réunion de la commune d'Illéla et le 26 juin dans la salle de réunion du PRODAF.

Au total ce sont 108 acteurs de mise en œuvre qui ont participé à ces six rencontres qui ont permis dans un premier temps de faire le diagnostic de la communication au sein des acteurs et de proposer des solutions d'amélioration.

Au total ce sont 108 acteurs de mise en œuvre qui ont participé aux six rencontres qui ont permis dans un premier temps de faire le diagnostic de la communication au sein des acteurs et de proposer des solutions d'amélioration.

Au cours de ces rencontres un questionnaire a été administré et renseigné par les participants. Ce questionnaire renseigné a été analysé et des propositions et recommandations ont été faites pour améliorer la communication au sein des acteurs de mise en œuvre du projet.

Suite à ces rencontres, le projet a organisé un atelier pour échanger sur les résultats de ces 6 rencontres organisées. Cette septième rencontre a donc regroupé les staffs du projet qui ont échangé sur la communication interne et externe du projet et surtout proposé un plan d'action aux vues des résultats des 6 rencontres avec les acteurs de mise en œuvre du projet.

Ainsi au sortir de cet atelier un plan d'action a été proposé par l'équipe PPR sur la base du résultat des rencontres organisées avec les différents acteurs de mise en œuvre du projet. Ce plan d'action a été mis en œuvre par les équipes au cours du dernier semestre et certaines actions continueront en 2021.



Photo : Vue des participants à l'atelier d'échange et de dialogues avec les Collectivité d'Agadez - Juin 2020)

Il ressort de ces rencontres que la communication, à travers notamment les échanges entre les acteurs et les actions de visibilité, constitue un aspect important pour l'atteinte des objectifs du projet.

Tous les acteurs participants ont apprécié l'organisation de ces rencontres qui ont été un cadre d'échanger et de propositions consensuelles d'amélioration. Cette approche du projet qui consiste à écouter les différents acteurs et les amener à proposer eux même les voies et moyens pour

améliorer la circulation de l'information a été unanimement salué par les participants à ces rencontres.

La participation des acteurs clés, la qualité des échanges et la formulation de propositions pertinentes constituent des signes solides de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes pour améliorer la communication dans la mise en œuvre des actions du projet.

○ **Appui et Participation du PPR à l'organisation de l'édition 2020 de la fête de l'arbre à Agadez**

Le projet a appuyé la direction régionale de l'environnement dans le cadre de la commémoration de la fête nationale de l'arbre édition 2020. Il s'agissait d'assurer la visibilité du Projet Pôles Ruraux à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Arbre, et surtout de faire connaître au public les activités réalisées par le PPR dans le domaine de l'Environnement et de la restauration/protection du potentiel de production.

De manière spécifique, le projet a assuré :

- La production et la diffusion de supports imprimés et audiovisuels de communication (4 banderoles, 200 dépliants, 250 T-Shirts, 250 casquettes, deux grandes plaques de visibilité du site et des grilles de protection des arbres.) sur le site officiel de plantation d'arbre
- Une visibilité du projet au cours de la nuit écologique avec des banderoles et un sketch sur les activités du projet
- L'accompagnement de la visite du ministre de l'environnement, du développement durable et de la salubrité publique sur les sites de récupération de terres dégradées financés par le projet dans le département de Tchiro et Arlit
- Réalisation un publi-reportage sur les réalisations du projet dans le cadre de cette fête et dans le cadre de la récupération et restauration des terres dans les communes de Tchirozerine et Danet.

○ **Production et diffusion des émissions sur le financement à coûts partagés des jeunes agriculteurs dans les régions de Tahoua et Agadez**

L'objectif de cette activité est de faire connaître le financement à coûts partagés de l'agriculture à travers la production des émissions radiophoniques à Agadez et à Tahoua en ce début de campagne sèche froide.

De manière spécifique, il s'agissait de produire et diffuser des émissions radiophoniques (table ronde, micro-programme) sur le financement à coûts partagés dans la zone d'intervention.

Au total 8 tables ronde et 6 micro-programmes ont été produits et diffusés sur 12 radios dont 5 dans la région d'Agades et 7 dans la région de Tahoua.

Au moins 300 diffusions du micro-programmes et 60 diffusions des tables rondes ont été réalisés sur les 12 radios concernées par cette activité.

Pour cette année 2021 le projet va consolider les échanges et le dialogues entre les différents acteurs de mise en œuvre du projet. En plus de l'organisation des événements auxquels le PPR contribue et participe un accent sera mis sur la communication sur les résultats du projet.

○ **Conception et Production des supports de communication et visibilité**

Afin de garantir une plus grande visibilité du projet, des supports de communication et visibilité du projet ont été conçus et produits au cours de l'année 2020 et à l'occasion des événements organisés par le projet et ceux auxquels le projet participe. Des plaques de visibilité ont été conçues et placées dans toutes les communes d'intervention du projet. Pour les supports de communication il s'agit des gilets, agendas ; blocs note ; des portes documents, des cartables ; casquettes ; T-shirts

Tous ces supports ont été produits et partagés avec les bénéficiaires du projet, les partenaires et autres acteurs de mise en œuvre du projet.


V. Résumé des contrôles et audit réalisés

Le Projet Pôles Ruraux est à sa deuxième mission d'audit externe. Il faut rappeler que le contrôle des comptes dédié au Cabinet I.A & C Niger concerne spécifiquement trois exercices comptables (2018, 2019 et 2020). La première période bouclée a couvert le premier semestre 2017 et l'exercice comptable 2018. La deuxième période a couvert l'exercice 2019. L'ordre de service de démarrage de l'audit de l'exercice 2019 a été envoyé à l'auditeur en mars, cependant, compte tenu du contexte COVID, la mission n'a pu démarrer qu'en juillet 2020. Au 31 décembre 2020, les réponses aux observations faites par l'auditeur sont en train d'être données. Le projet se prépare également à recevoir la mission d'audit UE en début 2021.


VI. Rapport financier de l'Action

Le niveau d'exécution du PTBA 2020 au 31 décembre 2020 est de 55%, pour un montant de 6 829 913 001 FCFA de réalisation.

- Situation d'exécution des PTBA

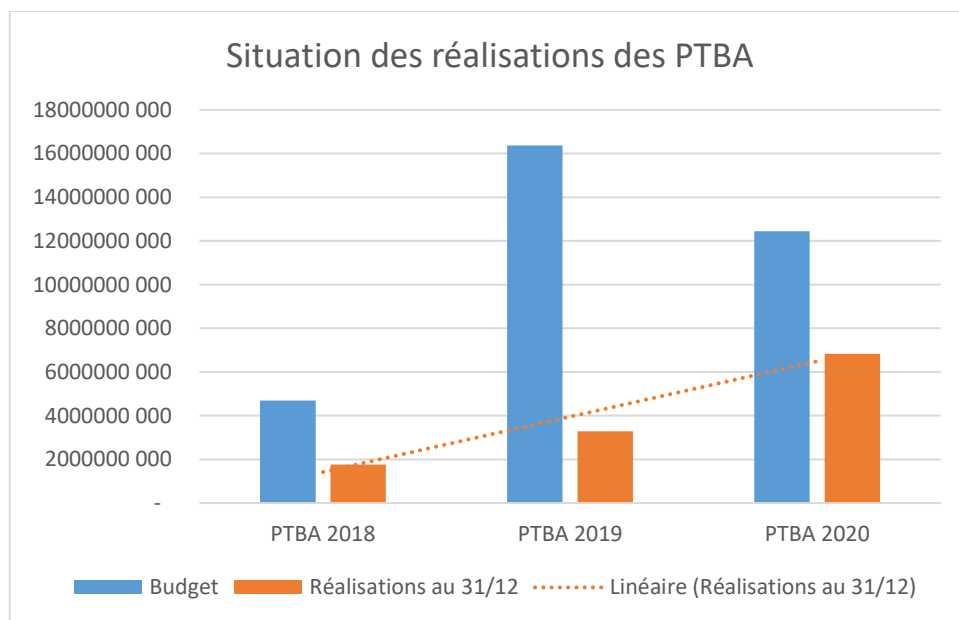

- Situation des réalisations par source de financement

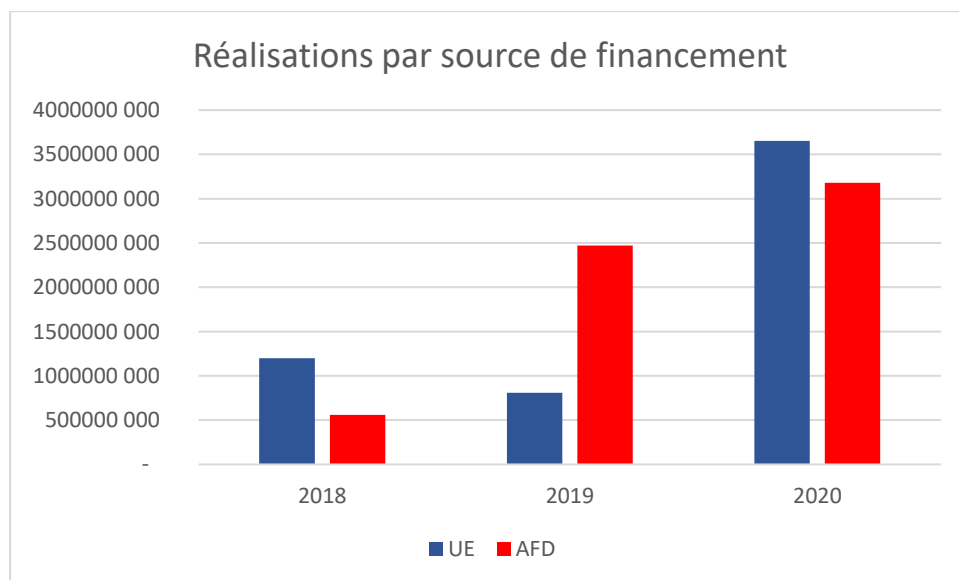

1.1. Situation des réalisations au 31/12/2020 en FCFA

			REALISATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020			SOLDE PTBA 2020	% DECAISEMENT GLOBAL
	COMPOSANTE	PTBA 2020. (F.CFA)	UE	AFD	TOTAL	TOTAL	TAUX
C1	Infrastructures publiques et appui aux CT	8 507 490 015	3 583 174 745	1 569 591 496	5 152 766 241	3 354 723 774	61%
R1	Protection des capacités productives	5 510 853 015	3 165 419 694	1 069 501 581	4 234 921 275	1 275 931 740	
R2	Appui à l'amélioration de la production	1 247 500 000	201 684 088	349 286 448	550 970 536	696 529 464	
R3	Appui à la collecte, transformation et vente des produits	922 200 000	99 263 842	139 122 682	238 386 524	683 813 476	
R4	Appui aux CT et à la MO	826 937 000	116 807 121	11 680 785	128 487 906	698 449 094	
C2	Accès aux services financiers	1 751 192 800	-	5 056 362	5 056 362	1 746 136 438	0%
R5	Accès aux financements des opérateurs privés	945 192 800		-	-	945 192 800	
R6	Sécurisation du financement agricole	604 000 000		-	-	604 000 000	
R7	Renforcement des capacités des institutions financières partenaires	202 000 000		5 056 362	5 056 362	196 943 638	
C3	Accès aux services non financiers	1 219 845 300	-	755 852 041	755 852 041	463 993 259	62%
R8	Appui aux directions régionales	599 276 000		312 131 531	312 131 531	287 144 469	
R9	Appui au RECA et aux CRA pour les OP	620 569 300		443 720 510	443 720 510	176 848 790	
C4	UGP	783 973 500	-	841 971 208	841 971 208	- 57 997 708	107%
	Pilotage au niveau central (UGP Nationale)	220 850 300		197 816 554	197 816 554		
	Pilotage au niveau régional (UGP Régionale)	37 360 700		55 194 209	55 194 209		
	Appuis en assistance technique au pilotage et à la mise en œuvre (opérateurs)	525 762 500		588 960 445	588 960 445		
Autres	Communication et Visibilité	127 000 000	68 767 149	-	68 767 149	58 232 851	54%
	Evaluation et Audit	10 500 000		5 500 000	5 500 000	5 000 000	52%
	Imprévus	39 357 420			-	39 357 420	0%
	TOTAL GENERAL	12 439 359 035	3 651 941 894	3 177 971 107	6 829 913 001	5 609 446 034	55%

1.2. Situation des réalisations au 31/12/2020 en Euros

			REALISATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2020			SOLDE PTBA 2020	% DECAISSEMENT GLOBAL
	COMPOSANTE	PTBA 2020. (F.CFA)	UE	AFD	TOTAL	TOTAL	TAUX
C1	Infrastructures publiques et appui aux CT	12 969 585	5 462 515	2 392 827	7 855 341	5 114 243	61%
R1	Protection des capacités productives	8 401 241	4 825 651	1 630 445	6 456 096	1 945 145	
R2	Appui à l'amélioration de la production	1 901 801	307 465	532 484	839 949	1 061 852	
R3	Appui à la collecte, transformation et vente des produits	1 405 885	151 327	212 091	363 418	1 042 467	
R4	Appui aux CT et à la MO	1 260 657	178 071	17 807	195 879	1 064 779	
C2	Accès aux services financiers	2 669 676	-	7 708	7 708	2 661 968	0%
R5	Accès aux financements des opérateurs privés	1 440 937		-	-	1 440 937	
R6	Sécurisation du financement agricole	920 792		-	-	920 792	
R7	Renforcement des capacités des institutions financières partenaires	307 947		7 708	7 708	300 239	
C3	Accès aux services non financiers	1 859 642	-	1 152 289	1 152 289	707 353	62%
R8	Appui aux directions régionales	913 590		475 841	475 841	437 749	
R9	Appui au RECA et aux CRA pour les OP	946 052		676 448	676 448	269 604	
C4	UGP	1 195 160		1 283 577	1 283 577	- 88 417	107%
	Pilotage au niveau central (UGP Nationale)	336 684		301 569	301 569		
	Pilotage au niveau régional (UGP Régionale)	56 956		84 143	84 143		
	Appuis en assistance technique au pilotage et à la mise en œuvre (opérateurs)	801 520		897 864	897 864		
Autres	Communication et Visibilité	193 610	104 835		104 835	88 775	54%
	Evaluation et Audit	16 007		8 385	8 385	7 622	52%
	Imprévus	60 000			-	60 000	0%
	TOTAL GENERAL	18 963 681	5 567 350	4 844 786	10 412 135	8 551 545	55%

1 EUR = 655,957 F CFA

1.3. Situation des réalisations par convention au 31/12/2020 en FCFA

REALISATION PAR CONVENTION (F CFA)						
SUBVENTION	Montant Total Projet (F. CFA)	2018	2019	2020	TOTAL	% Réalisations
CNE116804W	18 391 317 641	1 199 201 878	807 240 170	3 651 941 894	5 658 383 942	30,77%
CNE116801T	4 591 699 000	473 711 308	925 148 232	847 471 208	2 246 330 748	48,92%
CNE116802U	19 678 710 000	84 711 547	1 547 149 433	2 330 499 899	3 962 360 879	20,14%
TOTAL	42 661 726 641	1 757 624 733	3 279 537 835	6 829 913 001	11 867 075 569	27,82%

1.4. Situation des réalisations par convention au 31/12/2020 en Euros

REALISATION PAR CONVENTION (Euro)						
SUBVENTION	Montant Total Projet	2018	2019	2020	TOTAL	% Réalisations
CNE116804W	28 037 383	1 828 171	1 230 630	5 567 350	8 626 151	30,77%
CNE116801T	7 000 000	722 168	1 410 379	1 291 962	3 424 509	48,92%
CNE116802U	30 000 000	129 142	2 358 614	3 552 824	6 040 580	20,14%
TOTAL	65 037 383	2 679 482	4 999 623	10 412 135	18 091 240	27,82%

Annexe 1 – Plan d’engagement environnemental et social

Il est à noter qu’à ce jour l’UGP ne dispose d’aucune compétence en matière de suivi Environnemental et Social. Cela avait pourtant été une recommandation de l’Assistance Technique dès Avril 2018, qui n’a pas été suivie par le MAGEL, qui n’a pas souhaité recruter via l’UGP ce profil. Cette option s’avère en phase avec les recommandations du CGES de 2019 « Le recrutement d’un Responsable de la Gestion de la Procédure Environnementale et Sociale s’avère nécessaire pour assurer la fonction Environnement dans l’UGP », Tableau 23. Grille d’analyse des capacités en gestion environnementale et sociale des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PPR, p.135.

Thème	Actions requises	Ressources et responsabilités	Source de financement	Calendrier	Indicateurs
1. Evaluation environnementale et sociale complémentaire					
Evaluation environnementale et sociale complémentaire	Evaluation E&S complémentaire réalisée en juin 2020 Prise en compte des éléments E&S dans le dispositif de suivi-évaluation du projet	- Consultants E&S - MOA	Financement projet	Avant signature de la convention	- ANO de l’AFD sur l’évaluation E&S complémentaire - Validation par le COPIL (participation de l’AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
2. Dispositif de gestion E&S du projet					
Cadre de gestion Environnementale et Sociale	Cet outil de gestion E&S du projet a été élaboré en Aout 2019 et un atelier de validation réalisé en janvier 2020. Les rapports (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale – CGES, Cadre de Politique de Réinstallation des Populations -CPRP, Gestion des Pestes et Pesticides - GPP) ont été validés par le Bureau National d’Evaluation Environnementale.	MOA	Financement projet	Démarrage projet	ANO de l’AFD obtenu Atelier de validation
Exigences E&S dans les DAO et contrats des entreprises et sous-traitants	Les exigences de gestion E&S du CGES et autres mesures du dispositif global de gestion E&S du projet sont retranscrites dans les DAO et contrats des entreprises et sous-traitants impliqués dans le projet	MOA	Financement projet	Tout au long de la mise en œuvre	ANO de l’AFD sur mes DAO et les contrats des entreprises et sous-traitants
Renforcement des capacités de la Maîtrise d’Ouvrage en matière de gestion E&S	Le renforcement des capacités de la maîtrise d’ouvrage et des partenaires impliqué est prévu dans le cadre de la convention entre PPR et	MOA	Financement projet	Tout au long de la mise en œuvre	Validation par le COPIL (participation de l’AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet

	Services de l'environnement / Bureau National d'Evaluation Environnementale				
Dispositif d'ingénierie sociale	Les populations locales sont impliquées dans la mise en œuvre du projet, notamment au travers de la composante 1, appui à l'élaboration des Plans d'Investissements Annuels des communes pour les 26 communes d'interventions + réalisation de PCD dans certaines communes En outre des TdR pour une mission expertise court terme de l'AT sont élaborés	MOA	Financement projet	Chemin faisant (PM : Mission AT CT prévue au second semestre 2020)	Validation par le COPIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
Mécanismes de compensation des personnes affectées par le projet	Un mécanisme a été conçu dans le cadre de l'évaluation E&S complémentaire A ce jour aucune activité du projet n'a affecté des personnes (pertes de terres, de bâtis, ...)	MOA	Financement projet		Validation par le COPIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
Approche Pro-femmes et pro-jeunes	Les femmes et les jeunes sont des cibles particulières dans le cadre des travaux CES-DRS (composante 1) et formation et installation (composante 3) Des indicateurs H/F sont prévus dans le cadre logique	• MOA • Collectivités • CRA	Financement projet	Chemin faisant	Validation par le COPIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
3. Dispositif de suivi E&S du projet					
Suivi E&S et reporting E&S	La convention (entre PPR et Services de l'environnement / Bureau National d'Evaluation Environnementale, conformément aux recommandations du CGES) pour assurer le suivi E&S du projet est en cours de finalisation	• Conseil Communal (CC)+ Services Techniques Décentralisés (GR, Agriculture...) • MOA • Ministère de l'Environnement	Financement projet	Opérationnalisation deuxième semestre 2020	ANO AFD sur convention PPR / BNEE (à venir)

Annexe 2 – Rapports des partenaires

Rapport annuel 2020 ANFICT



Rapport PPR
ANNUEL 2020 Tahou



Rapport PPR
ANNUEL 2020 Tahou

Rapport Annuel 2020 RECA, CRA Tahoua et Agadez



rapport annuel 2020
RECA.docx



Rapport annuel
CGEF_2020_CRA_AZ-



Rapport annuel
2020 CRA Ta.docx

Annexe 3 – Quelques images des réalisations du projet en 2020



Site : Pépinière de la CU Agadez – 2020



Site : Bande Pare feu dans la commune d'Agadez -2020



Site de récupération des terres dans la région d'Agadez -2020



Site de construction du seuil Commune Allakay- 2021



Rencontre PPR/CRA et les jeunes du site de formation de Illéla



Jeune de Toudou Bila bénéficiaire d'un financement à couts partagé



Magasin 200 T dans la commune de Kao en chantier



Site de récupération des terres de Guidan Karo Illela 2020



Production d'émissions sur le financement à couts partagés es jeunes à Tahoua



Site de formation des jeunes de Tabalaliya 2020



Mise en place des cages de protection des arbres par le PPR -Fête de l'arbre édition 2020 à Agadez
