



REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l'Agriculture



PROJET PÔLES RURAUX - TAHOUA—AGADEZ

**Projet d'Appui au Développement d'Activités Rurales et au  
Financement des Filières Agricoles  
dans les régions de Tahoua et Agadez  
-Projet Pôles Ruraux –PPR-**

**Rapport Annuel**



Seuil construit par le PPR à Kirari – Commune de Kieta – Décembre 2021

- *Période couverte : Du 01/01/2021 au 31/12/2021-*

- *Janvier 2022 -*

## Table des matières

I.	Résumé et contexte de l'Action pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 .....	5
II.	Résumé des activités de l'Action et autres mesures mises en œuvre durant la période de janvier à décembre 2021 .....	7
2.1.	<b>Résultat 1</b>	<b>8</b>
2.2.	<b>Résultat 2</b>	<b>16</b>
2.3.	<b>Résultat 3</b>	<b>24</b>
2.4.	<b>Résultat 4</b>	<b>29</b>
2.5.	<b>Résultat 5.</b>	<b>34</b>
2.6.	<b>Résultat 6.</b>	<b>38</b>
2.7.	<b>Résultat 7.</b>	<b>39</b>
2.8.	<b>Résultat 8.</b>	<b>41</b>
2.9.	<b>Résultat 9</b>	<b>42</b>
2.10	<b>Appui au pilotage et à la gestion du projet</b>	<b>49</b>
2.11	<b>Difficultés rencontrées et mesures prises pour les surmonter</b>	<b>51</b>
2.12	<b>Modifications introduites en cours de mise en œuvre</b>	<b>51</b>
III.	Bilan des principaux résultats de l'Action (à l'aide des indicateurs compris dans la convention) au cours de la période rapportée.....	52
3.1	<b>Etat de mise en œuvre du PTBA 2021</b>	<b>52</b>
3.2	<b>Etat d'avancement du PPR 2018-2021</b>	<b>54</b>
IV.	Mise en œuvre du Plan de communication et de visibilité .....	57
V.	Résumé des contrôles et audit réalisés.....	59
VI.	Rapport financier de l'Action.....	60

## ANNEXES

Annexe 1 – Plan d'engagement environnemental et social

Annexe 2 – Cartes de localisation des seuils et digues

## Liste des abréviations et sigles

ABN	Autorité du Bassin du Niger
AFD	Agence Française de Développement
AGR	Activités Génératrices de Revenus
ANFICT	Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales
AO	Appel d'Offre
BEEEI	Bureau d'Etude d'Evaluation Environnementale et
BV	Bassin Versant
CES/DRS	Conservation des Eaux et Sols/ Défense et Restauration des Sols
COFOB	Commission Foncière de Base
COFOCOM	Commission Foncière Communale
COFODEP	Commission Foncière Départementale
COFOR	Commission Foncière Régionale
CRA	Chambre Régionale d'Agriculture
CT	Collectivité Territoriale
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DDA	Direction Départementale de l'Agriculture
DDE	Direction Départementale de l'Environnement
DDGR	Direction Départementale du Génie Rural
DEP	Direction des Études et Programmes
DRA	Direction Régionale de l'Agriculture
DRGR	Direction Régionale du Génie Rural
DRE/SU/DD	Direction Régionale de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
FAO	<i>Food Agriculture Organisation</i>
FICOD	Fonds d'Investissement des Collectivités Territoriales
FIDA	Fonds International de Développement Agricole
FISAN	Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
GAR	Gestion Axée sur les Résultats
GIZ	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
HCI3N	Haut-Commissariat à l'initiative « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 3N
HIMO	Haute Intensité de Main d'Œuvre
IF	Institution Financière
IFS	Institution Financière Spécialisée
IMF	Institution de Micro Finance
INS	Institut National des Statistiques du Niger
IRAM	Institut de Recherche d'Application des Méthodes de Développement
KfW	<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>
MAG	Ministère de l'Agriculture
MO	Main d'œuvre
MPER	Micro et Petite Entreprise Rurale
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OP	Organisations Paysannes
OPA	Organisation Professionnelle Agricole
OS	Objectif Spécifique
PAC	Programme d'Actions Communautaires
PASADEM	Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et au développement dans la région de Maradi
PASEL	Programme d'Appui au Secteur de l'Elevage
PDC	Plan de Développement Communal
PDES	Plan de Développement Economique et Social
PIA	Plan d'Investissement Annuel
PICCT	Programme d'Investissement et de Capacitation des CT en déc. et bonne gouvernance
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PMERSA	Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire
PO	Planification Opérationnelle

PRODEX	Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux
PROMOVARE	Projet de Mobilisation et de Valorisation des Ressources en Eau
PPI	Projet de petite irrigation (Ruwanmu)
ProDAF	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale, régions Maradi, Tahoua, Zinder
PromAP	Projet de Promotion de l'Agriculture Productive
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
RECA	Réseau National des Chambres Régionales d'Agriculture
SAF	Schéma d'Aménagement Foncier
SAHFI	La Sahélienne de Financement
SFD	Système Financier Décentralisé
S/E	Suivi Evaluation
SIMA	Système d'Information sur les Marchés Agricoles
SNV	Organisation Néerlandaise de développement
SPR/CR	Secrétariat Permanent Régional du Code Rural
STD	Services Techniques Déconcentrés de l'Etat
TA	Tahoua
TDR	Termes de Références
UA	Union Africaine
UE	Union Européenne
UGP	Unité de Gestion du Projet
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

## **I. Résumé et contexte de l'Action pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

### **1. Descriptif de l'Action**

Le Projet Pôles Ruraux est né de la volonté du Gouvernement du Niger et de ses partenaires Financiers, l'Agence Française de Développement et l'Union Européenne de promouvoir le développement des filières porteuses des régions de Tahoua et Agadez et de prévenir la situation de précarité alimentaire. Sa mise en œuvre effective a débuté en 2018 (signature du contrat d'AT MO fin décembre 2017, nomination et prise de fonction du coordonnateur national à fin mars 2018).

En dépit de la place qu'occupe l'agriculture dans l'économie du Niger, l'insécurité alimentaire chronique affecte le pays et entame les moyens d'existence des populations nigériennes. Chaque année, entre 15 à 20% de la population (2 à 3 millions de personnes) se trouve en insécurité alimentaire, et ce, même en année de production agricole excédentaire. A cela s'ajoutent les problèmes liés aux conflits armés dans la sous-région et les inondations des habitations en période hivernale qui occasionnent d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

C'est dans ce contexte que l'Initiative 3 N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) est pensée et mise en œuvre. Faire en sorte que les *Nigériens Nourrissent les Nigériens*, par leurs propres efforts de production et d'organisation, implique que des solutions appropriées soient trouvées pour réduire la fréquence des déficits agricoles, fourragers et d'améliorer la qualité nutritionnelle des repas des ménages à travers un approvisionnement régulier des marchés et l'accessibilité des biens à toutes les catégories sociales du pays. En plus, il y a eu la création, sous l'égide du Haut-Commissariat à l'I3N, du Fonds pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) avec ses trois (3) facilités :

- Facilité 1 : Soutien au financement Agricole ;
- Facilité 2 : Financement des Investissements structurants Agricoles ;
- Facilité 3 : Financement du conseil Agricole, de la recherche Agricole et du renforcement de capacités.

Le PPR se veut un outil de mise en œuvre de l'I3N à travers ses trois objectifs qui sont :

- Renforcer les infrastructures et les aménagements nécessaires au développement durable des productions agricoles et à leur mise en marché à travers les investissements des collectivités territoriales aux niveaux régional et communal ;
- Faciliter l'accès aux institutions financières pour les acteurs des filières agricoles ;
- Améliorer les services à l'agriculture dans la perspective de développer une agriculture moderne, durable et performante sur les marchés.

Pour atteindre ces objectifs, les quatre composantes ci-dessous sont définies :

- C1 : Financement d'investissements collectifs à caractère public en faveur des filières agricoles et appui technique aux communes qui comporte quatre résultats. Cette composante s'exécute dans 18 communes dans la région de Tahoua, 8 communes de la région d'Agadez et les deux régions ; soit 28 Collectivités Territoriales ;
- C2 : amélioration de l'accès au crédit agricole qui est composée de trois résultats. Elle s'exécute sur tout le territoire des deux régions ;
- C3 : Amélioration des services non financiers en faveur des acteurs des filières agricoles qui est composée de deux résultats. Elle s'exécute sur tout le territoire des deux régions ;
- C4 : Appui au pilotage et à la gestion du projet.

Chacun des résultats sera développé dans le rapport.

Dans le cadre des conventions de financement signées le 14 mars 2017, deux rapports semestriels sont dus, le second est, de fait, un rapport annuel. Le présent document constitue le **rapport annuel 2021 (janvier au 31 décembre 2021) et rend compte des activités conduites durant la période.**

## **2. Eléments de contexte sur la période Janvier/décembre 2021**

L'évènement majeur qui a marqué l'année 2021 est l'installation des nouvelles autorités élues au niveau national (Président de la république, députés nationaux) et au niveau local (conseillers régionaux et communaux) consacrant ainsi la première alternance démocratique dans le pays. Il est à noter qu'à Tahoua, pour l'ensemble des dix-huit (18) communes de la composante 1 du projet Pôles Ruraux, 89,05% des élus locaux sont des nouveaux représentants des communautés à la base et pour Agadez ce taux est de 71,17% pour l'ensemble des huit (8) communes.

### **Contexte sécuritaire**

Sur le plan sécuritaire, le Niger est dans une position géographique qui l'expose à des périls certains et permanents d'insécurité, par Boko haram au sud, Mujao à l'ouest, Etat Islamique au nord sans compter d'autres pays non frontaliers et pouvant influencer la sécurité de la sous-région à laquelle le Niger ne pourrait être insensible. Sur le plan interne, il importe de souligner la fréquence des incursions des groupes armés terroristes GAT (occasionnant des morts civils, des déplacés internes et des réfugiés) surtout dans la région de Tillabéri qui touche la région de Tahoua. De manière générale, la région de Tahoua est au carrefour de quatre pays au niveau desquels la situation sécuritaire se détériore.

Le contexte sécuritaire au premier semestre 2021<sup>1</sup> a été relativement calme dans les départements de Ouallam, Ayorou et Filingué. En revanche, il est resté instable et imprévisible dans les départements de Banibangou, Tillabéri et Abala où des incursions récurrentes des groupes armés non étatiques (GANE) ont été régulièrement signalées. Cette situation compromet sérieusement la libre circulation des personnes et des biens et constitue un véritable frein aux opportunités économiques dans la zone nord et nord-ouest des départements d'Abala, Tillabéri et Banibangou. En effet, les prélèvements forcés de la zakat, les incendies des greniers de céréales et le vol des bétails à grande échelle ont mis à terre l'économie de la zone, laissant ainsi les communautés dans la psychose et la peur des lendemains incertains, sans oublier l'insécurité alimentaire inévitable.

Dans la région de Tahoua, le contexte sécuritaire et de protection a été caractérisé par une accalmie relative dans les départements de Tassara et Bagaroua. Cependant dans la partie nord et nord-ouest des départements de Tillia et Tahoua (communes rurales de Takanamatt et de Tébaram), plusieurs incursions des GANE suivies de violations des droits des personnes ont été signalées.

Cette situation impose au Niger d'adopter une posture de vigilance au quotidien et le renouvellement des mesures de l'état d'urgence dans certaines régions ; avec des éventuelles restrictions de déplacement dans certaines communes si nécessaire tout en renforçant fortement et sans cesse le dispositif sécuritaire.

Sur le plan régional et international, le Niger est également très déterminé à lutter contre le terrorisme aux côtés des autres pays de la sous-région. Dans ce cadre, plusieurs organisations sécuritaires sont opérationnelles sur le terrain parmi lesquelles la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S).

**Contexte sanitaire** toujours marqué par la pandémie de la covid19.

**Au niveau opérationnel**, le projet a été placé sur incidence opérationnel en début d'année à la suite de l'avis défavorable formulé dans le rapport provisoire de l'audit 2019 commandité par le Ministre de l'Agriculture. Cette situation s'est soldée par la décision de l'AFD de suspendre les versements par avance renouvelable, le départ du RAF (à la demande du MAG) du projet en début janvier 2021 et le lancement du processus de remplacement. Le nouveau RAF a pris service le 15 mars 2021. Il est à noter qu'au niveau de l'Assistance technique, le remplacement de l'AT GAF le 15 février 2021, le non-renouvellement du contrat de l'AT FINR arrivée à terme octobre 21 et déclenchement du processus de son remplacement. Le projet a également reçu une mission d'audit de l'UE en début janvier 2021.

---

<sup>1</sup> Source : <https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-tahoua-tillab-ri-avril-2021>

Le PTBA 2021 a été préparé et validé par le 4<sup>ème</sup> COPIL tenu le 26 mars 2021. A l'issue de cette session du , le Comité National de Pilotage du Projet Pôles Ruraux (PPR) a recommandé d'accorder la maîtrise d'ouvrage (responsabiliser) à l'UGP/AT dans la mise en œuvre des activités du projet en particulier sur les infrastructures structurantes. L'ANO sur le PTBA 2021 a été obtenu en avril 2021.

Le projet s'est attelé durant le 1<sup>er</sup> semestre à apporter les éléments de réponse aux auditeurs (UE et MAG) afin notamment de lever les conditions suspensives pour le versement des fonds sur les comptes du projet.

Ainsi le rapport final d'audit 2019 du MAG a été reçu le 31 mai 2021 avec une levée de l'opinion défavorable de l'auditeur. Dans la foulée, le projet a lancé l'audit 2020 le 31 mai 2021 et le MAG a adressé le 04 juin 2021 une correspondance à l'AFD demandant la reprise des versements sur les comptes du projet afin de résorber la tension de trésorerie et poursuivre la mise en œuvre du PTBA 2021. Le projet de rapport provisoire de l'audit 2020 a été reçu le 30 juin 2021 et le projet s'est attelé à finaliser et envoyer les DRF sur les trois conventions.

Malgré les contraintes citées plus haut, il convient de relever que dans la région de Tahoua 35 seuils ont été construits (dont 25 ont fait l'objet de réception) et 10 en cours de construction. Pour Agadez, les travaux de construction de 12 seuils d'infiltration et de 19 digues sont en cours.

L'Agence Française de Développement et la Délégation de l'Union ont réalisé du 29 novembre au 04 décembre 2021 une mission consacrée à la supervision des activités du Projet Pôles Ruraux.

Au 31 décembre 2021, le taux d'exécution financier du PTBA 2021 est de 79 %.

Afin d'atteindre les objectifs assignés au PPR qui arrive à terme en décembre 2021, des avenants aux conventions ont été proposés pour une prolongation du délai de mise en œuvre du projet pour une durée de 18 mois.

## **II. Résumé des activités de l'Action et autres mesures mises en œuvre durant la période de janvier à décembre 2021**

Cette partie, présente résultat par résultat la situation des activités réalisées dans le cadre du PTBA 2021.

La composante 1 consiste notamment à financer des infrastructures sous maîtrise d'ouvrage communale, afin de participer au développement économique durable des régions d'Agadez et de Tahoua.

## 2.1. Résultat 1

« Des aménagements combinés permettent de préserver le potentiel productif des eaux et des terres afin de valoriser ensuite des productions des filières porteuses »

### ■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle - | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires/ Perspectives
	*	**	***	****	*****		
1101- Récupération de terres dégradées (Tahoua-Agadez)					*****	1 982 ha récupérés / 1977 ha prévus	<u>Tahoua</u> : 706 ha récupérés / 706 ha prévus  <u>Agadez</u> : 1276 récupérés / 1271 ha prévus (771 ha récupérés finalisés au titre du PTBA 2020 et 505 ha réalisés/500 ha prévus titre du PTBA 2021)
1103- Réalisation de bandes pare feux (Tahoua-Agadez)					*****	10 586,51 kml réalisés / 9572 kml prévus	<u>Tahoua</u> : 7 014 kml réalisés / sur 6 000 kml prévus  <u>Agadez</u> : 3 572,51 kml réalisés (372,51 kml finalisés au titre du PTBA 2020 et 3200 kml réalisés/ 3200 kml prévus titre du PTBA 2021)
1104- Accompagnement des pépinières (Agadez)		**				Une mission conjointe d'évaluation des pépinières réalisée	
1105- Agroforesteries et RNA (Tahoua)				****		3202,7ha réalisés/5000 ha prévus  895 producteurs ayant adoptés la RNA ont été formés	Les activités de RNA ont concerné quatre communes ( Ilélla, Tajaé, Tamaské, Allakaye et Bagaroua).
1106- Fixation des dunes (Tahoua)					*****	500 ha traités / 250 ha prévus	
1107-Traitement biologique des berges (Tahoua)					*****	40 kml réalisés/40 kml prévus	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires/ Perspectives
	*	**	***	****	*****		
1108- Aménagement des mares (Tahoua)		**				Sélection du prestataire terminée	Signature contrat Démarrage de l'étude
1109- Réalisation des haies vives (Tahoua)					*****	800 kml réalisés /500 kml prévus	
1110 - Balisage des couloirs de passage/axes transhumance et espaces pastoraux		**				Sélection des prestataires terminée	Signature contrat Démarrage

### ■ Détails par activité

#### ■ 1101- Récupération de terres dégradées (Tahoua-Agadez)

La superficie totale de terres dégradées à récupérer programmée dans le PTBA 2021 s'élève pour les deux régions à 1206 ha. Il est à noter que pour Agadez, 771 ha ont été finalisés au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 au titre de la programmation 2020. Ainsi, à fin décembre 2021, un total de 1 982 ha récupérés sur 1977 ha prévus.

#### - Agadez :

Pour l'année 2021, 505 ha de terres dégradées ont été traitées à travers les travaux de confection et de mise en valeur (apport de fumure, semis direct et ensemencement) de demi-lunes. Il est à noter que pour Agadez, 771 ha ont été finalisés au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 au titre de la programmation 2020.

**Tableau 1 :** Situation des travaux CES/DRS finalisés dans la région d'Agadez au titre du PTBA 2020

Département	Communes	Sup. totale réal. (ha)
Arlit	Dannat	153,98
	Gougaram	92,95
<b>Total Arlit</b>		<b>246,93</b>
Iférouane	Iférouane	84,92
	Timia	100,00
<b>Total Iférouane</b>		<b>184,93</b>
Tchirozérine	Agadez	104,89
	Dabaga	104,29
	Tabelot	40,07
	Tchirozérine	89,90
<b>Total Tchirozérine</b>		<b>339,16</b>
<b>Total général</b>		<b>771,02</b>

Source : UGP R Agadez

**Tableau 2 :** Synthèse de de la main d'œuvre mobilisée au titre des travaux CES/DRS dans la région d'Agadez pour le PTBA 2020

Département	Communes	Nbre Hommes	Nbre Femmes	Nbre Total de pers	Nbre jrs trvx	Nombre de H/J H	Nombre de H/J F	Nombre total H/J
Arlit	Dannat	599	5	604	18	10 483	88	10 570
	Gougaram	373	1	374	16	6 528	18	6 545
<b>Total Arlit</b>		<b>972</b>	<b>6</b>	<b>978</b>	<b>16</b>	<b>17 010</b>	<b>105</b>	<b>17 115</b>
Iférouane	Iférouane	542	93	635	14	9 485	1 628	11 113
	Timia	587	0	587	13	10 273	0	10 273
<b>Total Iférouane</b>		<b>1 129</b>	<b>93</b>	<b>1 222</b>	<b>14</b>	<b>19 758</b>	<b>1 628</b>	<b>21 385</b>
Tchirozérine	Agadez	498	213	711	13	8 715	3 728	12 443
	Dabaga	489	128	617	14	8 558	2 240	10 798
	Tabelot	106	0	106	11	1 855	0	1 855
	Tchirozérine	764	136	900	16	13 370	2 380	15 750
<b>Total Tchirozérine</b>		<b>1 857</b>	<b>477</b>	<b>2 334</b>	<b>14</b>	<b>32 498</b>	<b>8 348</b>	<b>40 845</b>
<b>Total général</b>		<b>3 958</b>	<b>576</b>	<b>4 534</b>	<b>15</b>	<b>69 265</b>	<b>10 080</b>	<b>79 345</b>

Source : UGP R Agadez

**Tableau 3** : Situation des travaux CES/DRS réalisés dans la région d'Agadez au titre du PTBA 2021

Département	Communes	Superficie (ha)		Bénéficiaires (Nbre)		Nbre Total de pers	Nbre de jour de travail	Hommes/Jour		
		Prévue	Réalisée	H	F			H	F	Total
		Arlit	Dannat	50	50	376	-	376	21	7896
	Gougaram	75	75	229	-	229	27	6183	0	6183
<b>Total Arlit</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>605</b>	<b>-</b>	<b>605</b>	<b>48</b>	<b>14 079</b>	<b>-</b>	<b>14 079</b>
Iférouane	Iférouane	75	75	404	67	471	10	4040	670	4710
	Timia	50	50	245	20	265	10	2450	200	2650
<b>Total Iférouane</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>649</b>	<b>87</b>	<b>736</b>	<b>20</b>	<b>6 490</b>	<b>870</b>	<b>7 360</b>
Tchirozérine	Agadez	75	75	267	64	331	15	4005	960	4965
	Dabaga	50	50	280	174	454	21	5880	3654	9534
	Tabelot	50	55	247	89	336	67	16549	5963	22512
	Tchirozérine	75	75	188	121	309	21	3948	2541	6489
<b>Total Tchirozérine</b>		<b>250</b>	<b>255</b>	<b>982</b>	<b>448</b>	<b>1 430</b>	<b>124</b>	<b>30 382</b>	<b>13 118</b>	<b>43 500</b>
<b>Total général</b>		<b>500</b>	<b>505</b>	<b>2 236</b>	<b>535</b>	<b>2 771</b>	<b>192</b>	<b>50 951</b>	<b>13 988</b>	<b>64 939</b>

Source : UGP R Agadez

- **Tahoua :**

La superficie totale de terres dégradées à récupérer programmée dans le PTBA 2021 s'élève pour la Région de Tahoua à 706 ha. Ainsi, à la fin de décembre 2021, 100% ont été réalisés.

Concernant la plantation, un objectif global de 1 240 978 plants est prévu cette année. 1 167 335 plants ont été produits par 38 groupements totalisant 682 membres. Il est à noter que 220 978 plants produits ont été plantés au niveau de 706 ha traités.

**Tableau 4:** Superficies traitées par commune dans la région de Tahoua

COMMUNES	SITES	PREVISIONS			REALISATIONS		
		Superficie (ha)	Type d'ouvrage	Nbre d'ouvrage	Superficie (ha)	Type d'ouvrage	Nbre d'ouvrage
Tamaské	Bourdi	76	DLA	23788	77,48	DLA	24251,24
	Darey	70	DLA	21910	68,52	DLA	21446,76
<b>Total Tamaské</b>		<b>146</b>		<b>45698</b>	146		<b>45698</b>
Allakaye	Sabonguida	50	DLA	15650	50	DLA	15650
	Kaché	50	DLA	15650	50	DLA	15650
	Kétsara	40	DLA	12520	40	DLA	12520
<b>Total Allakaye</b>		<b>140</b>		<b>43820</b>	<b>140</b>		<b>43820</b>
CR/Badaguichiri	Katossarawa	140	DLA	43 820	140	DLA	43 820
CU/Illela	Nadara	140	Murets	56 000	140	Murets	56 000
CR/Tajaé	Sabara	80	DLA,CP	25 040	80	DLA,CP	25 040
	Iskita	60	DLA	18 780	60	DLA	18 780
<b>Total Illéla Dép</b>		<b>420</b>	<b>DLA+Murets</b>		<b>420</b>	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>706</b>			<b>706</b>		<b>87 640</b>

Source : Direction Régionale de l'Environnement de Tahoua (H/J : homme jour ; DLA : demi-lune agricole ; CP : cordon pierreux)

**Tableau 5 :** Situation de la main d'œuvre pour les Travaux CES-DRS PPR 2021 dans la Région de Tahoua

Communes	Nbre	Nbre	Nbre	Nbre jrs	Nombre de H/J	Nombre de H/J F	Nombre total H/J
	Hommes	Femmes	Total de pers	travaux	H		
<b>TAJAE</b>	1041	141	1182	32	33 312	4 512	37 824
<b>ILLELA</b>	426	463	889	18	7 668	8 334	16 002
<b>BADAGUICHIRI</b>	132	584	716	41	5 412	23 944	29 356
<b>ALLAKAYE</b>	305	295	600	24	7320	7080	14400
<b>TAMASKE</b>	208	353	561	42	1 402	5 606	7 008
<b>TOTAL</b>	<b>2112</b>	<b>1836</b>	<b>3948</b>	<b>157</b>	<b>55 114</b>	<b>49 476</b>	<b>104 590</b>

Source : DRE/LCD Tahoua

**Tableau 6 :** Situation production des plants forestiers 2021

Département	Commune	Nbre grpmt	Nbre de personnes employées				
			Plants prévus	plants plantés	Mbre	H	F
<b>Bagaroua</b>	Bagaroua	3	10000	9995	6	6	0

Département	Commune	Nbre grpmt			Nbre de personnes employées		
			<i>Plants prévus</i>	<i>plants plantés</i>	<i>Mbre</i>	<i>H</i>	<i>F</i>
Tchinta	Kao	2	80000	70943	28	0	28
Ilélla	Tajaé	3	113820	113820	90	60	30
	Badaguichiri	3	148820	114820	45	22	23
	Ilélla	2	186368	186368	307	150	157
Bouza	Alakaye	3	88820	88820	100	2	98
	Déoulé	1	5000	5000	28	0	28
Keita	Garahanga	3	75767	73900	5	5	0
	Ibohamane	2	70928	69544	6	6	0
	Keita	1	88117	87000	12	0	12
	Tamaské	1	203959	175900	40	0	40
Tahoua Département	Bambeye	3	36240	36240	10	6	4
	Barmou	1	1000	1000	10	8	2
	Kalfou	2	13000	13000	11	10	1
	Tébaram	3	19915	19915	9	4	5
	Takanamatt	3	36070	36070	10	8	2
Ville Tahoua	AC1	1	5000	5000	3	3	0
	AC2	1	60000	60000	12	9	3
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>1242824</b>	<b>1167335</b>	<b>1381</b>	<b>276</b>	<b>1 105</b>

Source : DRE/LCD Tahoua

### ■ 1103- Réalisation des bandes pare-feu (Agadez-Tahoua)

La superficie totale à traiter pour l'année 2021 programmée dans le PTBA 2021 s'élève pour les deux régions à 9200 kml. A fin décembre 2021, un total de 10 586,51 kml réalisés / 9572 kml prévus.

#### - Agadez :

Pour ce qui est des bandes pare-feu dans la région d'Agadez, 3 572,51 kml ont été réalisés dont 372,51 kml finalisés au titre du PTBA 2020 et 3200 kml réalisés/ 3200 kml prévus en 2021.

**Tableau 7 :** Situation des travaux bandes pare-feu finalisés dans la région d'Agadez au titre du PTBA 2020

Département	Communes	Qté prévues (Kml)	Somme de Long. totale réal. (Kml)	Taux
Arlit	Dannet	50	52,912	106%
	Gougaram	270	269,6	100%
<b>Total Arlit</b>		<b>320</b>	<b>322,512</b>	<b>101%</b>
Iférouane	Iférouane	50	50	100%
<b>Total Iférouane</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
<b>Total général</b>		<b>370</b>	<b>372,512</b>	<b>101%</b>

Source : DRE/LCD

**Tableau 8 :** Synthèse de de la main d'œuvre mobilisée au titre des travaux bandes pare-feu dans la région d'Agadez pour le PTBA 2020

Département	Communes	Qté réal. (kml)	Nombre de travailleurs			Total Nbre jrs de trvx	Nombre de H/J		
			Femmes	Hommes	Total		Hommes	Femmes	Total
Arlit	Dannet	52,912	0	144	144	2	288	0	288
	Gougaram	269,6	0	487	400	35	4451	0	4451
<b>Total Arlit</b>		<b>322,512</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>544</b>	<b>37</b>	<b>4739</b>	<b>0</b>	<b>4739</b>
Iférouane	Iférouane	50	16	60	76	11	660	176	836
<b>Total Iférouane</b>		<b>50</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>660</b>	<b>176</b>	<b>836</b>
<b>Total général</b>		<b>372,512</b>	<b>16</b>	<b>691</b>	<b>620</b>	<b>48</b>	<b>5399</b>	<b>176</b>	<b>5575</b>

Source : DRE/LCD

**Tableau 9 :** Situation des travaux bandes pare-feu réalisés dans la région d'Agadez au titre du PTBA 2021

Département	Communes	Nbr des sites	Prévision	Qté réal. (kml)	Nombre de travailleurs			Total Nbre jrs de trvx	Nombre de H/J		
					F	H	Total		H	F	Total
Tchirozerine	Tchirozerine	10	880	880	318	1069	1387	24	25656	7632	33288
	Agadez	2	200	200	0	86	86	18	1548	133128	2396304
<b>Total Tchirozerine</b>		<b>12</b>	<b>1080</b>	<b>1080</b>	<b>318</b>	<b>1155</b>	<b>1473</b>	<b>42</b>	<b>27204</b>	<b>140760</b>	<b>2429592</b>
Arlit	Dannet	4	490	490	0	511	511	11	5621	0	5621
	Gougaram	4	870	870	0	907	907	12	10884	0	10884
<b>Total Arlit</b>		<b>8</b>	<b>1360</b>	<b>1360</b>	<b>0</b>	<b>1418</b>	<b>1418</b>	<b>23</b>	<b>16505</b>	<b>0</b>	<b>16505</b>
Iférouane	Iférouane	2	460	460	250	396	646	20	7920	5000	12920
	Timia	3	300	300	26	533	559	10	5330	260	5590
<b>Total Iférouane</b>		<b>5</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>276</b>	<b>929</b>	<b>1205</b>	<b>30</b>	<b>13250</b>	<b>5260</b>	<b>18510</b>
<b>Total général</b>		<b>25</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>594</b>	<b>3502</b>	<b>4096</b>	<b>-</b>	<b>56 959</b>	<b>146 020</b>	<b>2 464 607</b>

Source : DRE/LCD

- **Tahoua :**

La distance totale de bandes de pare-feu réalisée pour l'année 2021 s'élève à 7014 kml sur 6 000 kml prévus pour la région de Tahoua.

**Tableau 10 :** Situation des travaux bandes pare-feu réalisés dans la région de Tahoua

Département	Communes	Prévues (Kml)	Réalisations (Kml)	Taux
Tchinta	Kao	4000	5011	125 %
Tahoua	Tébaram	1000	1000	100 %
Tahoua	Takanamatt	1000	1003	100 %
<b>Total</b>		<b>6000</b>	<b>7014</b>	<b>117%</b>

Source : DRE/LCD

**Tableau 11 :** Synthèse de de la main d'œuvre mobilisée au titre des travaux bandes pare-feu

Département	Communes	H/j hommes	H/J Femmes	Total H/j	Hommes	Femmes	Total
Tchinta	Kao	66 813	33 407	100 220	506	253	759

	Takanamatt	13 333	6 667	20 000	101	51	152
Tahoua	Tébaram	13 373	6 687	20 060	101	51	152
<b>Total</b>		<b>93 519</b>	<b>46 761</b>	<b>140 280</b>	<b>708</b>	<b>355</b>	<b>1 063</b>

Source : DRE/LCD

#### ■ 1104- Accompagnement des pépinières (Agadez)

Pour rappel, le projet a prévu de créer et accompagner huit (8) pépinières (six forestières et deux fruitières) avec un objectif de production de 130 000 plants (dont 50% de plants fruitiers). En fin 2020, 7 sur 8 pépinières ont été créés. Il est à noter que seule la pépinière de la commune de Tabelot n'a pas été réalisée, car le site proposé par la commune est situé dans un périmètre maraîcher dont le processus d'aménagement n'est pas achevé. Les échanges sont en cours avec la commune (nouveaux élus) afin qu'un nouveau site soit proposé.

Au cours du premier semestre 2021, des échanges ont été conduits avec les STD dans le cadre de l'élaboration des TDR pour la mission conjointe d'évaluation des pépinières créées. Cette mission a été réalisée et les appuis interviendront en 2022.

#### ■ 1105- Agroforesteries et RNA -Tahoua

Les activités ci-dessous ont été réalisées :

- Les zones cibles identifiées ;
- TDRs de l'activité, de la mission d'information sensibilisation et du voyage d'étude élaborés ;
- Le besoin en petits matériels élaboré ;
- Le traitement de 3 202,7 ha superficies.

**Tableau 12 :** Synthèse des superficies traitées par RNA dans la région de Tahoua

Département	Commune	Nombre d'adoptants	Superficie des champs en RNA /Ha
Illéla	Tajaé	414	970
	Illélé	209	791
Keita	Garhanga	40	50
Bagaroua	Bagaroua	198	1 320
Bouza	Allakaye	34	71,7
<b>Total RNA</b>		<b>895</b>	<b>3 202,7</b>

Source : DRE/LCD

#### ■ 1106- Fixation des dunes -Tahoua

Il est prévu 250 ha pour la fixation des dunes, mais les échanges avec la DRE font ressortir que dans la zone d'intervention, il n'y a pas des dunes mouvantes qui doivent faire l'objet de traitement classique. L'option retenue est de protéger les vallées qui sont menacées des ruissellements et d'ensablement d'où l'expression : Protection des Potentiels Agricoles Productifs (fixation des dunes). Au total 500 ha ont été traités à raison de 125 ha par commune.

L'activité a consisté à l'ensemencement d'herbacée (*Andropogon Gayanus*) dans les champs dunaires qui menacent les vallées au niveau des lisières et sur les courbes de niveau. Cette activité a été couplée avec la plantation de *Faidherbia albida*. C'est une espèce appréciée par les paysans, qui s'adapte bien au milieu et fixe l'azote atmosphérique favorable développement des cultures aux cultures.

**Tableau 13 :** Situation des superficies de dunes fixées dans la région de Tahoua

Commune	Nbre Ha	Nbre H/j	Nbre emploi créés	Emploi Hommes	Emploi Femmes
Tamaské	125	3 125	47	38	8
Keita	125	3 125	47	39	9
Garahanga	125	3 125	47	38	9
Ilélla	125	3 125	47	39	8
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>12 500</b>	<b>188</b>	<b>154</b>	<b>34</b>

Source : DRE/LCD

■ **1107- Traitement biologique des berges des Koris (Tahoua)**

Le PTBA 2021 prévoit le traitement biologique de 40000 ml. Au premier semestre 2021, les activités ci-dessous ont été réalisées :

- Les zones cibles identifiées ;
- TDRs de l'activité, de la Mission d'information sensibilisation et du voyage d'études élaborés ;
- Le besoin en petits matériels élaboré ;

Au total 4000 ml ont été traités à raison de 1000 ha par commune.

**Tableau 14 :** Situation du traitement biologique des berges des Koris dans la région de Tahoua

Communes	Distance (ml)	Bénéficiaires (F)	Bénéficiaires (H)	Total
Keita	1000	22	10	32
Garahanga	1000	24	5	29
Tamaské	1000	18	8	26
Ilélla	1000	30	4	34
<b>Total</b>	<b>4000</b>	<b>94</b>	<b>27</b>	<b>121</b>

Source : DRE/LCD

■ **1108 - Aménagement de mares -Tahoua**

Une DP a été élaborée pour l'étude d'aménagement et de mise en valeur de huit (08) mares dans la région de Tahoua. Le processus de sélection a été conduit et l'étude sera réalisée en 2022.

**Tableau 15 :** Liste des huit (8) mares retenues pour l'étude

N°	Nom	Coordonnée GPS	Commune	Département
1	Mare de Dogon Gona	Lat : 14°27.9692' N Long : 005°58.2580' E	DEOULE	BOUZA
2	Mare de Azao	Lat : 14°42.7171' N Long : 005°11.6014' E	ILLELA	ILLELA
2	Mare de Eghadé	Lat : 15°25.7459' N Long : 005°42.8771' E	KAO	TCHINTABARDE N
4	Mare de Tatawassan	Lat : 14°59.3692' N Long : 006°03.3944' E	IBOHAMANE	KEITA
5	Mare de Tapkin Zaki	Lat : 15°02.3425' N Long : 004°55.0966' E m	TAKANAMATT	TAHOUA
6	Mare de Maléfla	Lat : 14,32342 N Long : 005,13364 E	ILLELA	ILLELA
7	Mare de Beidi	Lat : 14,83587 N Long : 005,72267 E	ILLELA	ILLELA
8	Mare de Dangona	Lat : 14,26935 N Long : 005,04145 E	ILLELA	ILLELA

Source : DRE/LCD

#### ▪ 1109 - Réalisation des haies vives (Tahoua)

Il est prévu de réaliser 500 kml de haie vive autour des vallées. L'activité a été réalisée au même moment que les activités de plantation de plants au niveau des sites de récupération des terres. Ainsi, 800 kml ont été réalisés sur les 500 kml prévus.

**Tableau 16** : Situation des travaux de haies vives réalisés dans la région de Tahoua

Commune	Nbre Kml	Nbre H/j	Nbre emploi créés	Emploi Hommes	Emploi Femmes
Tamaské	200	400	30	10	20
Alakaye	100	200	15	5	10
Tajaé	100	200	15	5	10
Ilélla	200	400	30	10	20
Badaguichiri	200	400	30	10	20
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>1600</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>80</b>

Source : DRE/LCD

#### ▪ 1110- Balisage des couloirs de passage/axes de transhumance et d'espaces pastoraux

Un DAO relatif aux travaux de balisage des espaces pastoraux (19 couloirs de transhumance et aires de pâturages) dans les départements de Bouza, Keita, Bagaroua et Illéla dans la région de Tahoua a été élaboré et le processus de sélection des entreprises a été conduit. Les travaux seront réalisés en 2022.

## 2.2. Résultat 2

**« La réalisation d'infrastructures et d'aménagement permettent, dans un contexte de changement climatique, la valorisation durable des terres arables en vue de retenir les jeunes dans les sites concernés et d'améliorer les revenus des populations »**

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
1201- Etudes d'aménagement de sites maraichers (Agadez)		**				Sélection du prestataire en cours	
1204- Travaux de réalisation de 18 seuils d'infiltration			***			Travaux en cours d'exécution au niveau de 12 sites ; Relance du DAO sur 6 seuils déclarés infructueux	
1205- Travaux de traitement des berges de koris (Agadez)			***			Travaux en cours d'exécution au niveau de 19 sites ;	
1206 - Etude de faisabilité technique, sociale, environnementale du barrage d'OUREY, et de ses aménagements associés (Agadez)		**				Le rapport revu d'évaluation AMI est en cours de validation	
1207- Boutiques d'Intrants Agricoles (Tahoua)					*****	5 BIA construites	
1208- l'Etude des micro-projets intégrés dans les vallées de production de 18 communes dans la région de Tahoua					*****	Atelier de validation de l'étude réalisé	
1209- Construction de 49 seuils (Tahoua)				****		45 seuils lancés dont 35 construits et 10 en cours d'achèvement	
1212- Dispositif de contrôle des travaux de construction seuils (Tahoua-Agadez)				****		Tahoua : Recrutement du personnel Mise en place du dispositif Rapports de suivi disponible	Mise en place du dispositif en cours pour Agadez

■ **Détail par activité**

■ **1201 - Etudes d'aménagement de sites maraîchers - Agadez**

L'aménagement des sites maraîchers constituent une des actions qui permet de créer des emplois durables pour les jeunes, les femmes et les « acteurs de l'économie migratoire ». C'est une stratégie pour faciliter l'accès à la terre pour les couches vulnérables que sont ces groupes. Elle permet aussi l'augmentation et la diversification de la production. Ces aménagements contribueront de ce fait à l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de la population.

Le processus de sélection du prestataire devant réaliser l'étude pour l'aménagement de 8 sites dans 8 dans la commune urbaine d'Agadez est en cours.

■ **1204- Travaux de réalisation de 18 seuils d'infiltration dans la région d'Agadez**

La réalisation de ces seuils aura un impact sur plusieurs centaines de jardins et favorisera certainement la création de nouveaux jardins dans les zones de production. Ils permettront de recharger la nappe donc de pallier au moins partiellement le problème crucial d'eau qui prévaut dans les jardins riverains ainsi que les risques d'inondations des zones de production par les écoulements violents des koris.

Au 31 décembre 2020, les études APS et APD ont été réalisées. Pour rappel, vingt (20) seuils ont été concernés par l'APD et dix-huit (18) seuils ont été jugés pertinents et retenus. Les activités réalisées sont :

- Finalisation des DAO ;
- Lancement et publication des DAO ;
- Mise en place de la commission d'ouverture et d'attribution et du comité d'experts indépendant ;
- Ouverture et analyse des plis ;
- Proposition d'attribution provisoire des lots ;
- Sélection et contractualisation avec les entreprises ;
- Démarrage des travaux au niveau de 12 sites ;
- Relance du DAO sur 6 seuils déclarés infructueux.

**Tableau 17 : Sites de réalisation des 18 seuils d'infiltration**

N°	Site	Type de seuil	Longueur (m)	Coordonnées	Coordonnées	Etat
1	Tamanet 1	Seuil d'infiltration	177.02	9°1'29,2"	17°52'39"	Travaux en cours
2	Tamanet 2	Seuil d'infiltration	91.00	9°0'36,21"	17°53'50,37"	
3	Téwart 1	Seuil d'infiltration	198.50	8°37'43,8"	17°34'15,1"	

N°	Site	Type de seuil	Longueur (m)	Coordonnées	Coordonnées	Etat
4	Téwart 2	Seuil d'infiltration/Radier	275.00	8°37'49.02"	17°35'5.03"	
5	Aouderas	Seuil d'infiltration	228.00	8°24'4.66"	17°37'31.49"	
6	Boghol 1	Seuil d'infiltration	675.00	8°11'35.31"	17° 8'47.79"	
7	Boghol 2	Seuil d'infiltration	477.21	8°12'38.34	17°11'23.09"	
8	Teghazar 2	Seuil d'infiltration	267.12	8° 7'24.66"	17° 2'17.29"	DAO relancé
9	Tchibnitan	Seuil d'infiltration	269.82	7°57'3,6"	17°1'29,1"	
10	Gofat Ouest 3	Seuil d'infiltration	505.17	7°50'50,73"	17°03'26,00"	
11	Sabongari	Seuil d'infiltration/Radier	368.96	8°11'56.49"	17° 1'26.09"	
12	Tassalwat 2	Seuil d'infiltration	261.50	8°46'13.74"	18° 7'57.29"	Travaux en cours
13	Tassalwat 1	Seuil d'infiltration	113.00	8°46'40.07"	18° 7'40.99"	DAO relancé
14	Ajiro 1	Seuil d'infiltration	315.50	08°49'19.75"	17°55'47.38"	
15	Ajiro 2	Seuil d'infiltration	508.00	08°47'52.02"	17°57'06.11"	Travaux en cours
16	Zomo 2	Seuil d'infiltration	288.50	08°56'14.6	18°26'53.9"	DAO relancé
17	Iférouane	Seuil d'infiltration	942.00	08°25'18.3"	19°05'32.1"	Travaux en cours
18	Agalal	Seuil d'infiltration	756.94	8° 9'46.67"	18°42'21.07"	



Travaux de seuil d'infiltration sur le site de Boghol 2 au stade de fondation en date du 19 décembre 2021

Travaux de seuil d'infiltration sur le site de Ajiro 1 au stade de fouille en date du 21 décembre 2021

#### ■ 1205- Travaux de traitement des berges de koris (Agadez)

Au 31 décembre 2020, les études APS et APD ont été réalisées. Les activités réalisées au cours du 1er semestre 2021 sont :

- Finalisation des DAO ;
- Lancement et publication des DAO ;
- Mise en place de la commission d'ouverture et d'attribution et du comité d'experts indépendant ;
- Ouverture et analyse des plis ;
- Proposition d'attribution provisoire des lots ;
- Sélection et contractualisation avec les entreprises ;
- Démarrage des travaux au niveau de 18 sites ;

**Tableau 18 :** Sites potentiels de réalisation des digues de protection

	Site	Type d'ouvrage	Longueur (m)	Coordonnées	
1	Téwart 1	Gabions	934	8°37'43,8"	17°34'15,1"
2	Dakata	Digue en gabions et Pierres sèches	1 477	8°57'15.40"	17°31'55.21"

	Site	Type d'ouvrage	Longueur (m)	Coordonnées	
3	Imin Nabaro	Digue en gabions et Pierres sèches	3 558	8°56'51.11"	17°32'38.69"
4	Tassalamsalam	Digue en gabions et Pierres sèches	3 863	8° 6'7.00"	17°16'2.42"
5	Toudou	Gabions	3 467	7°58'43.24"	16°59'44.92"
6	Gofat Ouest 1	Pierres sèches	3 261	7°52'34,31"	17°3'50,17"
7	Gofat Ouest 2	Digue en gabions et Pierres sèches	3 626	7°54'54,46"	17°03'21,20"
8	Gofat Ouest 3	Digue en gabions et Pierres sèches	1 952	7°50'50,73"	17°03'26,00"
9	Sabongari	Digue en gabions et Pierres sèches	3 300	8°11'56.49"	17° 1'26.09"
10	Balla	Digue en gabions et Pierres sèches	5 494	8°14'54.86"	17° 2'22.57"
11	Tassalwat 2	Digue en gabions et Pierres sèches	3 386	8°46'13.74"	18° 7'57.29"
12	Tassalwat 1	Pierres sèches	1 079	8°46'40.07"	18° 7'40.99"
13	Tola	Pierres sèches	3 399	8°42'59.07"	18°28'20.29"
14	Zomo 1	Gabions	3 007	08°56'42.7"	18°27'23.1"
15	Zomo 2e	Pierres sèches	1 456	08°56'14.6	18°26'53.9"
16	Zomo 3e	Pierres sèches	1 500		
17	Iférouane	Digue en gabions et Pierres sèches	2 910	08°25'18.3"	19°05'32.1"
18	Gougaram	Digue en gabions et Pierres sèches	1 937	7°48'13.73"	18°27'28.68"
19	Mizen	Digue en gabions et Pierres sèches	7 442	7°52'13.48"	17°52'42.97"



Travaux de digues en pierres sèches en cours sur le site de Gougaram le 23 décembre 2021

Travaux de digues en gabions en cours sur le site de Tewart 1 le 20 décembre 2021

- **1206- Etude de faisabilité technique, sociale, environnementale du barrage d'OUREY, et de ses aménagements associés (Agadez)**

L'AMI a été élaboré, lancé. Le rapport d'évaluation de l'AMI est en cours de révision.

- **Boutiques d'Intrants Agricoles (BIA) - Report 2020 Tahoua**

Les 5 BIA prévus ont été construites au niveau des communes de Kalfou, Déoulé, Allakaye, Tajaé et Bagaroua.

**Tableau 19 : Sites des BIA**

N°	Département	Communes	Coordonnées GPS	Date réception
----	-------------	----------	-----------------	----------------

			Nom du village	Longitude	Latitude	
1	Bagaroua	Bagaroua	Bila	04°7'22,063"	14°36'63,65"	Samedi 10 avril 2021
2	Tahoua	Kalfou	Sabon gari	5°32,421"	14°43,097"	(réception prévue en début du mois de juillet)
3	Bouza	Déoulé	Djiballé	5,5844,00"	14°30.01"	Mercredi 05 mai 2021
4		Allakaye	Tadoupta	5°49'08,00"	14°31.36,8"	Jeudi 05 mai 2021
5	Illela	Tajaé	Iskitta	5°28'804"	14,24'049"	Vendredi 05 février 2021

#### ■ 1209 - Construction de 49 seuils - Tahoua

Pour rappel en fin 2020, il y a eu la signature des contrats pour la réalisation de 34 seuils dans la région de Tahoua pour un montant total d'environ de 5,7 milliards FCFA. Remise des sites, paiement des avances de 20%, et démarrage des travaux.

#### **Réalisation des travaux**

Pour les travaux de construction des seuils, sur les quarante-cinq (45) ouvrages prévus dans le PTBA 2021, la situation est la suivante au 31 décembre 2021 :

- Nombre de seuils faisant l'objet de travaux : 45 seuils ;
- Nombre de seuils construits : 35 seuils dont 25 réceptionnés ;
- Les travaux de 10 seuils en cours et seront achevés en 2022.



Seuil de Tacha Boka au stade d'achèvement en date de 18 novembre 2021

Seuil de Kirari achevé en date de 20 décembre 2021

#### ■ 1212 - Dispositif de contrôle des travaux de construction seuils (Tahoua-Agadez)

#### **Tahoua :**

Pour le suivi et supervision des travaux, la DRGR de Tahoua a assuré le suivi et contrôle depuis janvier 2021. Puis un dispositif mis sous la tutelle du PPR a été installé à partir de mi-mars 2021 pour un délai de six (6) mois. Il est composé d'un superviseur basé à Tahoua et de contrôleurs à pied d'œuvre repartis sur les différents chantiers. Il est à noter que la sélection des contrôleurs a été menée avec l'appui de l'ANPE de Tahoua : Le processus du recrutement des contrôleurs a été conduit avec l'appui de l'ANPE de la publication à la sélection des contrôleurs et même la signature des contrats. Cette collaboration a permis la sélection et le recrutement d'un superviseur et de contrôleurs de chantier.

Les missions de suivi et supervision sont sanctionnées par des PV, comptes rendus, fiches d'état d'avancement périodique (mensuels, hebdomadaires, journaliers) des travaux et rapports mensuels (voir rapports en annexe).

Les contrôleurs respectent le contenu de leur cahier de charge et donnent globalement satisfaction dans la bonne exécution des travaux de construction de seuils.

Les activités de supervision et réception technique sont menées de concert avec l'UGP/R, la DRGR de Tahoua et ses démembrements (Départementaux et communaux).

	
<p>Equipe de supervision de la région de Tahoua composée de PPR, DRGR, DRE, DRA, DDGR de Keita visitant le chantier de Keita OPVN le 25 juin 2021</p>	<p>Mission de supervision des chantiers et suivi de comportement des ouvrages composée d'Inspecteurs Généraux du MAG, du PPR et STDs (DRGR, DRE, DRA, Code Rural, I3N, DDGR de Bouza) en visite sur le site de seuil de Loubé le 19 Aout 2021</p>

#### **Agadez :**

Le même type de dispositif pour le suivi des travaux mis en place à dans la région de Tahoua sera mis en place pour le suivi de constructions de seuils et digues au niveau de la région d'Agadez. Les travaux de la commission de sélection des dossiers de contrôleurs des chantiers et superviseurs des seuils et digues de protection du potentiel agricole est en cours.

#### **■ Avantages tires de la mise en œuvre des activités d'infrastructures**

La mise en œuvre des activités d'infrastructure a permis de tirer des avantages, dans l'immédiat, tels que la création d'emploi, la formation des jeunes cadres, l'extension des champs et jardins.

#### **■ Création d'emploi et insertion des jeunes diplômés**

Le PPR a recruté pour la région de Tahoua 1 superviseur et 23 contrôleurs permanents. Pour la région d'Agadez, le recrutement 2 superviseurs et 37 contrôleurs permanents est en cours. Les contrôleurs recrutés à Tahoua sont pour la plupart des jeunes ingénieurs fraîchement sortis des écoles.

Aussi, les différents chantiers des travaux ont permis la création d'emploi aussi bien localement que dans les régions voisines. Durant les phases des travaux de l'année 2021, il a été estimé une mobilisation en nombre de personnel suivante : 261 cadres (Directeurs de travaux, Chefs de chantiers, Topographes, gestionnaires), 322 chauffeurs, 610 Ouvriers qualifiés (maîtres maçons, maçons), 5817 Manœuvres. Soit un total de 7 010 emplois toutes catégories confondues (cf. rapports de supervision).

**Tableau 20 :** Estimation d'emplois créé par les travaux de construction des seuils, digues de protection et Maison Paysan

Région	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total emploi
Tahoua	1196	1171	800	610	654	249	103	103	724	5610
Agadez									1400	1400
<b>Total</b>	<b>1196</b>	<b>1171</b>	<b>800</b>	<b>610</b>	<b>654</b>	<b>249</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>2124</b>	<b>7010</b>

Source : Rapports de supervision PPR



Un atelier de tissage de cages gabions mobilisant des ouvriers locaux sur le site de Mizen en date de novembre 2021



Utilisation de la main d'œuvre locale sur le chantier de Tewart 1 en date de 23 Novembre 2021

### ■ Extension des zones de production

A Tahoua les premiers effets des seuils réalisés se sont fait sentir dans les vallées. En effet, à la suite de la première mise en eau de ces ouvrages, le stockage amont a favorisé la sédimentation dans les lits dégradés qui étaient avant, permettant ainsi la récupération des nouvelles terres qui sont occupées et exploitées.

D'autres champs d'extension se sont créés dans certains sites des seuils notamment à l'aval avec le ralentissement des écoulements dans les vallées. Les nouvelles campagnes maraichères entamées en novembre dernier a permis de se rendre compte de l'occupation des nouvelles terres pour les cultures maraichères (culture des tomates et pastèque en décrue sur les sites de Keita Sud OPVN, nouveaux jardins maraichers sur le site de Gadamata en rive gauche).

Le stockage temporaire des écoulements et l'épandage favorise la création d'une zone humide favorable à l'écologie de la zone.



Etalage des crues sur le site de Zabi Allela créant un espace verdoyant (tapis herbacé et arbustes bien touffus) en faveur de l'écologie dans la zone (En date de 19 Aout 2021)



Etalage des crues aussi bien à l'amont et qu'à l'aval sur le site de Dorodji 3 (favorable à l'extension des nouveaux champs de cultures) le 18 Aout 2021.

### 2.3. Résultat 3

« Les différentes étapes de la valorisation des produits agricoles jusqu'à leur mise en marché sont améliorées »

#### ■ Situation des activités prévues/réalisées

**Légende** | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
1301- Etude de réhabilitation/construction des pistes rurales (Tahoua-Agadez)					*****	Etude réalisée.	
1302- Travaux de réhabilitation des pistes rurales (Tahoua)					*****	Etude réalisée	
1303- Magasins de stockage de produits agricole et BIA-Agadez-Tahoua					*****	<p><b>Agadez :</b> 3 magasins de 200 T ont été équipés en matériel de protection et sécurité phytosanitaire.</p> <p><b>Tahoua :</b> Réceptions provisoires de deux centrales d'approvisionnement en intrants agricoles – Tamaské et Keita ;</p> <p>Réception provisoire d'un magasin de 200T de stock d'aliment bétail ;</p> <p>Réceptions définitives des magasins pour l'arrondissement communal 1 de Tahoua, de Ibohamane et Déoulé ;</p>	
1304- Construction d'une maison de paysans complète (Tahoua-Agadez)				****		<p>. <b>Tahoua</b> : Travaux en cours avec un taux d'exécution de 80% ;</p> <p>. <b>Agadez</b> : Rapport d'évaluation des offres en cours de validation</p>	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
1306- Etude diagnostique de la gestion des comptoirs de commercialisation des produits agricoles/Accompagnement de la gestion des comptoirs (Agadez)					*****	Etude réalisée	
1307- Etude de marché pour la commercialisation et la transformation des produits agricoles (Agadez)					*****	Etude réalisée	
1308- Construction d'un centre de collecte d'oignon à Bagga (Commune de Kalfou)- Tahoua			***			Sélection du prestataire en cours (Résultats d'attribution en cours de validation)	
1310- Traitement des points critiques (radiers) - Tahoua		**				Trois points critiques sur cinq traités	

### ■ Détail par activité

#### ■ 1301- Etude de réhabilitation/construction des pistes rurales (Tahoua-Agadez)

##### Agadez :

Les activités réalisées sont :

- La finalisation de la Demande de Proposition pour prendre en compte les recommandations du COPIL (*les UGP et le ministère de tutelles sont responsables de pour la mise en œuvre des activités du projet surtout les infrastructures structurantes*) ;
- La transmission de la DP aux candidats retenus sur la short-list ;
- L'analyse des offres techniques ;
- L'analyse des offres financières ;
- Contrat signé avec le prestataire ;
- Réalisation de l'étude.

Un atelier de validation des APS est prévu en début 2022.

### Tahoua :

L'étude a été réalisée par les Service Technique Déconcentrés.

#### ▪ 1302- Travaux de réhabilitation des pistes rurales (Tahoua)

Le DAO pour les travaux de réhabilitation et traitement des points critiques sur 38 km de pistes de desserte dans les communes de Tamaské, Badaguichiri et Illéla dans la région de Tahoua a été lancé. Le rapport d'évaluation des offres est en cours de validation.

#### ▪ 1303- Magasins de stockage de produits agricole et BIA- Agadez-Tahoua

### Agadez :

Les réceptions définitives de cinq (5) magasins de 200 T et provisoires de deux (2) magasins de 200 T ont été prononcées. Il est à noter que trois de ces magasins (Oufen ,Dabaga et Tokadi) ont été équipés en matériel de protection et sécurité phytosanitaire.

**Tableau 21 :** Situation des réceptions des magasins de 200 T construits dans la région d'Agadez

Commune	Site	Vocation	Niveau de réalisation
Timia	Oufen	Avant écoulement	Réception définitive
Iférouane	Iférouane	Maison du Paysan	Réception définitive
Dabaga	Dabaga	Maison du Paysan	Réception définitive
Gougaram	Gougaram	Avant écoulement	Réception définitive
Tabelot	Tokadi	Avant écoulement	Réception définitive
Tchirozérine	Attri	Avant écoulement	Réception provisoire
Agadez	Aladeb	Avant écoulement	Réception provisoire

### Tahoua :

- *Construction de deux centrales d'approvisionnement en intrants agricoles – Tamaské et Keita*  
Les chantiers de ces deux magasins ont été lancés juste à la fin de l'année 2020 ; ces deux magasins d'approvisionnement en intrants agricoles pour la commune de Tamaské et Keita ont été réalisés. Leurs réceptions provisoires ont été effectuées le jeudi 04 février 2021. Tout au long des travaux, le suivi et la supervision de ces magasins a été assuré par le DDGR. Le cabinet INTER-ARCHI a également contribué au suivi de l'exécution de ces travaux.
- *Construction des magasins de 200T de stock de sécurité alimentaire – Tahoua*  
Au cours du premier semestre 2021, les réceptions définitives des magasins pour l'arrondissement communal 1 de Tahoua, de Ibohamane et Déoulé ont eu lieu du 20 au 23 mai 2021.

Cette réception a été organisée par les communes concernées ainsi que les parties prenantes notamment la Direction du Génie Rural, le cabinet inter-archi et l'entrepreneur. A l'issue

de la visite, tous les magasins ont été réceptionnés définitivement selon les dates indiquées ci-haut.

○ *Construction d'un magasin de 200T de stock d'aliment bétail – Ibohamane*

Le magasin construit a été réceptionné le 04 du mois de février 2021. Ce magasin est aussi suivi par le cabinet l'inter-archi en collaboration avec la Direction Régionale du Génie Rural.

■ **1304- Construction d'une maison de paysans complète (Tahoua-Agadez)**

**Agadez :**

Pour ce qui est de la construction de la maison de paysans complète de Tabelot, le processus de sélection du prestataire en cours : les résultats d'attribution en cours de validation.

**Tahoua :**

Les travaux sont en cours d'exécution pour la maison du paysan complète de Takanamatt et l'état d'avancement des travaux au 31 décembre 2021 se présente comme suit :

- Lot 1 : 56% et Lot 2 : 82% ;



■ **1306- Etude diagnostique de la gestion des comptoirs de commercialisation des produits agricoles/Accompagnement de la gestion des comptoirs (Agadez)**

Le processus de réalisation de cette activité a démarré en 2020. Les principales activités réalisées sont :

- La finalisation de la sélection du prestataire avec les étapes de :
  - Analyse des offres financières ;
  - Attribution provisoire ;
  - signature du contrat.
- Conduite de l'étude par le prestataire et la production, l'amendement et la finalisation des livrables suivants :
  - Aide-mémoire de démarrage ;
  - Rapport intermédiaire ;
  - Rapport provisoire ;
  - Rapport final validé.

Les résultats de l'étude ont fait l'objet de vulgarisation au niveau de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et l'encadrement des comptoirs. Un plan d'actions étalé sur une durée de trois ans, dans laquelle

les activités à réaliser à très court terme, a été élaboré. Ces activités sont réparties sur les quatre (4) axes suivants :

- La concertation entre les acteurs ;
- Le renforcement des capacités en gestion ;
- La Conformité vis-à-vis des textes régissant la création et le fonctionnement des comptoirs ;
- La réhabilitation des infrastructure et l'équipement des comptoirs.

C'est dans ce cadre, qu'il a été organisé au cours du troisième trimestre de l'année, une rencontre de concertation des acteurs des comptoirs.

La mise en œuvre des activités identifiées dans le plan d'actions se poursuivront au cours de l'année 2022.

■ **1307- Etude de marché pour la commercialisation et la transformation des produits agricoles (Agadez)**

Cette étude de marchés vise entre autres à identifier les filières agricoles présentant un fort potentiel pour la conservation, la commercialisation et la transformation, prioriser et caractériser les produits à transformer ou à conserver, faire un inventaire des idées de projets, identifier les principaux clients ainsi que leurs besoins, préférences et attentes identifier les prix pratiqués sur le marché et faire une analyse des prix à pratiquer pour intégrer le marché.

L'étude a démarré en 2020 et a été finalisée au cours de l'année 2021. Ainsi, les principales activités réalisées sur l'année 2021 sont :

- L'élaboration, l'amendement et la validation du rapport provisoire ;
- L'organisation de l'atelier de validation du rapport définitif de l'étude ;
- Le dépôt et la diffusion du rapport final.

L'étude a fait ressortir des idées de projets de conservation, commercialisation et transformation pour chacun des produits (oignon, pomme de terre et agrumes) qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre des composantes 1 et 2 au profit de plusieurs acteurs des filières (producteurs, OP, Groupements spécialisés dans la transformation, etc.)

■ **1308- Construction d'un centre de collecte d'oignon à Bagga (Commune de Kalfou)-Tahoua**

Le site retenu d'une superficie de 3 ha pour la mise en place du centre de collecte dispose déjà d'un hangar et d'un abri financés par le projet PMERSA. Le besoin exprimé pour l'opérationnalisation du centre est : la clôture, le bureau et les équipements, l'eau et électricité, un magasin, la case gardien et le hangar de tri.

Après l'étude diagnostique qui avait eu lieu en Novembre – Décembre 2020 pour confirmer la faisabilité, le 26 Avril 2021, une réunion regroupant la DRA, l'UGP R/PPR/Tahoua et la Coordination Régionale de l'I3N a eu lieu à Kalfou afin de restituer les résultats du diagnostic aux partenaires (communes de Kalfou et de Bambeye). La réunion, placée sous le lead de la Coordination Régionale I3N a décidé d'organiser une mission conjointe auprès des acteurs concernés pour la restitution et aussi approfondir la réflexion avec eux sur la base des résultats de l'étude. A l'issue de cette de restitution, la mission avait recommandé :

- ✓ A la Direction Régionale du Génie Rural d'appuyer la commune rurale de Kalfou de disposer d'un devis estimatif (transmis au PPR) de construction de la clôture de 3 ha, les latrines, la piste d'accès et l'aménagement du site pour recevoir les camions et la sécurisation des produits ;
- ✓ Au PPR d'appuyer l'opérationnalisation du comptoir d'oignon en autorisant le financement des mesures d'appropriation du site (cités haut) à la hauteur de l'enveloppe inscrite dans le PTBA.

Un DAO a été lancé et le rapport d'analyse des offres est en cours de validation.

■ **1310- Traitement des points critiques (radiers) - Tahoua**

Des concertations ont eu lieu entre les acteurs et les travaux pour trois radiers (deux à Ibohamane et un à Tamaské) ont été effectués en HIMO. Pour les deux autres (Allakaye et Déoullé), les travaux seront réalisés en 2022.

## 2.4. Résultat 4

« Les collectivités territoriales exercent la maîtrise d’ouvrage des investissements à caractère économique »

### ■ Situation des activités prévues/réalisées

**Légende** | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
1401- Appui à l'élaboration des PIA (Agadez-Tahoua)					*****	Les 26 communes de la composante 1 ont reçu l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration des PIA 2022.	
1403-Appui à l'élaboration du SAF de la région (Agadez-Tahoua)			***			Appui à la mise en œuvre de la feuille de route dans les deux régions.	
1405- Evaluation/actualisation/vulgarisation du PDR (Agadez-Tahoua)	*					Le cycle de l'évaluation du PDR actuel interviendra à partir de novembre pour ensuite cheminer sur l'élaboration du PDR 2022 – 2026	
1406- Appui aux COFOCOM et COFOB/Sécurisation foncières- (Agadez-Tahoua)		**				<u>Agadez :</u> 8 COFOCOM sont dynamisées ;  La mise en place des COFOB et en cours  <u>Tahoua :</u> 41 COFOB mises en place, formées et équipées en documents de transaction foncière	
1407-Fonctionnement du CSOF- Agadez-Tahoua			***			Missions et ateliers d'appui aux CT (situation fonds ANFICT 2018-2020) dans les deux régions <u>Tahoua :</u> Réunion réalisée en juillet 2021	
1408-Formation à la maîtrise d'ouvrage- Convention CFGCT				****		Poursuite du déploiement de 30 stagiaires ( 20 à Tahoua et 10 à Agadez) jusqu'au mois août 2021 ;  Une mission de supervision-formative réalisée par le CFGCT ;	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
						Un atelier d'échanges d'expériences et de capitalisation tenu à Tahoua.	
1409- Appui à l'élaboration du PIA 2022 du Conseil Régional (Agadez-Tahoua)					*****	Le processus de l'élaboration du PIA 2022 du Conseil Régional a été appuyé : -l'atelier d'élaboration a été tenu ; -le document de PIA 2022 est disponible.	
1410- Appui aux réunions des cadres de concertation régionaux (Agadez-Tahoua)						5 réunions des cadres de concertations ont été appuyés dans les deux régions	

### ■ Détail par activité

#### ■ 1403-Appui à l'élaboration du SAF de la région (Agadez-Tahoua)

##### ○ Agadez

Les activités conduites se résument comme suit :

- Echanges en continue avec le nouveau Vice – président du Conseil Régional, président du comité technique chargé de l'élaboration du SAF ;
- Un local réhabilité et équipé est fonctionnel ;
- Des sessions de formation des membres du comité technique régional d'élaboration du SAF réalisé ;
- La tenue d'un atelier régional de validation des différents outils élaborés;
- Les structures du code rural (COFDEP ; COFOCOM) mises en place et dynamisées dans le département de Bilma.

##### ○ Tahoua

Les activités conduites se résument comme suit :

- Un voyage d'étude des membres du CTR a été organisé à Dosso ;
- Une formation membres du CTR sur les processus d'élaboration du SAF réalisé ;
- Un atelier de validation des données existantes réalisée ;
- Un TDR pour une collecte de données complémentaires en cours de finalisation par le CTR.

##### ○ Les difficultés

Le semestre janvier – juin 2021 a été marqué par la fin des mandats électifs aux niveaux national et local et par voie de conséquence leur renouvellement. En d'autres termes, les acteurs de mise en œuvre du projet à savoirs les élus locaux, les responsables services techniques déconcentrés ont tous été engagés dans la fièvre électorale.

La fin du processus électoral a ouvert la page des composition et reconstitution annonçant l'installations des nouvelles autorités locales.

A Agadez, il est à signaler le changement consécutif au renouvellement de l'exécutif du Conseil Régional soldé par l'élection d'un nouveau vice-président et la présence de nouveaux membres au sein des commissions thématiques spécialisées et à Tahoua l'arrivée un nouveau Président du Conseil Régional.

■ **1405- Evaluation/actualisation/vulgarisation du PDR (Agadez-Tahoua)**

La poursuite du processus de l'actualisation du Plan de Développement Régional (2022 -2026) est fonction de l'évolution de l'élaboration et de l'adoption et la vulgarisation du nouveau PDES sous la conduite du Ministère du Plan. L'appui de l'UGP R /AT donc conditionné à l'adoption des nouvelles orientations qui seront issues du PDES à venir.

■ **1406 - Appui aux COFOCOM et COFOB/Sécurisation foncières- (Agadez-Tahoua)**

○ **Agadez**

Les activités réalisées sont :

- mission de sécurisation foncière des sites de construction de seuils d'infiltration a été mise à profit pour l'identification participative des villages/tribus pour la mise en place des commissions foncières de base (COFOB) ;
- sécurisation foncière des sites de construction de 18 seuils d'infiltration ;
- identification participative de villages pour la mise en place et l'accompagnement de COFOB

Il est à noter une forte implication/leadership des Secrétaires Permanents des huit COFOCOM dans l'identification des villages/tribus pour la mise en place et l'accompagnement des Commissions foncières de base.

○ **Tahoua**

Les activités réalisées sont :

- Mise en place de 41 COFOB ;
- Formation et équipement des 41 COFOB mis en place (en documents de transaction foncière).

**Tableau 22 :** Liste des COFOB autour des seuils construits par le PPR

	Départements	Communes	Villages site (Cofob)
1	Tchintabaraden	Kao	Intaliwan
2	Tahoua	Arr communal 1	Garin Issa
3		Arr communal 2	Koufan Tahoua
4			Tsamawa
5		Kalfou	Samo Ouest (Samo 1)
6			Samo Est (Samo 2)
7			Guidan Kago (Samo 3)
8			Karadji Sud (Tourboubounou Elana)
9			Samo Peulh (Tourboubounou Samo)
10		Bambèye	Gataraoua
11			Araweye
12		Tébaram	Ijali
13		Takanamatt	Amaloul
14		Barmou	Ourihamizan 1
15			Ourihamizan 2
16		Bouza	Allakaye
17	Wassaké		
18	Guidan Karo		
19	Karkara		
20	Déoulé		Loubé

21	Keita	Garhanga	Sakaraoua Toudou
22			Farat Baba
23			Laba
24		Ibohamane	Gadamata
25			Tacha Boka
26			Karkamat
27			Loudou seuil
28		Loudou barrage	
29		Tamaské	Zabi Allela
30			Sakolé
31			Kogui
32		Keita	Inkimiya Gourouza
33			Galé Idiki
34			Keita Alkalawa
35			Toulliki
36	Illela	Badaguichiri	Kossa (Kossa 1, Kossa 2, Kossa 3)
37		Illela	Karoua
38			Mallawa Changnassou
39		Tajaé	Iskitta
40			Tajaé Sédentaire
41	Bagaroua	Bagaroua	Kolloua (Gougouhema)

Source : SPR/Code Rural, sur la base de la localisation des seuils construits par le PPR

#### ■ 1407-Fonctionnement du CSOF- Agadez-Tahoua

Des missions et ateliers d'appui aux Collectivités des deux régions ont été réalisées afin de faire la situation fonds mis à la disposition de l'ANFICT de 2018 à 2020.

#### ■ 1408-Formation à la maîtrise d'ouvrage- Convention CFGCT

Le projet a mis en place, en novembre 2020, en collaboration avec le CFGCT trente stagiaires au niveau des deux régions pour appuyer les collectivités dans leurs activités quotidiennes.

**Tableau 23 :** Situation des activités conduites par CFGCT

Activités prévues	Statut	Commentaires
<b>Prise en charge des stagiaires (Tahoua et Agadez)</b>	 Réalisé	Déploiement de 30 stagiaires (20 à Tahoua et 10 à Agadez) en novembre 2020
<b>Mission supervision (Tahoua et Agadez)</b>	 Partiellement réalisé	Une mission de supervision- formative a été réalisée à : Tahoua du 15 au 31 août 2021 Agadez du 16 au 30 août 2021
<b>Atelier de capitalisation</b>	 Réalisé	Un atelier de capitalisation a été réalisé : Tahoua du 15 au 31 août 2021 Agadez du 28 au 29 août 2021

Globalement, les stagiaires déployés dans les deux régions (jeunes diplômés de l'ENA -promotion 2018/2019) ont donné des résultats très encourageants.

- **L'entretien avec les personnes concernées (Maires, Secrétaires Généraux, Stagiaires) a révélé que:**
  - o **Tahoua :** les stagiaires ont travaillé avec les services techniques déconcentrés de la commune notamment le Secrétaire Municipal, le receveur Municipal, l'environnement etc. Les activités effectuées sont relatives au recouvrement, aux taxes de marché, au remplissage des actes de cessions .Certains ont participé à des ateliers de formation ;
  - o **Agadez :** les stagiaires ont travaillé avec les services techniques déconcentrés de la commune notamment le Secrétaire Municipal, le receveur Municipal, l'environnement etc. Les activités effectuées sont relatives au recouvrement, aux taxes de marché, au remplissage des actes de cessions. Certains ont participé à des ateliers de formation. à la numérisation des documents, les missions avec les partenaires, la transmission de documents au Trésor; l'analyse des fichiers le contrôle de médicaments; la gestion des magasins des vivres; la saisie des données du recensement administratif ; etc.
- **96% des Maires interrogés souhaitent la reconduction des contrats.** A ce niveau, il est à noter qu'à Tahoua, pour l'ensemble des dix-huit (18) communes d'intervention de la composante 1 du PPR, 89,05% des élus (179 sur 201) sont des nouveaux représentants des communautés à la base et pour Agadez ce taux est de 71,17% pour l'ensemble des 8 communes (79 sur 111).

■ **1410- Appui aux réunions des cadres de concertation régionaux (Agadez-Tahoua)**

Appui à la tenue de cinq (5) réunions des cadres de concertations dans les deux régions :

**Agadez :**

- Cadres concertation communaux des acteurs (CCCA) ;
- Cadres de concertation départementaux (CDT).

**Tahoua :**

- Cadre de concertation sur le bilan des interventions des ONG ;
- Réunion des acteurs pour la restitution des résultats étude diagnostique centre collecte oignon de Bagga ;
- Atelier d'animation CTR I3N.

## Composante 2

La composante 2 vise à faciliter l'accès des acteurs des filières aux institutions financières. Elle concerne l'ensemble du territoire des régions d'Agadez et Tahoua.

Les principales réalisations au titre l'année du 1er semestre 2021 se résument à : (i) l'accélération des opérations du Financement à Coût Partagé (FCP) dans la région de Tahoua avec l'implication des SFD

YTM et CF afin de rendre effectifs les financements des dossiers élaborés et transmis aux IF en décembre 2020 ; (ii) la réalisation de la mission pour l'élaboration des plans de renforcement des capacités des IF (fin avril et début mai 2021) ; (iii) le suivi régulier des opérations de financements dans la Région de Tahoua ; (iv) le suivi du processus d'élaboration de la convention PPR-FISAN.

Pour le second semestre 2021, il s'est agi de (i) poursuivre le financement des producteurs dans les 2 régions en prenant en compte les difficultés du semestre précédent ; (ii) mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités avec toutes les IF ; (iii) accélérer les activités relatives à l'abondement du projet au fonds de garantie et l'assistance technique à la SAHFI.

## 2.5. Résultat 5.

« Un mécanisme d'appui au financement des investissements agricoles est mis en place avec les institutions financières »

### ■ Situation des activités prévues/réalisées

**Légende** | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Soutien aux Exploitations Agricoles Familiales - EAF				****		Financement en cours	274 dossiers financés pour 538 bénéficiaires dans les deux régions
Soutien aux petites et moyennes entreprises	*					Non réalisée	Identification des structures d'accompagnement des MPER et des porteurs de projets de PME en cours

### ■ Détail par activité

#### ■ Soutien aux Exploitations Agricoles Familiales – EAF

Pour rappel, le PPR a signé des conventions de financement avec les IF (Banque-BAGRI, les SFD UCMN, FINAIR, Yarda Tarka Maggia et Capital Finance) afin qu'ils participent de façon opérationnelle au financement des projets des promoteurs à l'échelle des deux Régions.

#### ➤ Situation des dossiers financés par IF

##### ○ BAGRI

La BAGRI était le premier partenaire financier à accompagner le PPR dans le cadre du Financement à Coût Partagé dans les zones d'invention du Projet (Régions d'Agadez et de Tahoua). Ce partenariat a été matérialisé par la signature de la convention le 11 septembre 2019, et le positionnement par le PPR, en octobre 2019, d'un montant de 222 711 000 FCFA (avance de 40 %) dans un compte spécifique ouvert à

cet effet dans ses livres. Il est à noter que la BAGRI a démarré les opérations de financement avant même la mise en place de l'avance.

L'exécution de la convention PPR/AFD-BAGRI va de septembre 2019 à décembre 2020. Pour permettre le dénouement des dossiers en instances, une prorogation de la convention allant jusqu'au 15 février 2021 a été actée par l'ensemble des parties. Ainsi, le financement accordé par la BAGRI au titre de l'année 2021 (1<sup>er</sup> janvier 2021 au 15 février 2021) est présenté dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 24 :** Situation des dossiers financés par la BAGRI pour l'année 2021

Désignation	Situation
Nombre de dossiers financés	105
Nombre de bénéficiaires financés	313
Montant de projets financés	251 029 558
Nombre de crédits accordés	105
Montant de crédits octroyés	125 514 779
Montant des subventions accordées	100 648 073
Contributions des bénéficiaires	24 867 157

Source : BAGRI

En définitif, la situation de financement des dossiers par la BAGRI au titre la convention se présente comme suit :

- 183 projets agricoles financés impliquant 783 promoteurs ;
- 85% de la subvention reçue du PPR utilisée, soit 190 273 709 FCFA ;
- La situation des impayés relatifs aux crédits octroyés depuis le démarrage des activités de cofinancement est de 8 047 563 FCFA, soit 3,44% de détérioration du portefeuille PPR ;
- 21 communes ont été concernées par le cofinancement BAGRI-PPR ( 17 de la région de Tahoua et 4 de celle d'Agadez).

Ainsi, afin de poursuivre le financement des promoteurs par la BAGRI un avenant est en cours de préparation.

○ **YARDA TARKA MAGGIA**

En 2021, YARDA TARKA MAGGIA a reçu un total de 449 dossiers des jeunes formés pour financement répartis comme suit :

**Tableau 25 :** Dossiers des jeunes reçus par YARDA TARKA MAGGIA

Guichets	Nbre Dossiers	Coût Projet
Bouza	165	83 450 060
Konni	24	8 578 250
Illela	70	37 060 000
Malbaza	0	-
Madaoua	125	83 895 500
Tahoua	65	36 567 100
<b>Montant total</b>	449	249 550 910

Source : Yarda Tarka Maggia

Le traitement de ces dossiers a démarré en début 2021 et au 31 décembre 2021 132 dossiers financés avec une subvention de **32 629 714** Fcfa et un crédit de **36 761 080** Fcfa.

**Tableau 26 :** Situation des dossiers financés par Yarda Tarka Maggia pour l'année 2021

Guichets	Dossiers financés	Mt Sollicité décaissé	Cout Projet	Crédit Accordé	Subvention	Apport Personnel
Bouza	56	16 381 780	32 763 560	16 381 780	14 743 602	1 638 178
Konni	0	-	-	-	-	-
Illela	31	8 878 500	17 757 000	8 878 500	7 964 152	914 348
Malbaza	0	-	-	-	-	-
Madaoua	0	-	-	-	-	-
Tahoua	45	11 500 800	23 001 600	11 500 800	9 921 960	917 400
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>36 761 080</b>	<b>73 522 160</b>	<b>36 761 080</b>	<b>32 629 714</b>	<b>3 469 926</b>

Source : Yarda Tarka Maggia

En termes des difficultés rencontrées, on peut citer notamment :

- Choix des promoteurs cibles ;
- Le retard dans les ouvertures de compte ou versement des apports pour certains promoteurs ;
- La réticence dans le financement des dossiers PPR au vu des promesses de subside qui tardent à se concrétiser ;
- Les SFD en général sont limités par les moyens aux vues du nombre important de demandeurs de crédit.

Ainsi, afin de poursuivre le financement des promoteurs par la SFD Yarda Tarka Maggia un avenant est en cours de préparation.

#### ○ SFD - CAPITAL FINANCE

Au total CAPITAL FINANCE a reçu 4 dossiers dont 2 individuels et 2 groupements (avec respectivement 17 et 18 membres). Au 31 décembre 2021, 2 dossiers financés (1 individuel et 1 groupement) avec une subvention de 3 013 900 Fcfa et un crédit de 3 409 000 Fcfa ; et les 2 autres en cours de financement.

**Tableau 27** : Situation des dossiers financés par CAPITAL FINANCE

Communes	Village	Nbre promoteurs (hommes)	Subvention	Crédit	Apport personnel	Montant total du sous projet
Kalfou	Karadji Sud	Groupement de 18 membres	2 580 300	2 867 000	286 700	5 734 000
Tahoua	Tadis	1	436 000	542 000	108400	1 084 000
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>3 013 900</b>	<b>3 409 000</b>	<b>395 100</b>	<b>6 818 000</b>

Source : Capital Finance Tahoua

Ainsi, afin de poursuivre le financement des promoteurs par la SFD CAPITAL FINANCE un avenant est en cours de préparation.

#### ○ SFD - FINAIR Arlit

Au total FINAIR Arlit a financé une coopérative de 40 promoteurs avec une subvention de 21 536 677 Fcfa et un crédit de 26 024 625 Fcfa .

**Tableau 28** : Situation des dossiers financés par FINAIR Arlit

Financement/ Commune	Nbre de dossiers	Nbre de promoteurs	Apport personnel	Prêt FINAÏR (FCFA)	Subvention PPR	Total
Timia	1	40	4 487 948	26 024 625	21 536 677	52 049 250

Source : FINAÏR Arlit

Ainsi, afin de poursuivre le financement des promoteurs par la SFD **FINAÏR Arlit** un avenant est en cours de préparation.

○ **SFD - UCMN Agadez**

L'Union du Crédit Mutuel d'Agadez a financé 34 dossiers individuels avec une subvention de 8 888 575 Fcfa et un crédit de 7 919 150 Fcfa .

**Tableau 29** : Situation des dossiers financés par UCMN Agadez

Financement/commune	Nbre de dossiers	Nbre de promoteurs	Apport personnel	Prêt CMN (FCFA)	Subvention PPR	Total
Dabaga/Timia	34	34	1 524 415	7 919 150	8 888 575	18 332 140

Source : UCMN Agadez

■ **Analyse des activités réalisées au titre du résultat 5 « Un mécanisme d'appui au financement des investissements agricoles est mis en place avec les institutions financières »**

Le tableau de synthèse suivant présente l'ensemble des opérations de financement à coûts partagés réalisées dans les 2 régions par les 5 institutions financières partenaires pendant l'année 2021

**Tableau 30** : Récapitulation des activités de crédit en 2021

Institutions Financières	Dossiers financés	Montant des financements			Nbre bénéficiaires	Observations
		Subvention	Crédit	Apport p.		
BAGRI	105	100 648 073	125 514 779	24 867 157	313	Période réalisation 01/01 -15/02/2021
Yarda T.M.	132	32 629 714	36 761 080	3 469 926	132	
Capital F.	2	3 013 900	3 409 000	395 100	19	
Finair Arlit	1	21 536 677	26 024 625	4 487 948	40	Fin. Coop. de 40 maraichers
Caisse M. Arlit	34	8 888 575	7 919 150	1 524 415	34	34 maraichers bénéficiaires
<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>166 716 939</b>	<b>199 628 634</b>	<b>34 744 546</b>	<b>538</b>	

A partir de ce tableau, on peut constater que la BAGRI a mis en place 72% des crédits réalisés et a touché plus de 58% des bénéficiaires au cours de l'année 2021. Ces chiffres auraient dû augmenter sensiblement si cette banque n'avait pas suspendu la mise en place des nouveaux crédits à partir de mars 2021 en raison de l'expiration de la date de fin de la convention de partenariat PPR-BAGRI.

**Premiers effets des opérations de financement à coûts partagés**

Si l'on intègre les opérations de financement 2021 à celle des années antérieures, le montant des crédits placés au total s'élève à 304 692 976 F CFA, une subvention de 253 328 675 F CFA, des apports personnels de 53 315 352 F CFA pour 1 008 bénéficiaires, comme le montre le tableau ci-dessous.

**Tableau 31** : Situation cumulée des opérations de financement du début à fin 2021

Institutions Financières	Nbre de dossiers financés	Nbre de promoteurs	Montant des financements		
			Subvention	Crédit	Apport pers.
BAGRI	183	783	190 273 709	230 579 121	43 437 963
Yarda Tarka Maggia	132	132	32 629 714	36 761 080	3 469 926
Capital Finance	2	19	3 013 900	3 409 000	395 100
Finair Arlit	1	40	21 536 677	26 024 625	4 487 948
Caisse Mutuelle Arlit	34	34	8 888 575	7 919 150	1 524 415
<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>1 008</b>	<b>253 328 675</b>	<b>304 692 976</b>	<b>53 315 352</b>

Il faut noter que les 4 SFD partenaires du PPR dans les 2 régions d'intervention ont réalisé leurs premières activités de financement de manière complète au cours de l'année 2021 étant donné que leurs conventions de partenariat avec le PPR ont été signées au milieu de l'année 2020. Par contre, la BAGRI dont la convention a été signée en septembre 2019 et qui a démarré les activités avant même la mise à disposition des fonds PPR a placé 76% du montant des crédits cumulés.

Sur le terrain, les opérations de financement commencent à avoir des effets perceptibles. Ainsi, la coopérative maraîchère de Goufat (commune de Tchirozérine) a bénéficié de 2 crédits auprès de la BAGRI dont le premier (qui a été remboursé entièrement) a permis aux maraîchers d'acquérir des équipements et des intrants et un second d'acheter un tracteur dont le remboursement est en cours avec des versements anticipés. Ainsi, ces financements ont permis à deux petits producteurs membres de la coopérative de se libérer de la dépendance vis-à-vis des commerçants usuriers et à un d'entre eux d'acquérir même une moto.

Par ailleurs, 2 jeunes maraîchers de Tagara (commune urbaine de Tahoua) qui ont été formés sur la filière maraîchage ont abandonné leur commerce de détail qu'ils pratiquaient auparavant dans leurs boutiques et se consacrent entièrement au maraîchage avec une extension de leurs superficies exploitées et une augmentation sensible des rendements grâce à l'application des pratiques culturales acquises. De cette manière, ils produisent suffisamment pour charger 2 à 3 camions de 30 tonnes par campagne pour la vente de leur production d'oignons au Ghana.

### Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de FCP se rapportent à :

- Le non-respect des dispositions des conventions de partenariat relatives au reporting des activités. Ainsi, les IF partenaires ne transmettent pas régulièrement les rapports d'activités et autres pièces justificatives et ne respectent pas les délais de transmission ;
- Les difficultés de mobilisation à temps de l'apport personnel par certains promoteurs.

## 2.6. Résultat 6.

### « Les opérations de financement agricoles sont mieux sécurisées »

#### ■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Assistance technique à la SAHFI	*					En cours	TDR en cours de validation.
Abondement du FdG « Finance agricole »		**				Signature de la convention et abondement du fonds de garantie par le PPR	

#### ■ Détail par activité

##### ■ Assistance technique à la SAHFI

Dans le cadre du PTBA 2021 du PPR, il est prévu une assistance technique pour des activités de renforcement des capacités de la SHAFI. Des échanges ont été faits avec la SAHFI, les TDR relatifs à la mobilisation de l'assistance technique sont en cours de validations. Le processus de recrutement sera lancé par le PPR.

##### ■ Abondement du FdG « Finance agricole »

Les échanges FISAN/SAHFI/PPR/AFD (2 réunions tenues) ont permis de s'accorder sur la convention PPR/FISAN et les conditions pour l'abondement du fonds de garantie par le PPR. La convention a été signée le 12 Juillet 2021 à l'Hôtel NOOM et elle a pour objet de définir la manière dont la contribution du Projet Pôles Ruraux au Fonds de Garantie pour un montant de cinq cents millions (500.000.000) francs CFA sous forme de don qui a été mobilisée en décembre 2021. Cette subvention accordée par le PPR au Fonds servira entre autres à garantir les concours de crédits octroyés par les établissements de crédit partenaires du Projet Pôles Ruraux.

## 2.7. Résultat 7.

**« Les capacités des institutions financières sont renforcées pour améliorer les services financiers à l'agriculture »**

#### ■ Situation des activités prévues/réalisées

**Légende | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle - | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée |**

#### ■ Détail par activité

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
Appui à la méthodologie de crédit agricole					*****	Réalisée.	
Formation des SFD sur la connaissance des filières			***			2 sessions de formation réalisées	

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Niveau d'avancement	Commentaires
	*	**	***	****	*****		
agricoles et le cycle de crédit agricole							

■ **Appui à la méthodologie de crédit agricole**

Le projet a retenu avec le bailleur de faire appel à une expertise externe afin de produire et faire un suivi perlé du plan d'accompagnement des IF partenaires. La mission d'élaboration des plans de renforcement des capacités des IF a été réalisé et le rapport partagé. La mise en œuvre des activités a débuté au second semestre 2021 avec la réalisation de la session de formation sur le cycle du crédit agricole. Les différents appuis proposés sont récapitulés ci-dessous :

**Tableau N° 32 : Récapitulatif des besoins matériels et équipement propos**

Désignation	Unité	Quantité	BAGRI	FINAIR	UCMN	YARDA	CAPITAL FINANCE
<b>Matériels roulants</b>							
Véhicule 4X4	unité	5	1	1	1	1	1
Motos Tout Terrain	unité	14	0	2	4	4	3
<b>Sous total mat roulants</b>							
<b>Matériels Informatiques et mobilier</b>							
Ordinateurs Portables et accessoires	unité	8	0	2	2	2	2
Imprimante laser noir et blanc	unité	4	0	1	1	1	1
Photocopieur	unité	4		1	1	1	1
Fauteuils	unité	2	0	2	0	0	0
Chaises	unité	4	0	4	0	0	0
Video-projecteur	unité	4	0	1	1	1	1
Dispositif de surveillance	Dispositif	4	0	1	2	1	0

**Tableau 33 : Récapitulatif du plan de formation**

THEMES	NOMBRE DE PERSONNES (3 agents par IF)	PERIODES				RESPONSABLES DE LA FORMATION	PERSONNES RESSOURCES
		T1	T2	T3	T4		
Gestion des crédits	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Finance Islamique	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Finance Digitale	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Finance Agricole	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Gestion des risques du crédit agricole	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Connaissance des filières agricoles	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Cycle de crédit agricole	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Développement de nouveaux produits agricoles	15			X	X	Consultant Formateur	Consultant
Education Financière	SFD			X	X	Consultant Formateur	Consultant
COACHING (2 thèmes)							
Vie associative	Jeunes producteurs			X	X	CRA	Consultant
Sensibilisation radio				X	X	Coopec Yarda	
<b>TOTAL</b>							

## Composante 3

La composante 3 porte sur la fourniture de services non financiers aux producteurs et autres acteurs des filières agricoles des deux régions concernées. L'approche consiste à renforcer les capacités des STD et des CRA afin d'améliorer les services délivrés, et le développement des appuis aux acteurs des filières.

## 2.8. Résultat 8.

« Les services délivrés au profit des acteurs des filières agricoles par les directions régionales en charge de l'agriculture, du génie rural et de l'environnement sont améliorés »

### ■ Situation des activités prévues/réalisées

**Légende** | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle - | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée |

Activités	Niveau de mise en œuvre des activités					Réalisation	Commentaires/ Perspectives
	*	**	***	****	*****		
Appui aux activités des Services Techniques Déconcentrés – Agadez et Tahoua				****		<p><b>Agadez :</b> Atelier de partage et d'internalisation du PTBA 2021 ; Elaboration du projet d'avenant 2021 à la convention PPR-Gouvernorat d'Agadez ; Actualisation, signature et transmission des protocoles spécifiques avec 07 STD ; Elaboration et exécution des TDR par les STD pour l'accompagnement des CT</p> <p><b>Tahoua :</b> Atelier de partage et d'internalisation du PTBA 2021 ; Elaboration du projet d'avenant 2021 à la convention PPR-Gouvernorat d'Agadez ; Elaboration et signature des protocoles spécifiques avec les STD ; Elaboration et exécution des TDR par les STD Organisation d'une rencontre sur la mise en œuvre des activités</p>	Poursuivre la mise en œuvre les protocoles spécifiques

### ■ Détail par activité

Au cours de l'année 2021, dans le cadre des conventions ont été signées avec les Gouvernorats d'Agadez et de Tahoua. Les activités ci-dessous ont été réalisées avec les STD :

- **Directions Régionales du Génie Rural**
  - Appui au processus de passation de marchés ;
  - Missions conjointes de remise des sites aux entreprises des travaux des ouvrages de mobilisation des eaux de surface ;

- Missions de suivi et supervision des travaux de construction des infrastructures (seuils, digues, magasins, etc.) ;
- Missions de réception des réalisations ;
- Appui à la mise en œuvre des activités du projet.
- **Directions Régionales de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable**
  - Appui à la mise en œuvre des activités de récupération des terres dégradées ;
  - Appui à la mise en œuvre des activités d'ouverture des bandes pare-feu ;
  - Missions de suivi et supervision des travaux ;
  - Appui à la visibilité des actions du projet (cadre de la Fête Nationale de l'Arbre, missions ministérielles, etc.) ;
  - Participation au processus d'ingénierie sociale ;
  - Appui aux activités des études d'Impact Environnemental et Social ;
  - Appui à la mise en œuvre des activités du projet.
- **Directions Régionales de l'Agriculture**
  - Missions de supervision et d'évaluation des activités des jeunes agriculteurs ;
  - Appui au processus de réalisation des études (transformation/conservation et commercialisation, diagnostique gestion des comptoirs, etc.) ;
  - Appuis et encadrement des producteurs ;
  - Appuis à la mise en place et à la formation des comités de gestion ;
  - Mission d'appui et de suivi des activités des COGES (magasins, seuils, etc.)
  - Missions de suivi et supervision des activités ;
  - Appui à la mise en œuvre des activités du projet.
- **Direction Régionale du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire :**
  - Appui à la concertation sur le processus de l'élaboration du SAF ;
  - Appui au processus d'actualisation du PDR ;
  - Appui au processus de passation de marchés ;
  - Appui aux cadres des concertations ;
  - Appui aux missions de supervisions ;
  - Appui à la mise en œuvre des activités du projet.
- **Secrétaire Permanent Régional du Code Rural**
  - Appui à la sécurisation foncière des sites ;
  - Concertation sur le processus de l'élaboration du SAF ;
  - Appui à la mise en place et à la dynamisation des COFOCOM et des COFOB ;
  - Appui à la mise en œuvre des activités du projet.
- **Coordination Régionale I3N**
  - Appui aux cadres de concertation communaux des acteurs (CCCA) ;
  - Appui à la mise en œuvre des activités du projet.

## 2.9. Résultat 9

« Les organisations professionnelles agricoles développent leurs services de conseils au profit des acteurs des filières et renforcent leurs capacités d'orientation du développement régional avec l'appui des CRA et du RECA »

■ Situation des activités prévues/réalisées

Légende | \* - Pas d'exécution | \*\* - Début d'exécution | \*\*\* - Exécution partielle - | \*\*\*\* - Mise en œuvre avancée | \*\*\*\*\* - Terminée |

Activités		Niveau de mise en œuvre des activités					Réalizations
		*	**	***	****	*****	
Activité de la CRA d'Agadez	Formation des jeunes agriculteurs et agricultrices		**				627 jeunes en formés
	Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale (CGEF)			***			28 sites identifiés, dont 11 pour la Saison Sèche Froide (SSF) et 17 pour la Saison d'Hivernage (SH) ; 393 exploitants concernés dont 151 pour la campagne Saison Sèche Froide et 242 pour la saison d'hivernage.
Activité de la CRA Tahoua	Formation des jeunes agriculteurs et agricultrices				****		826 jeunes admis aux sessions de formations
	Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale (CGEF)				****		16 sites ont servi de cadre de formation pour 273 producteurs

■ Détails par activité

■ Activités CRA d'Agadez

Au cours de l'année 2021, il a été procédé à :

■ Formation des jeunes agriculteurs et agricultrices

- Proposition par les mairies des neuf concernées des sites de formation des jeunes ;
- Organisation de l'atelier régional de concertation pour la validation de 40 sites de la campagne d'hivernage 2021 ;
- Information, sensibilisation et confirmation des SFJA ;
- Identification des jeunes sur les sites de formation ;
- Sélection des opérateurs en charge de la formation des jeunes ;
- Signature des contrats entre la CRA et les opérateurs retenus ;
- Formation des formateurs des opérateurs ;
- Remise des sites aux opérateurs de formation ;
- Formation des jeunes sur les sites de formation ;
- Suivi du comité régional;

- Évaluation des jeunes formés par le comité régional (activité en cours) ;

**Tableau 34** : Situation de la formation des jeunes

Commune	Nbre de Site	Effectifs au démarrage	Effectif au 31/10/2021	Filles	Garçons	Abandons	Taux d'abandon
Agadez	3	60	49	31	18	11	18,33%
Dabaga	7	60	58	27	31	2	3,45%
Tchirozérine	8	150	140	48	92	10	7,14%
Tabelot	7	124	111	28	83	13	10,48%
Timia	7	140	131	20	111	9	6,43%
Iférouane	3	60	50	2	48	10	16,67%
Gougaram	1	20	20	5	15	0	0,00%
Dannet	1	20	13	0	13	7	35,00%
Ingall	3	60	55	16	39	5	8,33%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>694</b>	<b>627</b>	<b>177</b>	<b>450</b>	<b>67</b>	<b>9,65%</b>

▪ **Appui à l'installation des jeunes agriculteurs**

Au cours de l'année 2021, la Chambre Régionale d'Agriculture a enregistré 495 demandes de financement, dont 245 provenant des jeunes agriculteurs formés.

**Tableau 35** : Situation de l'appui à l'installation des jeunes agriculteurs

Rubriques	2019-2020	2021	Total
Demandes reçues des promoteurs	891	495	1386
Dossiers pré-visites	891	420	1311
Dossiers des promoteurs traités et transmis aux IF	771	53	824
Dossiers des promoteurs traités à transmettre aux IFs	0	140	140
Dossiers des promoteurs en cours de traitement à CRA	0	308	308

▪ **Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale**

Les activités de Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale ont été conduites au niveau de 28 sites au bénéfice de 393 exploitants :

- Campagne Saison Sèche sur 11 sites suivis dans trois (3) communes pour suivre 151 producteurs ;
- Campagne Saison d'hivernage sur 17 sites suivis dans quatre (4) communes 242 producteurs.

▪ **Analyse des données et restitution des résultats CGEF 2020**

Les résultats issus d'analyse des données ont été restitués au niveau des sites. Deux types de restitution sont faites : restitutions groupées (avec l'ensemble des producteurs du site) et les restitutions individuelles.

**Tableau 36** : Situation des restitutions des résultats CGEF 2020

Commune	Nombre de Sites	Nombre de producteurs touchés
Dabaga	4	71
Tabelot	5	70
Tchirozérine	1	12
<b>Total général</b>	<b>10</b>	<b>153</b>

#### ▪ **Actions d'accompagnement de la CRA et des OPs**

Ces actions sont constituées des

- Des animations thématiques : onze (11) thèmes de sensibilisations ont été réalisés. Au total 377 producteurs ont été concernés dont 44 femmes.
- Des parcelles de démonstration : l'activité a démarré au cours de la campagne d'hivernage 2021 et se poursuivra en 2022. Les démonstrations portent sur deux cultures (Oignon et tomate) et ont concerné six (6) sites répartis dans les communes de Dabaga, Tabelot et Tchirozérine.
- Diffusion d'émissions sur les radios communautaires : les quatre (4) radios concernées sont Aroyan (Timia), Azourou (Tchirozérine), Bagzam FM (Tabelot) et Telwa (Dabaga). Les messages véhiculés concernent le CGEF, la gestion phytosanitaire, les opportunités de financement (financement à couts partagé).

#### ▪ **Renforcement de capacités des techniciens en charges du suivi CGEF**

La CRA d'Agadez a conduit un certain nombre d'actions de renforcement de capacité des animateurs endogènes et de leurs OPs. Les activités de renforcement et rencontre d'échanges conduites en 2021 sont les suivantes :

- Formation de 33 agents de suivi (23 animateurs endogènes et 10 techniciens) sur le CGEF :
- Formation de vingt-cinq (25) conseillers, techniciens et représentants d'OP des communes d'Agadez, Dabaga, Tabelot, Tchirozérine et Timia sur la gestion phytosanitaire des cultures et le contrôle phytosanitaire ;
- Formation de trente-cinq (35) animateurs endogènes des OP en charge du suivi CGEF sur la gestion phytosanitaire des cultures maraichères.

#### ▪ **Activités CRA Tahoua**

Dans le cadre de la convention qui lie le PPR et la CRA de Tahoua, les activités suivantes ont été menées :

##### ➤ **Formation Professionnelle agricole des jeunes et accompagnement à l'installation**

Cette activité répond à un souci d'insérer les jeunes à travers cette activité d'entrepreneuriat agricole pour décourager les candidats à l'exode et renforcer les capacités des OP afin de bien mener leurs activités.

Dans le cadre de la formation des jeunes, le PPR a un objectif de former chaque année 1000 jeunes dans les 2 régions pour les 2 saisons.

Après l'évaluation des jeunes au niveau de 33 sites pour la formation de la saison sèche froide, le 5 juin s'était tenu l'atelier régional pour le partage des résultats de la formation professionnelle des jeunes agriculteurs et à la proposition des sites pour la formation en hivernage. Ainsi sur les 46 sites proposés, 17 ont été retenus après la mission d'information/sensibilisation, identification et validation des sites.

La fin de la formation a été marquée par :

L'organisation des journées portes ouvertes par la CRA Tahoua à Garin Moussa (Bambey), à Dolé (Konni) et à Koungigué (Sabon Guida), cérémonies au cours desquelles le PPR, les autorités administratives et coutumières ont assistés

L'évaluation des jeunes au niveau de 33 sites de formation (Tableau) dans les 15 communes les donne un taux de réussite de 96% soit 573 sur 594 jeunes ayant effectivement suivi les 135h de cours. Au départ 726 jeunes inscrits, 717 ayant débuté la formation soit 9 jeunes qui ont quitté après un mois de formation soit un taux de 17,15% d'abandon enregistré.

**Tableau 37** : Résultat de l'évaluation des apprenants pour la saison sèche froide

Communes	Opérateur	Total général	Abandon	% abandon	formés	refusé	Validé	%validé
Bambey	Tounfani	22		0%	22		22	100%
Barmou	APADRI	43	12	28%	31	4	27	87%
Birni Konni	APADRI	44	6	14%	38		38	100%
Dogueraoua	CCPHN	44	6	14%	38		38	100%
Galma	HALAL	22	4	18%	18	4	14	78%
Illela	APADRI	15	2	13%	13	1	12	92%
Kalfou	APADRI - Tounfani	66	12	18%	54	5	49	91%
Karofane	Telwa	88	15	17%	73		73	100%
Keita	Guiguigna	45	6	13%	39		39	100%
Madaoua	Telwa	88	12	14%	76	2	74	97%
Malbaza	Wadata	44	16	36%	28	1	27	96%
Sabon Guida	Halal	87	17	20%	70	3	67	96%
Tama	CCPHN	22		0%	22	1	21	95%
Tamaské	Guiguigna	43	7	16%	36		36	100%
Tsernaoua	Wadata	44	8	18%	36		36	100%
<b>Total général</b>		<b>717</b>	<b>123</b>	<b>17%</b>	<b>594</b>	<b>21</b>	<b>573</b>	<b>96%</b>

Source : CRA Tahoua

**Tableau 38** : Résultat de l'évaluation des SFJA en termes d'hommes/femmes

Jeunes engagés		Abandon		Absents à l'évaluation		Validés	
Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons
66	651	13	110	1	20	52	521
<b>Total : 717</b>		<b>Total : 123</b>		<b>Total : 21</b>		<b>Total : 573</b>	

Source : CRA Tahoua

Après, l'évaluation des jeunes au niveau de 33 sites pour la formation de la saison sèche froide, le 5 juin s'était tenu l'atelier régional pour le partage des résultats de la formation professionnelle des jeunes agriculteurs et à la proposition des sites pour la formation en hivernage. Ainsi sur les 46 sites proposés, 17 ont été retenus (Tableau) après la mission d'information/sensibilisation, identification et validation des sites par le comité régional de suivi lors de la réunion d'évaluation des propositions.

**Tableau 39** : Liste des prestataires recrutés pour la formation des jeunes en hivernage

Lots	Nombre de Sites	Communes	Sites/Village	Opérateur
N°1	3 Sites	Karofane	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tahiga,</li> <li>✓ Jankadami,</li> <li>✓ Zongo Gouzouma</li> </ul>	GIE Telwa
N°2	3 Sites	Madaoua	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kaba,</li> <li>✓ Tounfafi,</li> <li>✓ Guingi</li> </ul>	GIE Telwa
N°3	3 Sites	Galma, Sabon Guida	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Arewa</li> <li>✓ El Roudou,</li> <li>✓ Tapkin Chaïbou</li> </ul>	GIE Halal

N°4	4 Sites	Konni	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Matankaraoua,</li> <li>✓ Guidan Godiya,</li> <li>✓ Dagarka,</li> <li>✓ Kaoura</li> </ul>	ONG Tounfani
N°5	4 Sites	Malbaza, Dogueraoua	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zourbatan,</li> <li>✓ Abilo (Zango),</li> <li>✓ Sabonga,</li> <li>✓ Louhoudou</li> </ul>	GIE Guiguingna

Source : CRA Tahoua

**Tableau 40 :** Résultats de l'évaluation de la formation des jeunes apprenants pour la période hivernale

Communes	Nombre de Abandon	Jeunes admis	Nombre de Refusé	Nombre de jeunes inscrits
<b>Dogueraoua</b>	<b>5</b>	<b>38</b>		<b>43</b>
Louhoudou	3	18		21
Sabonga	2	20		22
<b>Galma</b>	<b>3</b>	<b>18</b>		<b>21</b>
Arewa	3	18		21
<b>Karofane</b>	<b>8</b>	<b>51</b>		<b>59</b>
Djankadami	4	17		21
Tahigga		22		22
Zongo Gouzouma	4	12		16
<b>Konni</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>88</b>
Dagarka	1	21		22
Guidan godiya	8	14		22
Kaoura	7	13	2	22
Matankarawa	6	16		22
<b>Madaoua</b>		<b>22</b>		<b>44</b>
Guinji		22		22
Tounfafi		22		22
<b>Malbaza</b>	<b>19</b>	<b>25</b>		<b>44</b>
Abilo	9	13		22
Zourbatan	10	12		22
<b>Sabon Guida</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>38</b>
EL Roudou		18		18
Tapki Chaibou	2	17	1	20
<b>Total général</b>	<b>59</b>	<b>253</b>	<b>6</b>	<b>318</b>

Source : CRA Tahoua

Pour la formation en hivernage, 253 jeunes sont admis sur les 318 inscrits soit un taux de 79,55%  
 Au total pour 2021, 853 jeunes ont été formés et 826 jeunes apprenants sont admis à l'issue des 2 sessions de formations, soit un taux de 90,57%.

**Tableau 41 :** Situation des jeunes formés en hivernage

Jeunes engagés		Abandon		Refusé (- 135h)		Validés	
Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons
63	255	7	52	1	5	55	198
<b>Total : 318</b>		<b>Total : 59</b>		<b>Total : 21</b>		<b>Total : 253</b>	

Source : CRA Tahoua

### ➤ Appui à l'installation des jeunes agriculteurs

Au cours de l'année 2021, la Chambre Régionale d'Agriculture a enregistré 573 demandes de financement provenant des jeunes agriculteurs formés dont 454 ont été pré visités et transmis aux IF pour financement.

**Tableau 42** : Situation des jeunes formés en hivernage

Campagne	Jeunes formés			Insertion des jeunes		
	F	M	Total Général	Demandes reçus	Demandes prévisités	Dossiers transmis aux IF
CH 2019	53	118	171	133	133	133
CH 2020	36	227	263	110	110	110
CSF 2018-2019	22	188	210	174	174	174
CSF 2019-2020	55	276	331	251	251	251
CSF 2020-2021	52	521	573	454	454	454
<b>Total</b>	<b>218</b>	<b>1330</b>	<b>1548</b>	<b>1122</b>	<b>1122</b>	<b>1122</b>

Source : CRA Tahoua

### ➤ Conseil de Gestion à l'Exploitation Familiale :

Pour la campagne sèche froide, le CGEF a été conduit dans 16 sites de 13 communes avec 273 producteurs.

## 2.10 Appui au pilotage et à la gestion du projet

Cette rubrique est relative à l'administration et à la gestion du PPR. Les détails des réalisations sont décrits ci-dessous. Les activités ci-dessous ont été réalisées pendant la période rapportée :

### ➤ **Elaboration du rapport annuel 2021**

Le rapport annuel 2021 est en cours d'élaboration et sera partagé avec les différents acteurs.

### ➤ **Elaboration du PTBA 2021**

Le PTBA 2021 a été élaboré et l'ANO a été obtenu le 07 avril 2021

### ➤ **Tenue du 4<sup>ème</sup> COPIL**

La réunion du 4<sup>ème</sup> Comité de Pilotage s'est tenue le 26 mars 2021 et la programmation 2021 a été approuvée sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Il est à noter que compte tenu du contexte COVID, le COPIL a été organisé dans le respect des règles édictées et en amont le projet de PTBA 2021 a été partagé avec les acteurs en vue de recueillir les observations.

### ➤ **Ateliers régionaux de partage du PTBA 2021**

Des ateliers régionaux de partage du PTBA 2021 ont été tenus au niveau des 2 régions afin de permettre aux acteurs de mise en œuvre de s'approprier du document.

### ➤ **Elaboration de la note sur la prolongation du projet PPR**

La date limite de mise en œuvre prévue en août 2021 ne permettrait pas, entre autres : d'honorer les engagements en cours ; de poursuivre la mise en place des infrastructures et aménagements programmés ; d'accompagner les acteurs pour une appropriation des investissements notamment dans l'exploitation, la gestion et l'entretien des ouvrages ; et d'atteindre les objectifs fixés.

Aussi, le projet a élaboré une note pour la demande la prolongation du projet pour une durée de 18 mois.

### ➤ **Suivi des activités du Bureau National d'Evaluation Environnementale (BNEE) :**

- mission de vérification terrain et audiences publiques sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale ;
- Atelier d'évaluation des rapports provisoires de l'Etude d'Impact Environnemental et Social des projets intégrés dans 17 Vallées ;
- Renforcement des capacités des cadres des services techniques Régionaux et Départementaux sur les Evaluations Environnementales dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet.

### ➤ **Préparation des audits et évaluation à mi-parcours**

- Audits UE en début janvier ;
- Réponses à l'audit 2019 ;
- Lancement de l'audit 2020 et rapport provisoire reçu ;
- Analyse des offres pour l'évaluation à mi-parcours.

### ➤ **Préparation des conventions et avenants :**

Gouvernorats, Conseils régionaux, FISAN, BAGRI, CFGCT.

### ➤ **Appui à la mission de supervision AFD/UE**

L'Agence Française de Développement et la Délégation de l'Union Européenne ont réalisé une mission de supervision du 29 novembre au 04 décembre 2021. Cette mission a été consacrée à la supervision des activités du Projet Pôles Ruraux (évaluer et documenter l'exécution technique et financière du projet). L'UGP/AT a apporté un appui à l'organisation et au bon déroulement de ladite mission.

### ➤ **Elaboration du PTBA 2022**

Le PTBA 2022 est en cours d'élaboration.

➤ **Missions d'appui PPR/MAG**

**Tableau 43** : Situation des missions d'appui

Période	Intitulé mission	Participants	Lieu
Février	Mission d'appui à la commission de Marché à Tahoua	Point Focal ; Chauffeur	Tahoua
	Mission d'appui au UGP de Tahoua et Agadez	Coordonnateur National ; ATP ; Chauffeur	Tahoua et Agadez
	Mission d'appui au recrutement des contrôleurs et superviseur à Tahoua	Point focal	Tahoua
Mars	Mission d'appui aux contrôles des travaux	Point Focal	Tahoua
Avril	Atelier de mise en œuvre du PTBA 2021	Coordonnateur National ; Responsable communication ; ATP ; Chauffeur	Tahoua et Agadez
	Mission de Préparation de l'Audit 2020 et élaboration des DRF	AT/GAF ; RAF UGP ; AT/Comptable ; Chauffeur	Tahoua et Agadez
Mai	l'atelier d'enrichissement du Projet de Stratégie Nationale de Promotion des Pôles Régionaux	Coordonnateur National ; Chauffeur	Dosso
Juin	Mission d'appui à la gestion financière, aux équipes régionales du projet PPR Agadez et Tahoua	AT/GAF ; RAF UGP ; Chauffeur	Tahoua et Agadez
juillet	Mission appui UGP Tahoua et validation étude par BNEE	ATP ; Chauffeur	Tahoua
Sept	Mission d'appui aux équipes régionales du projet PPR Agadez et Tahoua	Coordonnateur National ; ATP ; Chauffeur	Tahoua et Agadez
Oct	Mission d'appui aux équipes régionales du projet PPR Agadez et Tahoua	Coordonnateur National ; ATP ; Chauffeur	Tahoua et Agadez
Nov	Mission d'appui aux équipes régionales du projet PPR Agadez et Tahoua (Mission de supervision AFD)	Coordonnateur National ; ATP ; Chauffeur	Tahoua et Agadez

■ **Assistance Technique au Pilotage et à la mise en œuvre du Projet**

Pour les missions d'expertise court terme :

■ 4 missions ont été réalisées :

- Mission d'expertise court-terme en appui aux STD, aux collectivités et aux équipes du PPR en matière d'ingénierie sociale ;
- Mission d'expertise court-terme en appui aux équipes UGP/AT en gestion financière ;
- Mission d'élaboration des plans de renforcement des capacités des institutions financières partenaires ;
- Mission d'appui à l'équipe UGP/AT de la chargée de projet IRAM.

On peut également noter, des échanges constants avec le siège de l'IRAM sur un rythme hebdomadaire.

■ **Activités administratives et financières ou autres activités transversales**

- Préparation des TDR des activités ;
- Suivi des demandes d'ANO ;
- Suivi de la situation financière du projet ;
- Tenue des réunions de coordination hebdomadaires ;
- Rapprochements bancaires ;
- Suivi des feuilles de temps ;
- Paiement des dépenses ;
- Règlement des salaires ;
- Déclaration des impôts et cotisations sociales ;
- Etc.

▪ **Mesures prises dans le cadre de la prévention contre le COVID-19**

Le projet PPR s'est aligné, tant au niveau national que régional, sur les mesures sanitaires prise par les autorités, dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID 19 (distribution de gel hydroalcoolique, de masques, mise en place du dispositif de lavage des mains, etc.)

### 2.11 Difficultés rencontrées et mesures prises pour les surmonter

Comme difficulté rencontrée sur la période on peut citer :

- La suspension des versements sur les comptes du projet (consécutif aux conclusions des audits du MAG) entraînant une tension de trésorerie et un ralentissement de la mise en œuvre du PTBA 2021 ;
- Les délais pris par les partenaires pour la remise des livrables.

### 2.12 Modifications introduites en cours de mise en œuvre

A l'issue de la quatrième session ordinaire, le Comité National de Pilotage du Projet Pôles Ruraux (PPR) a recommandé : -

- d'accorder à la maîtrise d'ouvrage (responsabiliser) à l'UGP/AT dans la mise en œuvre des activités du projet en particulier les infrastructures structurantes ;
- la prorogation de la date limite de mise en œuvre du PPR pour une durée de 18 mois.

### III. Bilan des principaux résultats de l'Action (à l'aide des indicateurs compris dans la convention) au cours de la période rapportée.

#### 3.1 Etat de mise en œuvre du PTBA 2021

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible PTBA 2021	Total réalisation	%
<b>Composante 1 : Mise en œuvre par les collectivités territoriales des infrastructures et des aménagements collectifs publics ou communautaires nécessaire au développement durable des productions agricoles et leurs mises en marché (cofinancé par UE et AFD)</b>					
<b>Résultat 1</b> : Des aménagements combinés permettent de préserver le potentiel productif des eaux et des terres afin de valoriser ensuite des productions des filières porteuses	Nombre de km paires feux,	km	9200	<b>10 587</b>	115%
	Nombre ha de CES/DRS,	ha	1977	<b>1 982</b>	100%
	Nombre ha de fixation de dunes	ha	250	<b>500</b>	200%
	Nombre ha de RNA,	ha	5000	<b>3 202</b>	64%
	Nombre de pépinières fonctionnelles,	nb	7	<b>7</b>	100%
	Nombre de plants plantés et conservés ( et ),	nb	1 240 978	<b>1 167 335</b>	94%
	Nombre de mares aménagées,	nb	5	-	0%
	Nombre de km de brise vent et de haies vives plantées et conservés (taux de reprise 95%) ;	km	500	<b>800</b>	160%
<b>Résultat 2</b> : La réalisation d'infrastructures et d'aménagement permettent, dans un contexte de changement climatique, la valorisation durable des terres arables en vue de retenir les jeunes dans les sites concernés et d'améliorer les revenus des populations	Nombre de km de couloirs de passages/axes de transhumance et d'espaces pastoraux balisés	km	800	-	0%
	Nombre de seuils d'épandage construits,	nb	62	<b>45</b>	73%
	Nombre de sites d'installation réalisés,	nb	0	-	0%
	Nombre de femmes et jeunes producteurs installés	nb	0	-	0%
<b>Résultat 3</b> : Les différentes étapes de la valorisation des produits agricoles jusqu'à leur mise en marché sont améliorées	Nombre de marchés construits	nb	0	-	0%
	Nombre de magasins construits	nb	6	<b>3</b>	50%
	Nombre de comptoirs construits	nb	0	-	0%
<b>Résultat 4</b> : Les collectivités territoriales exercent la maîtrise d'ouvrage des investissements à caractère économique	Nombre de km de pistes réalisés	km	0	-	0%
	nombre de collectivités ayant élaboré de manière concertée avec les acteurs locaux des documents de projet	nb	26	<b>26</b>	100%
	nombre de collectivités accompagnées par le Projet	nb	28	<b>28</b>	100%

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible PTBA 2021	Total réalisation	%
<b>Composante 2 du Projet : Amélioration de l'accès au crédit agricole (financé par l'AFD)</b>					
<b>Résultat 5</b> : Un mécanisme d'appui au financement des investissements agricoles est mis en place avec les institutions financières	Nombre de crédits de campagne + prêts de campagne accordés	nb	1000	<b>1 008</b>	101%
	Nombre MPER financés	nb	0	-	0%
	Nombre de PME financés	nb	1	-	0%
<b>Résultat 6</b> : Les opérations de financement agricole sont mieux sécurisées	Evolution du nombre de crédit stockage mis en œuvre, Nombre de professionnels partenaires, etc.			-	0%
	Evolution quantitative du fonds de garantie, Evolution de l'adhésion d'institutions financières à Sahfi.	montant	500 000 000	500 000 000	100%
<b>Résultat 7</b> : Les institutions financières sont renforcées pour améliorer les services	Nombre d' IF appuyés (après processus de sélection)	nb	5	<b>5</b>	100%
<b>Composante 3 du Projet – Amélioration des services non financiers en faveur des acteurs des filières agricole (financé par l'AFD)</b>					
<b>Résultat 8</b> : Les services délivrés au profit des acteurs des filières agricoles par les directions	Nombre et diversité de dossiers montés	nb	1000	<b>538</b>	54%
<b>Résultat 9</b> : Les organisations professionnelles agricoles développent leurs services de conseils au profit des acteurs des filières et renforcent leurs capacités d'orientation du développement régional avec l'appui des CRA et du RECA	Nb de formations dispensées, , ,	nb	4	<b>4</b>	100%
	Nb de jeunes agriculteurs (garçons et filles) formés, etc.	nb	1000	<b>1 453</b>	145%
	Evolution du conseil aux exploitations agricoles, aux OP et aux groupements et coopératives de femmes	nb		<b>666</b>	
<b>Appui au pilotage et à la gestion du projet</b>					
	Ténuée régulière du comité de pilotage	nb	2	<b>1</b>	50%
	nb et type de conventions de partenariats,	nb	6	<b>3</b>	50%
	niveau de mobilisation des appuis	nb	10	<b>12</b>	120%
	évolution du flux de financement via l'ANFICT (durée du cheminement des dossiers par CT)	montant		<b>127 742 686</b>	
	nb de concertations	nb	5	<b>5</b>	100%

### 3.2 Etat d'avancement du PPR 2018-2021

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible globale du projet	Réalizations				Total réalisations	
				2018	2019	2020	2021	Qt	%
<b>Composante 1 : Mise en œuvre par les collectivités territoriales des infrastructures et des aménagements collectifs publics ou communautaires nécessaire au développement durable des productions agricoles et leurs mises en marché (cofinancé par UE et AFD)</b>									
<b>Résultat 1</b> : Des aménagements combinés permettent de préserver le potentiel productif des eaux et des terres afin de valoriser ensuite des productions des filières porteuses	Nombre de km pares feux,	km	28 000	0	1 660	4 485	10 587	16 732	60%
	Nombre ha de CES/DRS,	ha	25 000	4 644	5 355	13 315	1 982	25 296	101%
	Nombre ha de fixation de dunes	ha	2 000	0	-	91	500	591	30%
	Nombre ha de RNA,	ha	5 000	0	-	-	3 202	3 202	64%
	Nombre de pépinières fonctionnelles,	nb	55	0	-	56	7	63	115%
	Nombre de plants plantés et conservés ( et ),	nb	33 000 000	381 342	1 221 851	1 871 256	1 167 335	4 641 784	14%
	Nombre de mares aménagées,	nb	5	0	-	-	-	-	0%
	Nombre de km de brise vent et de haies vives plantées et conservés (taux de reprise 95%) ;	km	500		-	-	800	800	160%
	Nombre de km de couloirs de passages/axes de transhumance et d'espaces pastoraux balisés	km	5 000	0	-	-	-	-	0%
<b>Résultat 2</b> : La réalisation d'infrastructures et d'aménagement permettent, dans un contexte de changement climatique, la valorisation durable des terres arables en vue de retenir les jeunes dans les sites concernés et d'améliorer les revenus des populations	Nombre de seuils d'épandage construits,	nb	74	0	-	-	45	45	61%
	Nombre de sites d'installation réalisés,	nb	100	0	-	-	-	-	0%
	Nombre de femmes et jeunes producteurs installés	nb	1 000	0	-	-	-	-	0%

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible globale du projet	Réalizations				Total réalisations	
				2018	2019	2020	2021	Qt	%
<b>Composante 1 : Mise en œuvre par les collectivités territoriales des infrastructures et des aménagements collectifs publics ou communautaires nécessaire au développement durable des productions agricoles et leurs mises en marché (cofinancé par UE et AFD)</b>									
<b>Résultat 3</b> : Les différentes étapes de la valorisation des produits agricoles jusqu'à leur mise en marché sont améliorées	Nombre de magasins construits	nb	26	0	8	9	3	20	77%
	Nombre de comptoirs construits	nb	4	0	-	-	-	-	0%
	Nombre de km de pistes réalisés	km	200	0	-	-	-	-	0%
<b>Résultat 4</b> : Les collectivités territoriales exercent la maîtrise d'ouvrage des investissements à caractère économique	nombre de collectivités ayant élaboré de manière concertée avec les acteurs locaux des documents de projet	nb	28	28	28	28	28	28	100%
	nombre de collectivités accompagnées par le Projet	nb	28	28	28	28	28	28	100%
<b>Composante 2 du Projet : Amélioration de l'accès au crédit agricole (financé par l'AFD)</b>									
<b>Résultat 5</b> : Un mécanisme d'appui au financement des investissements agricoles est mis en place avec les institutions financières	Nombre de crédits de campagne + prêts de campagne accordés	nb	7 500	0	37	433	1 008	1 478	20%
	Nombre MPER financés	nb	400	0	-	-	-	-	0%
	Nombre de PME financés	nb	2	0	-	-	-	-	0%
<b>Résultat 6</b> : Les opérations de financement agricole sont mieux sécurisées	Evolution du nombre de crédit stockage mis en œuvre, Nombre de professionnels partenaires, etc.	nb	N/D	0	-	-	-	-	
	Evolution quantitative du fonds de garantie, Evolution de l'adhésion d'institutions financières à Sahfi.	nb	500 000 000	0	-	-	500 000 000	500 000 000	100%
<b>Résultat 7</b> : Les institutions financières sont renforcées pour améliorer les services	Nombre d' IF appuyés (après processus de sélection)	nb	5	0	1	5	5	5	100%

Résultats escomptés	Indicateurs objectivement vérifiables	Unité	Cible globale du projet	Réalizations				Total réalisations	
				2018	2019	2020	2021	Qt	%
<b>Composante 3 du Projet – Amélioration des services non financiers en faveur des acteurs des filières agricole (financé par l'AFD)</b>									
<b>Résultat 8</b> : Les services délivrés au profit des acteurs des filières agricoles par les directions	Nombre et diversité de dossiers montés	nb	N/D	0	419	1 483	538	2 440	
<b>Résultat 9</b> : Les organisations professionnelles agricoles développent leurs services de conseils au profit des acteurs des filières et renforcent leurs capacités d'orientation du développement régional avec l'appui des CRA et du RECA	Nb de formations dispensées, , ,	nb	N/D		3	4	4	11	
	Nb de jeunes agriculteurs (garçons et filles) formés, etc.	nb	3 000	0	551	1 419	1 453	3 423	114%
	Evolution du conseil aux exploitations agricoles, aux OP et aux groupements et coopératives de femmes	nb	N/D	325	935	728	666	2 654	
<b>Appui au pilotage et à la gestion du projet</b>									
	Ténuie régulière du comité de pilotage	nb	8	1	2	-	1	4	50%
	nb et type de conventions de partenariats,	nb	13		6	4	3	13	100%
	niveau de mobilisation des appuis	nb	12		10	10	12	12	100%
	évolution du flux de financement via l'ANFICT (durée du cheminement des dossiers par CT)	montant	7 708 345 145	1 274 320 000	2 303 406 279	4 002 876 180	127 742 686	7 708 345 145	100%
	nb de concertations	nb	N/D	0	9	16	5	30	

## IV. Mise en œuvre du Plan de communication et de visibilité

### ▪ Production des supports de communication et visibilité du projet

L'amélioration de la visibilité est une des priorités du projet, prise en compte dans le PTBA2021 et détaillée dans le plan de communication visibilité du projet.

La production des supports de communication notamment des calendriers, portes documents, blocs notes, gilets, casquettes ...est incontestablement une action qui permettra de vulgariser les messages du projet et lui assurer une grande visibilité auprès de son public cible.

Le projet a produit des supports de communication à l'effigie du projet pour toucher largement les partenaires, bénéficiaires et agents du projet et porter loin les messages du projet pour cette nouvelle année de mise en œuvre des activités. Il s'agit de :

- 500 calendriers 2021
- 500 Blocs notes 2021
- 250 portes clés
- 50 gilets PPR pour le personnel
- 250 t-shirts
- 250 casquettes
- 26 affiches pour les communes d'intervention
- 100 Portes documents

Ces supports de communication produits, ont été utilisés pour la visibilité du projet sur le terrain, auprès des partenaires et autres bénéficiaires du projet.

Les affiches ont été placées au niveau des 26 mairies des communes d'intervention du projet

### ▪ Visibilité Quatrième réunion du comité de pilotage du projet

Dans le cadre de la visibilité de la quatrième réunion du comité de pilotage du projet, des TDR ont été élaborés pour cadrer cette activité.

Ainsi deux banderoles ont été confectionnées, une couverture médiatique par des organes de la presse publique et privée a été organisé.

Deux télévisions (Télé Sahel et télé Anfani) et la voix du sahel ont couvert l'évènement et diffusé sur leurs antennes.

Les deux banderoles produites pour la circonstance ont été affichées ; l'une à l'entrée du ministère de l'Agriculture et l'autre à l'intérieur de la salle de réunion.

### ▪ Participation aux ateliers de la mise en œuvre du PTBA 2021 à Tahoua et Agadez

L'atelier de mise en œuvre du PTBA 2021 de Tahoua s'est tenu du 12 au 13 mars 2021 et celui d'Agadez du 19 au 20 avril 2021. Ces rencontres ont regroupé les acteurs techniques de mise en œuvre du PTBA/ Il s'agit des représentants de la DRE ; CRA ; OR ; SPR-CR ; GDT ; DRGR ; PPR National et PPR TAHOUA avec comme objectif de proposer une planification détaillée par résultat c'est-à-dire déclinée en tâches, période, acteurs responsables, acteurs impliqués...

En marge de ces ateliers, une série de visites de suivi des activités du projet au niveau de la région de Tahoua a été entreprise. La mission a ainsi visité plusieurs chantiers de construction des seuils dans la région pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux à quelques jours du délai contractuel de livraison de ces travaux. Le bilan est globalement satisfaisant quant à l'avancement des travaux sur ces chantiers. Un rapport a été produit à la fin de l'activité.

- **Appui à la foire des maraichers d'Agadez à Niamey**

Le comité d'organisation de la foire des maraichers d'Agadez à Niamey a soumis une requête de demande de financement de sa foire à Niamey. Suite à l'accord de financement du coordonnateur national, des TDR ont été produits pour cadrer et orienter cet appui.

Ainsi des badges d'identification des maraichers exposants et une location des stands d'exposition ont été financés par le Projet Pôles Ruraux pour permettre l'atteinte des objectifs de cette foire.

- **Appui à l'UGPR de Tahoua sur les aspects communication et visibilité dans le cadre de la mission de supervision des activités du projet du Gouvernorat de Tahoua**

Le gouvernorat de Tahoua a entrepris du 27 au 29 mai 2021 une mission de supervision des activités du Projet Pôles Ruraux Tahoua dans la région. Cette mission qui entre dans le cadre de la convention qui lie le gouvernorat et le Projet Pôles Ruraux a été mise à profit pour réceptionner certains seuils d'épandage dans la région de Tahoua.

Cette mission terrain est une occasion pour le projet de communiquer et d'accroître sa visibilité et la visibilité de ses activités.

Ainsi pour faciliter la mission, des fiches techniques de chaque site à visiter ont été élaborées. Ces fiches comportent la présentation détaillée de chaque seuil à visiter. Un Kit a été préparé et partagé avec tous les participants à la mission. Ce kit comporte la présentation du projet Pôles Ruraux et ses activités, les fiches techniques des sites à visiter et un classeur à l'effigie du projet.

Afin d'assurer la visibilité de cette mission de supervision et surtout du projet Pôles Ruraux, des couvertures médiatiques en Français et en Hausa ont été réalisées et diffusées sur l'ORTN, un publiereportage de 7mn a été produit et diffusé toujours sur l'ORTN.

Des casquettes et gilets du PPR ont été produits et partagés lors de la mission aux participants pour une plus grande visibilité du projet.

Des Interviews ont été réalisées avec les différents directeurs régionaux des services techniques intervenants dans la mise en œuvre du PPR pour recueillir des informations en vue de la production du publiereportage, de la newsletter et aussi de la diffusion sur les réseaux sociaux.

- **Appui à l'UGPR d'Agadez sur les aspects communication et visibilité dans le cadre de la mission ministérielle d'échange avec les acteurs de mise en œuvre du projet Pôles Ruraux**

Le Ministre de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification a entrepris une visite de travail du 15 au 21 juin 2021 dans les régions de Tahoua et Agadez. Une visite qui a pour objectif d'apprécier le niveau d'exécution des activités rentrant dans le cadre du volet environnement et lutte contre la désertification et d'échanger avec les acteurs de mise en œuvre des projets partenaires de son département ministériel dont le Projet Pôles Ruraux.

Pour faciliter la mission, des fiches techniques de chaque site à visiter ont été élaborées. Ces fiches comportent la présentation détaillée des sites à visiter.

Un Kit a été préparé et partagé avec tous les participants à la mission. Ce kit comporte la présentation du projet Pôles Ruraux et ses activités, les fiches techniques des sites à visiter et un classeur à l'effigie du projet.

Afin d'assurer davantage la visibilité de cette visite et surtout du projet Pôles Ruraux, une couverture médiatique en Français a été réalisée et diffusées sur la radio et télé sahel ORTN. Cet élément a été rediffusé sur la télévision Bonferey et sur la radio Anfani.

Des casquettes et gilets du PPR ont été partagés lors de la mission aux les participants pour une plus grande visibilité du projet.

La ministre de l'environnement est de la lutte contre la désertification a accordé une interview à l'équipe presse. Elle a félicité le projet pour ses interventions dans le cadre de la récupération des terres, de la régénération naturelle assistée et aussi de la production des plants dans les régions de Tahoua et Agadez.

- **Communication et visibilité de la cérémonie de signature de convention entre le projet Pôles Ruraux et le Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire Et Nutritionnelle FISAN**

Le 12 juillet 2021 le Projet Pôles Ruraux a signé une convention avec le Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire Et Nutritionnelle FISAN . Cette convention a pour objet la contribution du Projet Pôles Ruraux sous la forme de don au Fonds de garantie. La signature de la convention est un évènement très important pour le projet, l'Etat du Niger et les Partenaires Techniques et Financiers.

Ainsi dans le cadre de la communication et visibilité de cet évènement, des cartes d'invitation ont été produites et envoyées aux invités.

Deux banderoles ont été produites et affichées l'une à la devanture du lieu de l'évènement et l'autre dans la salle.

Deux hôtes ont été mobilisées pour faciliter le déroulement de la cérémonie.

Cinq médias audiovisuels ( ORTN, Labari, Dounia, Bonferey Anfani) et l'ONEP ont été invités pour couvrir l'évènement.

## **V. Résumé des contrôles et audit réalisés**

Le Projet Pôles Ruraux est à sa troisième mission d'audit externe. Il faut rappeler que le contrôle des comptes et la vérification des dépenses confiés au Cabinet I.A α C Niger concernent spécifiquement trois exercices comptables (2018, 2019 et 2020). La première période bouclée a couvert le premier semestre 2017 et l'exercice comptable 2018. La deuxième période a couvert l'exercice 2019 et la troisième a concerné l'exercice 2020. Le rapport d'audit 2020 a été reçu et les réponses aux observations faites par l'auditeur sont en train d'être données. Le projet a également à reçu la mission d'audit UE en début 2021. Par ailleurs le processus pour le recrutement du Cabinet pour le contrôle des comptes et la vérification des dépenses exercices comptables (2021, 2022 et 2023) est en cours.

## VI. Rapport financier de l'Action

Le Taux d'exécution annuel du PTBA 2021 au 31 décembre 2021 est de .....%

### 1.1. Situation des réalisations au 31/12/2021 en FCFA

Code	Libellé	PTBA 2021	Realisations de Janvier à Décembre 2021			Taux (%)
			UE	AFD	TOTAL	
<b>Composante 1</b>	<b>Financement d'investissements collectif à caractère public</b>	<b>10 646 329 743</b>	<b>4 202 355 557</b>	<b>5 614 918 516</b>	<b>9 817 274 073</b>	<b>92,2</b>
Résultat 1	Protection des capacités productives	2 227 820 765	1 869 790 460	578 739 889	2 448 530 349	109,9
Résultat 2	Amélioration de la production	6 572 095 193	2 066 984 704	4 858 228 436	6 925 213 140	105,4
Résultat 3	Appui à la collecte, transformation et vente des produits	1 374 129 325	73 450 177	141 246 209	214 696 386	15,6
Résultat 4	Appui aux CT et à la MO	472 284 460	192 130 216	36 703 982	228 834 198	48,5
<b>Composante 2</b>	<b>Amélioration de l'Accès au crédit agricole</b>	<b>1 134 537 000</b>	<b>0</b>	<b>533 125 017</b>	<b>533 125 017</b>	<b>46,99</b>
Résultat 5	Accès aux financements des opérateurs privés	382 537 000		26 712 592	26 712 592	6,98
Résultat 6	Sécurisation du financement agricole	584 000 000		500 000 000	500 000 000	85,62
Résultat 7	Renforcement des capacités des institutions financières part	168 000 000		6 412 425	6 412 425	3,82
<b>Composante 3</b>	<b>Amélioration des services non financiers en faveur des acteurs</b>	<b>1 192 292 295</b>	<b>210 000</b>	<b>369 185 870</b>	<b>369 395 870</b>	<b>30,98</b>
Résultat 8	Appui aux directions régionales	404 100 000		258 882 726	258 882 726	64,06
Résultat 9	Appui au RECA et aux CRA pour les OP	788 192 295	210 000	110 303 144	110 513 144	14,02
<b>Composante 4</b>	<b>Coordination Générale du Projet</b>	<b>933 656 476</b>		<b>425 871 476</b>	<b>425 871 476</b>	<b>45,61</b>
	Coordination Générale du Projet	933 656 476		425 871 476	425 871 476	45,61
<b>Autres lignes</b>	<b>Communication, Audit, évaluation et imprévu</b>	<b>211 357 420</b>	<b>28 621 969</b>	<b>4 375 000</b>	<b>32 996 969</b>	<b>15,61</b>
	Communication,	76 000 000	28 621 969		28 621 969	37,66
	Evaluation et audit	96 000 000		4 375 000	4 375 000	4,56
	Imprévus	39 357 420			0	0,00
	<b>Total</b>	<b>14 118 172 934</b>	<b>4 231 187 526</b>	<b>6 947 475 879</b>	<b>11 178 663 405</b>	<b>79,18</b>

## 1.2. Situation des réalisations au 31/12/2021 en Euros

Code	Libellé	PTBA 2021	Realisations de Janvier à Décembre 2021			Taux (%)
			UE	AFD	TOTAL	
<b>Composante 1</b>	Financement d'investissements collectif à caractère public e	16 230 225	6 406 450	8 559 888	14 966 338	92,21
Résultat 1	Protection des capacités productives	3 396 291	2 850 477	882 283	3 732 760	109,91
Résultat 2	Amélioration de la production	10 019 095	3 151 098	7 406 322	10 557 419	105,37
Résultat 3	Appui à la collecte, transformation et vente des produits	2 094 847	111 974	215 328	327 303	15,62
Résultat 4	Appui aux CT et à la MO	719 993	292 901	55 955	348 855	48,45
<b>Composante 2</b>	<b>Amélioration de l'Accès au crédit agricole</b>	<b>1 729 591</b>	<b>0</b>	<b>812 744</b>	<b>812 744</b>	<b>46,99</b>
Résultat 5	Accès aux financements des opérateurs privés	583 174		40 723	40 723	6,98
Résultat 6	Sécurisation du financement agricole	890 302		762 245	762 245	85,62
Résultat 7	Renforcement des capacités des institutions financières part	256 114		9 776	9 776	3,82
<b>Composante 3</b>	<b>Amélioration des services non financiers en faveur des acteu</b>	<b>1 817 638</b>	<b>320</b>	<b>562 820</b>	<b>563 140</b>	<b>30,98</b>
Résultat 8	Appui aux directions régionales	616 046		394 664	394 664	64,06
Résultat 9	Appui au RECA et aux CRA pour les OP	1 201 591	320	168 156	168 476	14,02
<b>Composante 4</b>	<b>Coordination Générale du Projet</b>	<b>1 423 350</b>		<b>649 237</b>	<b>649 237</b>	<b>45,61</b>
	Coordination Générale du Projet	1 423 350		649 237	649 237	45,61
<b>Autres lignes</b>	<b>Communication, Audit, évaluation et imprévu</b>	<b>322 212</b>	<b>43 634</b>	<b>6 670</b>	<b>50 304</b>	<b>15,61</b>
	Communication, Audit, évaluation et imprévu	115 861	43 634		43 634	37,66
	Evaluation et audit	146 351		6 670	6 670	4,56
	Imprévus	60 000			0	0,00
	<b>Total</b>	<b>21 523 016</b>	<b>6 450 404</b>	<b>10 591 358</b>	<b>17 041 762</b>	<b>79,18</b>

1 EUR = 655,957 F CFA

### 1.3. Situation des réalisations par convention au 31/12/2021 en FCFA

SUBVENTION	Montant Total du Projet	2018	2019	2020	2021	Total	TAUX (%)
CNE 116804W	18 391 317 641	1 199 201 878	807 240 170	3 651 941 894	4 231 187 526	9 889 571 468	53,8
CNE 116801T	4 591 699 000	473 711 308	925 148 232	847 471 208	430 246 476	2 676 577 224	58,3
CNE 116802U	19 678 710 000	84 711 547	1 549 149 433	2 330 499 899	6 517 229 403	10 481 590 282	53,3
<b>TOTAL</b>	<b>42 661 726 641</b>	<b>1 757 624 733</b>	<b>3 281 537 835</b>	<b>6 829 913 001</b>	<b>11 178 663 405</b>	<b>23 047 738 974</b>	<b>54,0</b>

### 1.4. Situation des réalisations par convention au 31/12/2021 en Euros


SUBVENTION	Montant Total du Projet	2018	2019	2020	2021	Total	TAUX (%)
CNE 116804W	28 037 383	1 828 171	1 230 630	5 567 350	6 450 404	15 076 555	53,8
CNE 116801T	7 000 000	722 168	1 410 379	1 291 962	655 907	4 080 416	58,3
CNE 116802U	30 000 000	129 142	2 361 663	3 552 824	9 935 452	15 979 081	53,3
<b>TOTAL</b>	<b>65 037 383</b>	<b>2 679 482</b>	<b>5 002 672</b>	<b>10 412 135</b>	<b>17 041 763</b>	<b>35 136 052</b>	<b>54,0</b>

## Annexe 1 – Plan d'engagement environnemental et social


Thème	Actions requises	Ressources et responsabilités	Source de financement	Calendrier	Indicateurs
1. Evaluation environnementale et sociale complémentaire					
Evaluation environnementale et sociale complémentaire	Evaluation E&S complémentaire réalisée en juin 2020  Prise en compte des éléments E&S dans le dispositif de suivi-évaluation du projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultants E&amp;S</li> <li>• MOA</li> </ul>	Financement projet	Avant signature de la convention	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANO de l'AFD sur l'évaluation E&amp;S complémentaire</li> <li>• Validation par le COFIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet</li> </ul>
2. Dispositif de gestion E&S du projet					
Cadre de gestion Environnementale et Sociale	Cet outil de gestion E&S du projet a été élaboré en Aout 2019 et un atelier de validation réalisé en janvier 2020. Les rapports (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale – CGES, Cadre de Politique de Réinstallation des Populations -CPRP, Gestion des Pestes et Pesticides - GPP) ont été validés par le Bureau National d'Evaluation Environnementale.	MOA	Financement projet	Certificat environnemental et social délivré	ANO de l'AFD obtenu  Atelier de validation
Exigences E&S dans les DAO et contrats des entreprises et sous-traitants	Les exigences de gestion E&S du CGES et autres mesures du dispositif global de gestion E&S du projet sont retranscrites dans les DAO et contrats des entreprises et sous-traitants impliqués dans le projet	MOA	Financement projet	Tout au long de la mise en œuvre	ANO de l'AFD sur mes DAO et les contrats des entreprises et sous-traitants
Renforcement des capacités de la Maîtrise d'Ouvrage en matière de gestion E&S	Le renforcement des capacités de la maîtrise d'ouvrage et des partenaires impliqué est prévu dans le cadre de la convention entre PPR et Services de l'environnement / Bureau National d'Evaluation Environnementale	MOA	Financement projet	Formation des acteurs sur les Evaluations Environnementales par le BNEE  Tout au long de la mise en œuvre	Validation par le COFIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
Dispositif d'ingénierie sociale	Les populations locales sont impliquées dans la mise en œuvre du projet, notamment au travers de	MOA	Financement projet	Chemin faisant	Validation par le COFIL (participation de l'AFD) du

	la composante 1, appui à l'élaboration des Plans d'Investissements Annuels des communes pour les 26 communes d'interventions + réalisation de PCD dans certaines communes  En outre des TdR pour une mission expertise court terme de l'AT sont élaborés			Mission AT CT réalisée en 2020  Formation et accompagnement des acteurs en 2021 (mission ECT)	Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
Mécanismes de compensation des personnes affectées par le projet	Un mécanisme a été conçu dans le cadre de l'évaluation E&S complémentaire  A ce jour aucune activité du projet n'a affecté des personnes (pertes de terres, de bâtis, ...)	MOA	Financement projet		Validation par le COPIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
Approche Pro-femmes et pro-jeunes	Les femmes et les jeunes sont des cibles particulières dans le cadre des travaux CES-DRS (composante 1) et formation et installation (composante 3)  Des indicateurs H/F sont prévus dans le cadre logique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOA</li> <li>• Collectivités</li> <li>• CRA</li> </ul>	Financement projet	Chemin faisant	Validation par le COPIL (participation de l'AFD) du Cadre logique et des indicateurs de suivi du projet
3. Dispositif de suivi E&S du projet					
Suivi E&S et reporting E&S	La convention (entre PPR et Services de l'environnement / Bureau National d'Evaluation Environnementale, conformément aux recommandations du CGES) pour assurer le suivi E&S du projet est en cours d'exécution :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- missions de vérification sur le terrain et aux audiences publiques conduites par le BNEE, DRESUDD, DRGR, DEESE</li> <li>- atelier d'évaluation des rapports provisoires de l'Etude d'Impact Environnemental et Social des projets intégrés dans 17 Vallées et renforcement des capacités des acteurs (en cours de préparation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseil Communal (CC)+ Services Techniques Décentralisés (GR, Agriculture...)</li> <li>• MOA</li> <li>• Ministère de l'Environnement</li> </ul>	Financement projet	Mission d'audience publique et atelier de validation des études 17 vallées réalisés par le BNEE  TDR de la mission d'audience publique et atelier de validation des études seuils dans la région d'Agadez en cours de validation avec le BNEE	ANO AFD sur convention PPR / BNEE (à venir)

**Annexe 2 – Cartes de localisation des seuils et digues**

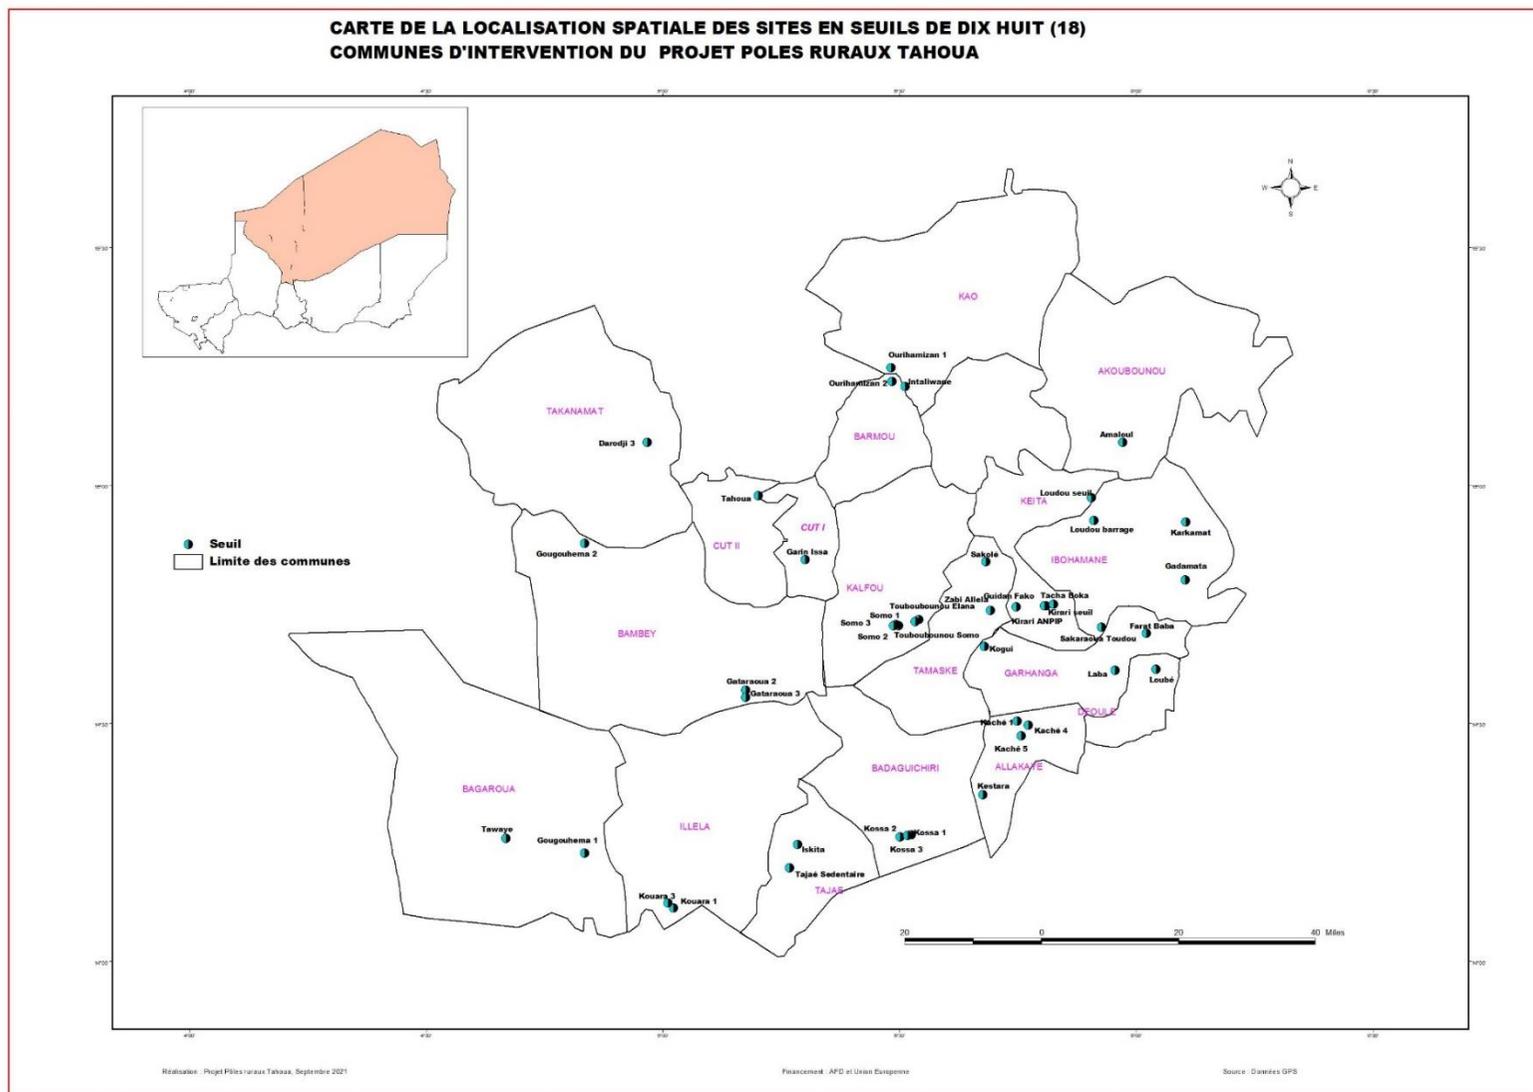

**CARTE DE LA LOCALISATION SPATIALE DES SITES EN SEUILS DE HUIT  
(8) COMMUNES D'INTERVENTION DU PROJET POLES RURAUX AGADEZ**

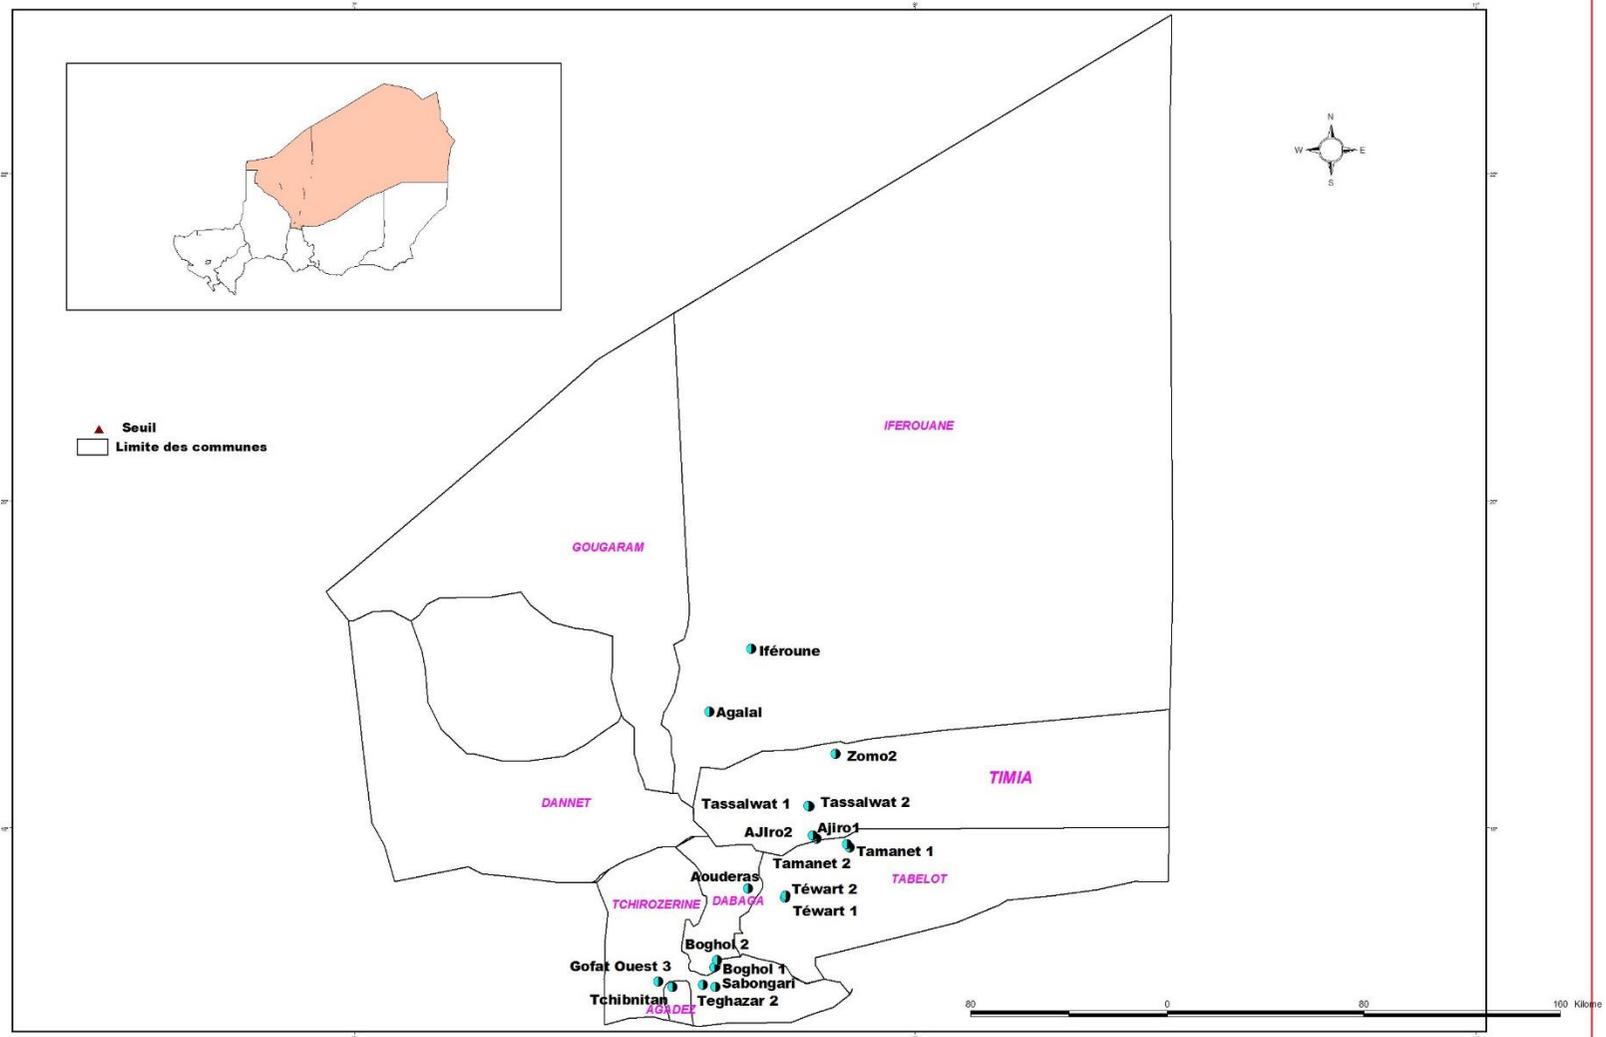

**CARTE DE LA LOCALISATION SPATIALE DES SITES EN DIGUES DE HUIT  
(8) COMMUNES D'INTERVENTION DU PROJET POLES RURAUX AGADEZ**

